

CIBEC/INEP



B0008505

389

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**SECRETARIA DE ENSINO DE 1.º E 2.º GRAUS**

**PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA**  
**EDUCAÇÃO NO MEIO RURAL DO NORDESTE**

**EDURURAL/NE - BIRD-ACORDO N.º 1867/BR**

**ESTUDOS DE REAJUSTAMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS 80/85**

(/814-22)

# **Livros Grátis**

<http://www.livrosgratis.com.br>

Milhares de livros grátis para download.

**Presidente da República Federativa do Brasil**  
JOÃO BAPTISTA FIGUEIREDO

**Ministro da Educação e Cultura**  
RUBEM LUDWIG

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**SECRETARIA DE ENSINO DE 1.º E 2.º GRAUS**

**PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA**  
**EDUCAÇÃO NO MEIO RURAL DO NORDESTE**  
**EDURURAL/NE - BIRD-ACORDO N.º 1867/BR**

**ESTUDOS DE REAJUSTAMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS 80/85**

SECRETÁRIO GERAL

Sérgio Mário Pasquali

SECRETÁRIO DE ENSINO DE 1º E 2º GRAUS

Antonio de Albuquerque Souza Filho

SUBSECRETÁRIO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS  
DE ENSINO E COORDENADOR DO EDURURAL/NE

Armando Hildebrand

COORDENADOR ADJUNTO DO EDURURAL/NE

José Roberto de Mello Barreto

- ANNADYR DA SILVA NUNES  
Administrador Financeiro
- IGUATEMY AMÂNCIO DOS SANTOS  
Gerente de Programação e Controle
- MILTON DE ANDRADE SILVA  
Assessor Administrativo

O presente trabalho foi elaborado pelos técnicos da equipe de programação da Unidade de Administração do Programa (UNAP):

- Elci Maria de Oliveira
- Iguatemy Amâncio dos Santos - ~~Coordenador~~
- Itana Maria Carneiro da Cunha de Moraes
- Maria Nazaré Barbosa Tavares

E com a participação dos técnicos dos órgãos de assessoramento:

- Isis Borges Vincent - FENAME
- Nilda Ribas Diniz - CRHJP
- Ruy Pereira de Souza Azevedo - CEDATE

#### DIAGRAMAÇÃO

- Paulo Roberto Fernandes e Rodrigues

#### APOIO ADMINISTRATIVO

- Magda Rosmarl Sims
- Maria de Fátima Ximenes de Lima

BRASÍLIA, 1982

## SUMARIO

APRESENTAÇÃO	07
I - ANTECEDENTES	09
II - ESTUDO COMPARATIVO DO DESEMPENHO FISICO E FINANCEIRO DO EDURURAL/NE - 1980 - 1982	13
2.1 - Introdução	
2.2 - Elenco de Projetos	
2.3 - Desempenho Físico e Financeiro dos Projetos	
III - PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO - 1983 - 1985	205
3.1 - Justificativa	
3.2 - Proposta de Reajustamento	

O presente trabalho objetiva propor reajustamento nas ações do Programa Expansão e Melhoria do Ensino de 1º Grau no Nordeste EDURURAL-NE, tendo em vista que o Cronograma fisico e financeiro proposto inicialmente encontra-se defasado.

Assim este reajustamento virá corrigir no processo os desvios detectados, para que nos prazos previstos, possam ser cumpridos dentro dos limites da eficiência, eficácia e efetividade, os objetivos do Programa.

Tendo em vista a abrangência e complexidade do assunto resolvemos adotar procedimentos metodológicos que nos orientasse quanto a linha de ação a ser adotada na seguinte ordem: Levantamento de dados, análise, estudos de custos e elaboração da nova proposta de reajustamento.

Dessa forma o trabalho será apresentado obedecendo a seguinte itemização:

I - Antecedentes

II - Estudo Comparativo do Desempenho Físico e Financeiro do EDURURAL-NE - 1980-1982.

III - Proposta de Reajustamento 1983/85.

Os antecedentes estão consubstanciados nas informações básicas do Programa.

O estudo comparativo do desempenho físico e financeiro está baseado na confrontação das metas físicas e financeiras previstas nos Documentos de Trabalho (Working Papers), com os Planos dos Estados e respectivos custos dos diversos componentes dos Projetos. As metas em execução da programação de 1982, foram consideradas como realizadas para efeito do presente Tralbalho. O critério adotado se fundamentou numa vizão projetiva e considerando os recursos assegurados para sua realização.

1.1 - FUNDAMENTAÇÃO, OBJETIVO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA.

**Fundamentação**

O Programa de Expansão e Melhoria da Educação no Meio Rural do Nordeste EDURURAL-NE foi instituído pelo Decreto nº 85.287, de 23 de outubro de 1980, para executar o Acordo nº 1867/BR firmado entre o Governo Brasileiro e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.

O EDURURAL-NE vem integrar o conjunto de esforços do Ministério da Educação e Cultura relativos à prioridade da educação no meio rural, conforme recomendam as diretrizes do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (1980-1985).

**Objetivo**

O artigo 29 do Decreto nº 85.287 define que o EDURURAL-NE tem como objetivo a expansão das oportunidades educacionais e a melhoria das condições da educação no meio rural do Nordeste, bem como o fortalecimento do processo de planejamento e administração educacionais.

**Área de Abrangência**

O Programa atinge os nove Estados do Nordeste, incidindo sobre 248 municípios selecionados dentre os não contemplados por outros projetos e que apresentam maiores problemas na área de educação no meio rural.

## 1.2 - ASPECTOS GERENCIAIS DO EDURURAL-NE

### **Estratégia de Ação**

Os Projetos que constituem o Programa terão sua execução assistida tecnicamente pelas seguintes instituições do Ministério da Educação e Cultura: Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação (CEDATE), Centro de Recursos Humanos João Pinheiro (CRHJP), Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME), Instituto Nacional de Assistência ao Estudante (INAE) e Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus (SEPS).

O conteúdo e a amplitude dos projetos são adaptados a cada Estado, a fim de atender às peculiaridades de cada um, proporcionando maior equidade na distribuição de recursos Educacionais e atendendo às necessidades prioritárias.

O Programa traduz as aspirações e necessidades de cada Unidade da Federação, além de revigorar os aspectos técnicos da administração educacional.

### **Administração Central**

Na esfera federal, a administração do EDURURAL-NE esta a cargo da Unidade de Administração do Programa (UNAP), vinculada à Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus (SEPS) do MEC cuja direção é exercida pelo Coordenador Geral com a colaboração do Coordenador Adjunto.

A Administração do Programa é integrada pela Comissão Consultiva Interministerial (CCI), presidida pelo Secretário de Ensino de 1º e 2º Graus do MEC, que tem por finalidade apreciar os planos operacionais, avaliar a execução do Programa e acompanhar a administração dos assuntos financeiros.

### **Administração Regional**

A execução do Programa cabe aos Estados e aos Municípios. Cada Estado conta com uma Unidade Estadual de Administração do Programa (UEAP). No âmbito municipal, a unidade de coordenação para as finalidades do Programa é o Órgão

Municipal de Educação (OME).

Verifica-se assim que o Programa confere a cada UEAP ou OME funções executivas a nível local, permitindo ações diretas, o que assegura melhor atendimento às necessidades e aos interesses da comunidade a que serve.

### 1.3 - ESTRUTURA DO PROGRAMA

#### **Estrutura** do Programa

O Programa compreende os seguintes Projetos:

I) Expansão da Rede Física: construção de novas escolas, remodelação de escolas existentes e fornecimento de mobiliário e equipamento escolares, totalizando 2.115 salas de aula que possibilitarão aumentar de 1.26.900 jovens a população escolar.

II) Desenvolvimento do Currículo e Material de Ensino e Aprendizagem: reformulação de currículos e planos de estudos para adequá-los à realidade da educação rural e fornecimento de 4.791.300 livros escolares e manuais de professores e de 1.817.400 pacotes contendo material de ensino e aprendizagem.

III) Treinamento de Recursos Humanos: treinamento de 20.780 professores, 2.000 supervisores escolares e 1.000 técnicos estaduais e municipais.

IV) Alimentação Escolar: melhoria da distribuição de merendas, construção de depósitos de alimentos e estudos relacionados com o aproveitamento da matéria-prima alimentar local.

- V) Fortalecimento dos órgãos Municipais de Educação: assistência técnico-financeira às Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, para melhorar os processos de planejamento e administração educacional e apoiar a criação de unidades gerenciais do Programa.
- VI) Estudos e Avaliação.  
A Avaliação de Impacto desenvolvida pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura da Universidade Federal do Ceará.
- VII) Administração - destinado à melhoria da qualidade gerencial dos estados com vistas ao desenvolvimento dos projetos.

**Período de Execução**

O Programa tem a duração de 5 anos, ou seja o quinquênio 1981-1985.

1.4 - INSTRUMENTOS DE TRABALHO

a) - Working Paper (WP)

Este instrumento de trabalho foi elaborado tendo por base o Appraisal da Missão de Estudo do BIRD quando do período de negociação, apresenta o elenco de Projetos e o detalhamento físico e financeiro das metas a serem desenvolvidas pelos Estados no período 80/85, com base no diagnóstico da situação sócio-econômico e financeiro dos mesmos.

O Working Paper (WP) serve de parâmetro para o desenvolvimento das ações a serem realizadas por cada Unidade Federada integrante do Programa EDURURAL-NE, servindo de referencial para o Plano Operativo Anual dos Estados.

b) - Plano Operativo Anual (POA)

O Plano Operativo Anual é o instrumento de trabalho apresentado pelas Unidades Federadas, anualmente, ao MEC, a fim de viabilizar mediante a alocação dos recursos necessários a consecução das metas físicas.

O POA traduz as propostas Estaduais com vistas à efetivação das diretrizes e objetivos do Setor Educação e se concretizam através das ações previstas no detalhamento das metas.

### 2.1- Introdução

O Programa EDURURAL-NE tem como característica básica a diversificação de metas quantitativas e qualitativas em função da necessidade de atendimento às aspirações de natureza educacional decorrentes das diferentes situações socio-econômicas dos Estados que integram o referido Programa.

O desempenho do EDURURAL-NE não pode ser julgado à luz da simplicidade dos números, merecendo ampla reflexão, sob pena de se fazer um juízo de valor apressado, não compatível com a sua realidade.

A maior reflexão justifica-se não só em função das peculiaridades do Programa como também das variáveis tempo, alterações cambiais, processo inflacionário, reformulação na estrutura organizacional do MEC e diversidade de procedimentos gerenciais dos Estados, as quais tiveram uma influência preponderante no nível de de

sempenho do Programa.

Reconhece-se ainda que o EDURURAL-NE é um dos programas de mais complexa execução dos que estão sendo realizados na América Latina com o financiamento do Banco Mundial na área educacional - nem tanto pelo volume de seus recursos, mas pela variedade de suas ações, pela dimensão geográfica de sua incidência, pelos inúmeros setores envolvidos, pelo seu caráter experimental, por suas inovadoras metas qualitativas, pelas dificuldades materiais da zona rural, pela sua clientela docente e discente e pela estrutura política e econômica dos municípios abrangidos.

## 2.2 - Elenco de Projetos

- 1 - Projeto Rede Física
- 2 - Projeto de Desenvolvimento de Currí-  
culo e Supervisão
- 3 - Projetos de Treinamento de Recursos  
Humanos
- 4 - Projetos de Fortalecimento dos Ór-  
gãos Municipais de Educação - OME'S
- 5 - Projeto de Estudos e Avaliação
- 6 - Projeto de Alimentação Escolar
- 7 - Projeto de Administração
- 8 - Projeto da Unidade de Administração  
do Programa (UNAP)

Este Projeto destina-se a construção, ampliação, reforma de unidades de ensino e aquisição de mobiliário e equipamento para as mesmas, construção de armazéns para depósito de alimentos (Alimentação Escolar) e edifícios sede para Órgãos Municipais de Educação.

a) - Execução e Detalhamento Físico e Financeiro por Estado

Objetivando maior racionalização e uniformidade de procedimentos no processamento das informações que se seguem, o Projeto foi subdividido em três metás tendo por base o detalhamento físico e o volume de recursos alocados para as ações de maior representatividade que são: Construção, Ampliação, Reforma, Equipamentos e Mobiliário.

b) - Análise dos Componentes Físicos

Considerando os demonstrativos apresentados na Execução e Detalhamento do Projeto de Rede Física, (ver QE. 1/1 a 1/9 e QD 1/1 a 1/9), faz-se necessário maiores esclarecimentos, para um melhor entendimento do desempenho efetuado, segundo as metas previstas:

i - CONSTRUÇÃO

Esta meta previa a construção de 958 unidades, das quais foram executadas 575 unidades equivalente a 60%, no período 80/82. A defasagem entre o previsto nos WP<sub>s</sub> dos Estados e o realizado é da ordem de 11%. No exercício de 1983 serão executados mais 34% do projeto o

que reduzirá a defasagem para 6% o equivalente ao previsto para execução em 1983. (ver DM 1) .

ii - REFORMA

A meta em foco, tem como previsão a reforma de 212 unidades, das quais foram realizadas 160 no período 80/82, o equivalente a 75% de todo o Projeto. Constatando-se ainda, um acréscimo de 7% em relação ao programado para o mesmo período.

Estima-se para o exercício de 1983, a reforma das 52 unidades restantes que correspondem a 25% do total geral programado. (ver DM 1) .

iii - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO

A meta "equipamento e mobiliário" apresentou o seguinte comportamento:

Das 1.170 unidades previstas, 660 foram equipadas e mobiliadas, durante o período 80/82 equivalendo a 79% do período e 56% do total geral programado.

Foi constatada uma defasagem de 21% sobre o previsto, o que corresponde a 193 unidades.

Convém esclarecer que esta meta se encontra intimamente correlacionada com a de construção, uma vez que o equipamento e mobiliário só se processam quando do término da obra. (ver DM 1) .

c) - Análise dos Componentes Financeiros

Quanto aos componentes financeiros do Projeto vale dizer que a linha de procedimentos foi a mesma usada para a análise dos componentes físicos.

i - CONSTRUÇÃO

Foram alocados para o período 80/82 a importância de ..... US\$ 14.103 mil dos quais foram aplicados US\$ 10.406 mil o equivalente a 74% aproximadamente do valor alocado, e 53% em relação do valor total previsto para meta até 1984 que corresponde a US\$ 19.660 mil. A aparente diferença apresentada entre o valor alo-

cado e o realizado configura-se como a defasagem de 11% da meta física não realizada no período e a superestimação de custos quando da elaboração do projeto, (ver DM 1).

ii - REFORMA

No período 80/82 não foram identificados gastos de "REFORMA" pois os mesmos foram embutidos nos custos de construção devido a superestimação dos mesmos, já identificados.

Em consonância com a afirmativa de que os custos foram superestimados constata-se a disponibilidade de saldo no valor de US\$ 1.554 mil além da aplicação de US\$ 208 mil para a re-

forma das últimas 52 unidades programadas, (ver DM 1).

iii - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO

Nesta meta foram realizadas despesas da ordem de ..... US\$ 2.807 mil correspondente a 67% do valor previsto para o período 80/82 e 43% do valor total da meta. Mais uma vez configura-se uma superestimação de custos aliada ao fato de que a meta física de construção não foi integralmente esgotada. (ver DM 1).

d) - Conclusão

Em síntese, conclue-se que com relação ao nível de desempenho do Projeto Rede Física, o re-

sultado foi considerado satisfatório apesar das variáveis residuais nem sempre identificadas, mas que interferem no processo, provocarem disfunções somente corrigidas ao longo do mesmo.

Quanto ao desempenho dos Estados nem sempre é possível uma comparação horizontal, uma vez que fatores heterogêneos tais como: situação climática, distâncias, tecnologia, número de unidades e comportamento gerencial têm influência significativa e ao mesmo tempo diferenciada de Estado para Estado, o que afeta os resultados do produto final.

Os custos unitários do Projeto são extremamente diversificados o que não permite dizer se as

variações identificadas seriam de correntes das variáveis citadas anteriormente ou de outros componentes uma vez que nas regiões teoricamente mais carentes e distantes o custo do m<sup>2</sup> da construção é inferior ao das regiões mais próximas dos centros produtivos.

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$(1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	(1) R/P - %		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	(1) R/P - %	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1980</u> <u>ANO I</u>											
. Construção		5	5	-	5		5	164	0	164	0	
. Reforma		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1981</u> <u>ANO II</u>											
. Construção		25	25	20	5	80	27	880	560	320	64	
. Reforma		25	10	0	10	0	23	749	470	279	63	
. Equipamento e Mobiliário		30	11	20	9	180	4	131	90	41	69	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1982</u> <u>ANO III</u>											
. Construção		35	35	28	7	80	36	1.163	1.111	52	96	
. Reforma		45	17	0	17	0	31	1.010	728	282	72	
. Equipamento e Mobiliário		45	62	28	34	45	47	153	383	230	250	
<b>TOTAL GERAL</b>												
. Construção	1980	65	65	48	17	74	67	2.207	1.671	536	76	
. Reforma	/	70	27	0	27	0	59	1.923	1.198	725	62	
. Equipamento e Mobiliário	1982	75	73	48	25	66	9	284	473	189	167	

OBS | FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1 US\$:

ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
DIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO - 80/82

### CUSTO DO PROJETO

ESTADO: ALAGOAS

FOLHA Nº QD 1/1

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	TIPO	QUANT.	ÁREA m <sup>2</sup>		CUSTO (EM U\$)				TOTAL GERAL U\$ (1000)
				P/ UNIDADE	TOTAL	CONSTRUÇÃO		EQUIPAMENTO		
						m <sup>2</sup> U\$/U	TOTAL U\$ (1000)	UNITÁRIO U\$/U	TOTAL U\$ (1000)	
<u>REDE FISICA</u>  . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1980</u> <u>ANO I</u>									
<u>REDE FISICA</u>  . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1981</u> <u>ANO II</u>	E2	16	240	3.840	75	<u>360</u> 289	-	-	<u>560</u>
		OME'S	4	95	380	187	71	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		UNID.	16	-	-	-	-	11	<u>200</u> 180	
			4	-	-	-	-	5.	20	
<u>REDE FISICA</u>  . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1982</u> <u>ANO III</u>	E2	22	240	5.280	100	<u>779</u> 531			<u>1.111</u>
		OMES	5	95	475	164	78			
		NURI	1	1.000	1.000	169	170		<u>332</u>	
		UNID.	22	-	-	-	-	8.	<u>183</u>	
			5	-	-	-	-	6.	30	
			1	-	-	-	-	119.	119	
. Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário		-	48	-	10.975	-	<u>1.139</u>	-	-	<u>1.671</u>
			48	-	-	-	-	-	<u>532</u>	

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: BAHIA  
FOLHA Nº QE 1/2

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)					
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>		
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1980</u> <u>ANO I</u>												
. Construção		15	15	0	15	0	13	447	0	447	0	0	
. Reforma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		25	25	0	25	0	2	57	0	57	0	0	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1981</u> <u>ANO II</u>												
. Construção		45	45	36	9	80	24	783	825	42	105	80	
. Reforma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		75	75	36	39	48	11	374	97	277	26	26	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1982</u> <u>ANO III</u>												
. Construção		40	40	91	51	227	24	783	980	197	125	104	
. Reforma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		-	-	91	91	-	10	327	171	156	52	52	
			TOTAL GERAL										
. Construção	1980	100	100	127	27	127	84	2.771	2.073	698	75	75	
. Reforma	/	-	-	-	-	-	61	2.013	1.805	208	90	90	
. Equipamento e Mobiliário	1982	100	100	127	27	127	23	758	268	490	35	35	

OBS | FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
TU\$-

ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

**DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO - 80/82**  
**CUSTO DO PROJETO**

ESTADO: BAHIA  
 FOLHA Nº QD 1/2

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	TIPO	QUANT.	ÁREA m2		CUSTO (EM U\$)				TOTAL GERAL U\$ (1000)
				P/ UNIDADE	TOTAL	CONSTRUÇÃO		EQUIPAMENTO		
						m2 U\$(10)	TOTAL U\$(1000)	UNITARIO U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	
REDE FISICA . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	1980 ANO I									
REDE FISICA . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	1981 ANO II									922
		E2	36	250	9.000	91	825	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		E2	36	-	-	-	-	2.6	97	
REDE FISICA . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	1982 ANO III						980			1.151
		E2	10 <sup>(*)</sup>	250	2.500	100	250	-	-	
		E2	14	166	2.324	75	175	-	-	
		E1	67	124	8.308	66	555	-	-	
		E2	24	-	-	-	-	2.6	171 62	
		E1	67	-	-	-	-	1.6	109	
										2.073
			91		22.132		1.805		-	
			-		-		-		-	
			91		-		-		268	

085 \* (Escola de Produção)

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: CEARÁ  
FOLHA Nº OE 1/3

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	(1) R/P - %		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	(1) R/P - %	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1980</u> <u>ANO I</u>						<u>4.1</u>	<u>222</u>	<u>40</u>	<u>182</u>	<u>18</u>	
. Construção		5	9	0	9	0	3.9	211	35	176	16	
. Reforma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		-	-	-	-	-	0,2	11	5	6	45	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1981</u> <u>ANO II</u>						<u>26</u>	<u>1.393</u>	<u>585</u>	<u>808</u>	<u>42</u>	
. Construção		25	43	38	5	88	19	1.006	485	521	48	
. Reforma		25	19	38	19	200	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		30	74	38	35	51	7	387	100	287	26	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1982</u> <u>ANO III</u>						<u>38</u>	<u>2.042</u>	<u>2.020</u>	<u>22</u>	<u>99</u>	
. Construção		35	60	111	106	185	26	1.397	1.712	315	122	
. Reforma		45	35	39	4	111	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		45	111	150	39	135	12	645	308	337	48	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
. Construção	1980	65	112	149	111	133	49	2.614	2.232	382	85	
. Reforma	/	70	54	77	23	142	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário	1982	75	185	188	74	102	20	1.043	413	630	39	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1US\$=

ANO I - Cr\$ 88,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

DETALHAMENTO

DA EXECUÇÃO- 80/82

CUSTO DO PROJETO

ESTADO: CEARÁ

FOLHA Nº QD 1/3

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	TIPO	QUANT.	ÁREA m2		CUSTO (EM U\$)				TOTAL GERAL U\$ (1000)
				P/ UNIDADE	TOTAL	CONSTRUÇÃO		EQUIPAMENTO		
						m2 U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	UNITÁRIO U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1980</u> <u>ANO I</u>						<u>35</u>			<u>40</u>
. Construção		-	-	-	-	-	18	-	-	
. Reforma		REF.	38	-	-	-	17	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		-	-	-	-	-	-	-	5	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1981</u> <u>ANO II</u>						<u>585</u>			<u>695</u>
. Construção		E2	20	226	4.520	76	<u>344</u>	-	-	
. Reforma		AMP.	18	96	1.728	76	131	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		E2	20	-	-	-	-	3.2	<u>110</u>	
		AMP.	18	-	-	-	-	2.4	<u>66</u>	
									<u>44</u>	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1982</u> <u>ANO III</u>						<u>1.680</u>			<u>2.020</u>
. Construção		E2	74	226	16.724	75	<u>1.249</u>			
. Reforma		CERUS	5	407	2.035	75	152			
. Equipamento e Mobiliário		AMP.	32	96	3.072	75	229			
		REF.	39	-	-	1.300(*)	50		<u>340</u>	
		E2	74	-	-	-	-	30	<u>225</u>	
		CERUS	5	-	-	-	-	-	<u>37</u>	
		AMP.	32	-	-	-	-	-	<u>78</u>	
. Construção			149		28.079		<u>2.250</u>			<u>2.755</u>
. Reforma			77		-		<u>50</u>		<u>455</u>	
. Equipamento e Mobiliário			149		-		-			

OBS

(\*) Custo unitário para reforma

EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - (%) (1)		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - (%) (1)	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1980</u> ANO I						<u>5.5</u>	<u>185</u>	<u>0</u>	<u>185</u>	<u>0</u>	
. Construção		5	8	0	8	0	5.3	175	0	175	0	
. Reforma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		-	-	-	-	-	0.2	10	0	10	0	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1981</u> ANO II						<u>25</u>	<u>853</u>	<u>409</u>	<u>444</u>	<u>48</u>	
. Construção		25	38	17	21	45	20	671	279	392	41	
. Reforma		25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		30	45	17	28	38	5	182	130	52	71	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1982</u> ANO III						<u>32</u>	<u>1.094</u>	<u>1.013</u>	<u>81</u>	<u>92</u>	
. Construção		35	53	36	17	68	25	856	744	112	87	
. Reforma		45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		45	68	36	32	53	7	238	269	31	113	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
. Construção	1980	65	99	53	46	53	63	2.132	1.422	710	67	
. Reforma	/	70	-	-	-	-	-	1.702	1.023	679	60	
. Equipamento e Mobiliário	1982	75	113	53	60	47	13	430	399	31	93	

OBS | FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL < ANO I - Cr\$ 66,17  
 ANO II - Cr\$ 80,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00  
 10\$:

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDUCURRAL/NE

**DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO - 80/82**  
**CUSTO DO PROJETO**

ESTADO, MARANHÃO  
 FOLHA Nº QD 1/4

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	TIPO	QUANT.	ÁREA m <sup>2</sup>		CUSTO (EM U\$)				TOTAL GERAL U\$ (1000)
				P/UNIDADE	TOTAL	CONSTRUÇÃO		EQUIPAMENTO		
						m <sup>2</sup> U\$(11)	TOTAL U\$(1000)	UNITÁRIO U\$(11)	TOTAL U\$(1000)	
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1980</u> ANO I									
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção (*) . Reforma . Equipamento e Mobiliário (*)	<u>1981</u> ANO II	E1 E2 E4 - E1 E2 E4	4 12 1 - 4 12 1	190 250 375 - - - -	760 3.000 375 - - - -	69 67 70 - - - -	<u>279</u> 52 201 26 - - -	- - - - 4 8 17	<u>129</u> 16 96 17	<u>408</u>
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1982</u> ANO III	E1 E2 E3 E4 E5 E6	18 6 3 3 4 2	190 250 317 375 505 570	3.420 1.500 951 1.125 2.020 1.140	77 76 75 69 69 69	<u>744</u> 263 114 71 78 139 39	4 8 8 11 13 16	<u>269</u> 76 48 25 34 54 32	<u>1.013</u>
. Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário			36 - 36		10.156 - -		<u>1.023</u> - -		- - <u>398</u>	<u>1.421</u>

OBS  
 (\*) Construção e Equip./Mob. mesmo tipo e quantidade.

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: PARAÍBA

FOLHA Nº QE 1/5

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
<u>FEDE FÍSICA</u>	<u>1980</u> <u>ANO I</u>						<u>5</u>	<u>155</u>	<u>82</u>	<u>73</u>	<u>53</u>	
. Construção		5	8	4	4	50	4	123	80	43	65	
. Reforma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		-	-	4	4	-	1	32	2	30	6	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1981</u> <u>ANO II</u>						<u>30</u>	<u>904</u>	<u>412</u>	<u>492</u>	<u>45</u>	
. Construção		25	39	13	26	33	20	618	323	295	52	
. Reforma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		30	47	13	34	28	10	286	89	197	31	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1982</u> <u>ANO III</u>						<u>35</u>	<u>1.179</u>	<u>1.114</u>	<u>65</u>	<u>95</u>	
. Construção		35	54	43	11	79	25	866	828	38	96	
. Reforma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		45	70	43	27	61	10	313	286	27	91	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
. Construção	1980	65	101	60	41	59	70	2.238	1.608	630	71	
. Reforma	/	-	-	-	-	-	50	1.607	1.231	376	76	
. Equipamento e Mobiliário	1982	75	117	60	57	51	20	631	377	254	60	

OBS | FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL } ANO I - Cr\$ 68,17  
1 US\$ = } ANO II - Cr\$ 80,00  
                  } ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
DIRO / 1867-BR  
EDURURAL / NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO - 80/82  
CUSTO DO PROJETO

ESTADO: PARAÍBA  
FOLHA Nº QD 1/5

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	TIPO	QUANT.	ÁREA m <sup>2</sup>		CUSTO (EM U\$)				TOTAL GERAL U\$ (1000)
				P/ UNIDADE	TOTAL	CONSTRUÇÃO		EQUIPAMENTO		
						m <sup>2</sup> U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	UNITÁRIO U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1980</u> ANO I	E2 AMP. UNID.	3 1 13	218 60 -	654 60 -	112 112 -	80 73 7	- - 154	- - 2	<u>82</u>
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1981</u> ANO II	E2 AMP. - E2 AMP.	11 2 - 14 3	218 60 - - -	2.398 60 - - -	120 156 - - -	307 288 19 - -	- - - 6. 6.	- - - 105 86 19	<u>412</u>
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1982</u> ANO III	E2 AMP. - E2 AMP.	28 15 - 28 15	218 60 - - -	6.104 900 - - -	112 156 - - -	828 688 140 - -	- - - 6. 6.	- - - 286 186 100	<u>1.114</u>
. Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário			60 - 73		10.176 - -		<u>1.215</u> - -		- - <u>393</u>	<u>1.608</u>

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: PERNAMBUCO  
FOLHA Nº QE 1/6

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1980</u> <u>ANO I</u>											
. Construção		10	3	0	3	0	10	146	0	146	0	0
. Reforma		-	-	-	-	-	-	416	0	146	0	0
. Equipamento e Mobiliário		20	12	0	12	0	-	-	-	-	-	-
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1981</u> <u>ANO II</u>											
. Construção		35	9	3	6	33	25	436	206	230	47	41
. Reforma		25	9	-	9	0	-	368	150	213	-	-
. Equipamento e Mobiliário		40	24	3	21	12	5	68	56	17	82	82
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1982</u> <u>ANO III</u>											
. Construção		40	11	16	13	127	30	529	525	4	99	84
. Reforma		45	15	33	18	220	-	423	354	23	-	-
. Equipamento e Mobiliário		40	24	14	10	58	10	106	171	19	161	161
<b>TOTAL GERAL</b>												
. Construção	1980	85	23	19	4	74	63	1.111	731	380	66	60
. Reforma	/	70	24	33	9	0	-	937	555	382	-	-
. Equipamento e Mobiliário	1982	100	60	17	33	28	12	174	176	2	101	101

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP) - PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1) - REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO-80/82

### CUSTO DO PROJETO

ESTADO.  
 PERNAMBUCO  
 FOLHA Nº QD 1/6

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	TIPO	QUANT	ÁREA m <sup>2</sup>		CUSTO (EM U\$)				TOTAL GERAL U\$ (1000)
				P/ UNIDADE	TOTAL	CONSTRUÇÃO		EQUIPAMENTO		
						m <sup>2</sup> U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	UNITÁRIO U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1980</u> ANO I									
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1981</u> ANO II	E2 E5 - E2 E5	1 2 - 1 2	270 570 - - -	270 1.140 - - -	92 109 - - -	<u>150</u> 25 125 - -	- - - 7. 24.	- - - <u>56</u> 7 49	<u>206</u>
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção(*) . Reforma . Equipamento e Mobiliário (*)	<u>1982</u> ANO III	E1 E2 E5 REF	6 8 2 33	154 270 570 -	924 2.168 1.140 -	41 81 52 2.500**	<u>354</u> 38 175 59 82	3. 5. 20. 2.	<u>165</u> 19 44 42 60	<u>519</u>
. Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário			3 33 3	-	5.642 - -	-	<u>504</u> -		<u>221</u>	<u>725</u>

OBS (\*) Construção e Equip./Mob. mesmo tipo e quantidade  
 (\*\*) Custo unitário da reforma

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: PIAUÍ  
FOLHA Nº QE 1/7

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1980</u> ANO I											
. Construção		5	4	0	4	0	0,5	30	0	30	0	0
. Reforma		-	-	-	-	-	-	20	0	20	0	0
. Equipamento e Mobiliário		-	-	-	-	-	0,5	10	0	10	0	0
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1981</u> ANO II											
. Construção		25	20	12	8	60	13	495	248	247	50	46
. Reforma		-	-	-	-	-	-	357	165	172	-	46
. Equipamento e Mobiliário		30	24	12	12	50	7	138	83	75	60	60
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1982</u> ANO III											
. Construção		35	28	37	9	132	16	576	535	41	93	63
. Reforma		-	-	-	-	-	-	464	294	170	-	63
. Equipamento e Mobiliário		45	36	37	3	102	4	112	241	129	215	215
<b>TOTAL GERAL</b>												
. Construção	1980	65	52	49	3	94	29	1.101	783	318	72	58
. Reforma	/	-	-	-	-	-	-	841	459	349	-	58
. Equipamento e Mobiliário	1982	75	60	45	15	82	9	260	324	64	124	124

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
US\$:

ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
DIRD / 1867-BR  
RURURAL / NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO-80/82

### CUSTO DO PROJETO

ESTADO: PIAUÍ

FOLHA Nº QD 1/7

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	TIPO	QUANT.	ÁREA m <sup>2</sup>		CUSTO (EM U\$)				TOTAL GERAL U\$ (1000)
				P/ UNIDADE	TOTAL	CONSTRUÇÃO		EQUIPAMENTO		
						m <sup>2</sup> U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	UNITÁRIO U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	
REDE FÍSICA · Construção · Reforma · Equipamento e Mobiliário	1980 ANO I									
REDE FÍSICA · Construção · Reforma · Equipamento e Mobiliário	1981 ANO II	E2 - E2	12 - 12	230 - -	2.760 - -	60 - -	165 - -	- - 6.916	- - 83	248
REDE FÍSICA · construção · Reforma · Equipamento e Mobiliário	1982 ANO III	E2 AMP. - UNID.	27 (*) 10 - 33	230 85 - -	5.770 850 - -	43 78 - -	294 228 66 -	- - - 7.304	- - - 241	535
· Construção · Reforma · Equipamento e Mobiliário			45 - 33		8.900 - -		459 - -		241	700

OBS

(\*) Incluído 4 Armazéns

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1980</u> <u>ANO I</u>											
. Construção		5	5	6	1	120	4	118	112	6	94	
. Reforma		-	-	1	1	1,5	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		-	-	-	-		3	89	0	89	0	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1981</u> <u>ANO II</u>											
. Construção		25	26	12	14	46	19	556	240	316	43	
. Reforma		25	16	28	12	181	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		30	50	48	2	96	8	208	35	173	17	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1982</u> <u>ANO III</u>											
. Construção		35	36	47	11	133	28	770	750	20	97	
. Reforma		45	29	21	8	72	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		45	75	69	6	92	7	194	208	18	107	
<b>TOTAL GERAL</b>												
. Construção	1980	65	67	65	2	98	50	1.444	1.100	344	76	
. Reforma	/	70	45	50	5	111	-	-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário	1982	75	125	117	8	93	17	491	245	246	50	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 60,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
DIRD / 1867-BR  
RURURAL / NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO-80/82  
CUSTO DO PROJETO

ESTADO,  
R. G. DO NORTE  
FOLHA Nº QD 1/8

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	TIPO	QUANT	ÁREA m <sup>2</sup>		CUSTO (EM U\$)				TOTAL GERAL u\$ (1000)
				P/ UNIDADE	TOTAL	CONSTRUÇÃO		EQUIPAMENTO		
						m <sup>2</sup> U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	UNITÁRIO U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1980</u> ANO I	E2 AMP. REF -	3 3 1 -	213 60 -	639 180 -	114 180 7.000** -	73 32 7 -	- - - -	- - - -	<u>112</u>
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	<u>1981</u> ANO II	E2 AMP. REF. E2 AMP.	4 8 28 7 11	213 60 -	852 480 -	95 141 3.309 -	81 67 92 -	- - - 2.4	- - - 35 17	<u>275</u>
<u>REDE FÍSICA</u> . Construção (*) . Reforma . Equipamento e Mobiliário (*)	<u>1982</u> ANO III	E2 AMP. REF NURE	26 21 21 1	213 60 -	5.538 1.260 -	75 142 4.250** 119	415 179 89 67	2. 1. 5. 18.	56 27 107 18	<u>958</u>
. Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário			84 50 66		9.519 - -		<u>1.102</u>		<u>243</u>	<u>1.345</u>

OBS  
(\* ) Construção e Equip./Mob. mesmo tipo e quantidade  
(\*\* ) Custo unitário p/Reforma

EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)					
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % (I)		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % (II)		
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1980</u> ANO I						<u>5</u>						
. Construção		5	3	4	1	133	49	92	60	32	65		
. Reforma		-	-	-	-	-	-	86	58	28	67		
. Equipamento e Mobiliário		-	-	4	4	0	0.1	6	2	4	33		
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1981</u> ANO II						<u>27</u>						
. Construção		25	16	11	5	69	23	469	282	187	60		
. Reforma		-	-	-	-	-	-	394	205	189	52		
. Equipamento e Mobiliário		30	19	11	8	58	4	75	77	(-)2	102		
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1982</u> ANO III						<u>35</u>						
. Construção		35	22	17	5	77	31	616	593	23	96		
. Reforma		-	-	-	-	-	-	542	540	2	99		
. Equipamento e Mobiliário		45	28	17	11	61	4	74	53	21	72		
<b>TOTAL GERAL</b>													
. Construção	1980	65	41	32	9	78	68	1.177	935	242	79		
. Reforma	/	-	-	-	-	-	-	1.022	803	219	78		
. Equipamento e Mobiliário	1982	75	47	32	15	68	10	155	132	23	85		

OBS | FONTE: - WORKING PAPER (WPI)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(II)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 68,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 150,00

MEC / SEPS  
 URD / 1867-BR  
 RURAL / NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO-80/82

ESTADO. SERGIPE  
 FOLHA Nº QD 1/9

### CUSTO DO PROJETO

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	TIPO	QUANT.	ÁREA m <sup>2</sup>		CUSTO (EM U\$)				TOTAL GERAL U\$ (1000)
				P/ UNIDADE	TOTAL	CONSTRUÇÃO		EQUIPAMENTO		
						m <sup>2</sup> U\$(10)	TOTAL U\$(1000)	UNITÁRIO U\$(1)	TOTAL U\$(1000)	
REDE FÍSICA . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	1980 ANO I	E1	2	136	662 272	68	54 18	-	-	60
		E2	2	195	390	92	36	-	-	
		E1	2	-	-	-	-	1.	6 2	
		E2	2	-	-	-	-	2.	4	
REDE FÍSICA . Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário	1981 ANO II	E1	6	136	1.791 816	94	205 77	-	-	282
		E2	5	195	975	131	128	-	-	
		UNID.	21	-	-	-	-	3.6	77 77	
REDE FÍSICA . Construção (*) . Reforma . Equipamento e Mobiliário	1982 ANO III	E1	4	136	544	124	67	1.6	7	593
		E2	12	195	2.340	173	405	3.	39	
		E4	1	550	550	123	68	6.5	7	
. Construção . Reforma . Equipamento e Mobiliário			32		5.392		799			935
			42						136	

OBS

(\*) Construção e Equip./Mob. mesmo tipo e quantidade

PROJETO DE REDE FÍSICA


DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS

METAS	REALIZADO		PREVISTO				REALIZADO	
	80/82	%	83	%	84	%	TOTAL	%
Construção	575	60	330	34	53	6	958	100
Reforma	160	75	52	25	-	-	212	100
Equip. e Mobiliário	660	56	421	36	89	8	1.170	100


DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS

METAS	REALIZADO		PREVISTO				SALDO	%	TOTAL - GERAL	%
	80/82	%	83	%	84	%				
Construção	10.406	53	7.574	39	1008	5	672	3	19.660	100
Reforma	-	-	208	12	-	-	1.554	88	1.762	100
Equip. é Mobiliário	2.807	43	2.526	39	534	8	626	10	6.493	100


# PROJETO DE REDE FÍSICA- PROGRAMAÇÃO FÍSICA

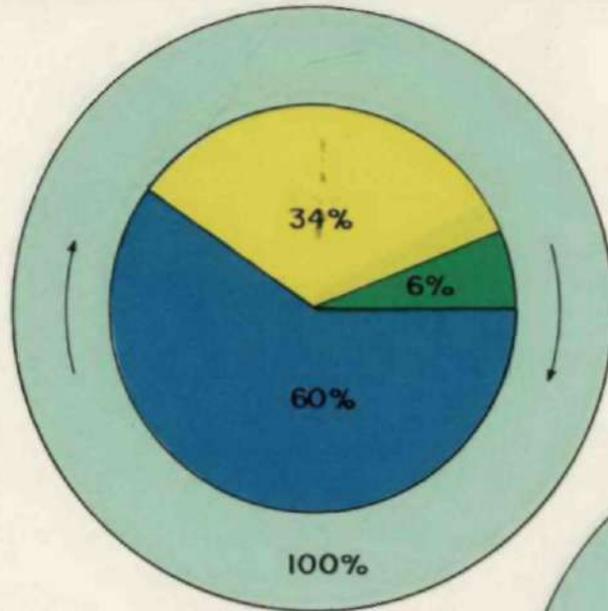

CONSTRUÇÃO NOVA

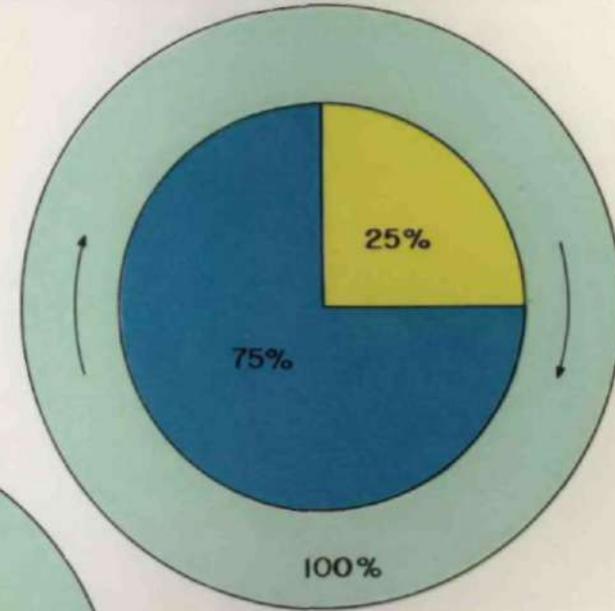

REFORMA

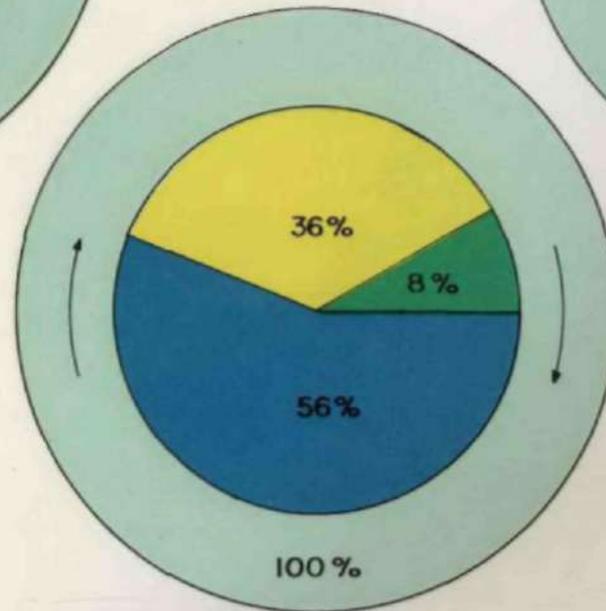


EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO


## LEGENDA

- PROGRAMAÇÃO GERAL -80/85
- REALIZADO-80/82
- PROGRAMADO-83
- PROGRAMADO-84


# PROJETO DE REDE FÍSICA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

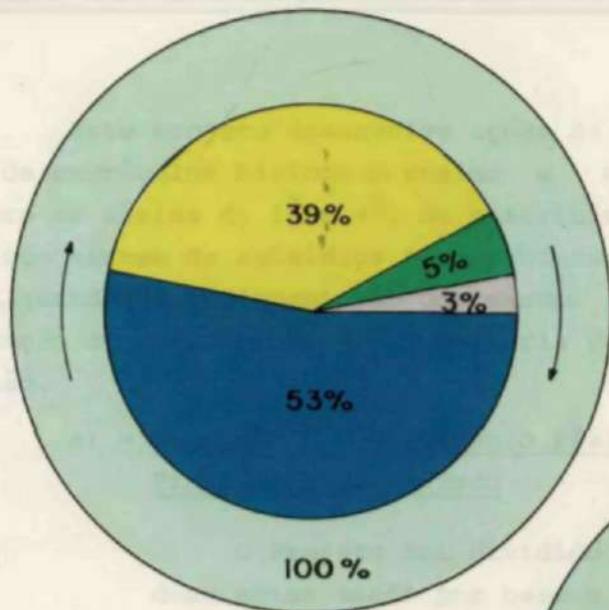

CONSTRUÇÃO

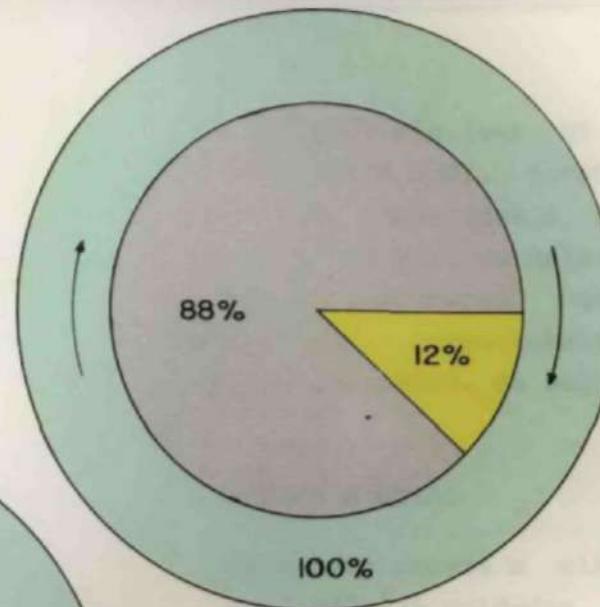

REFORMA

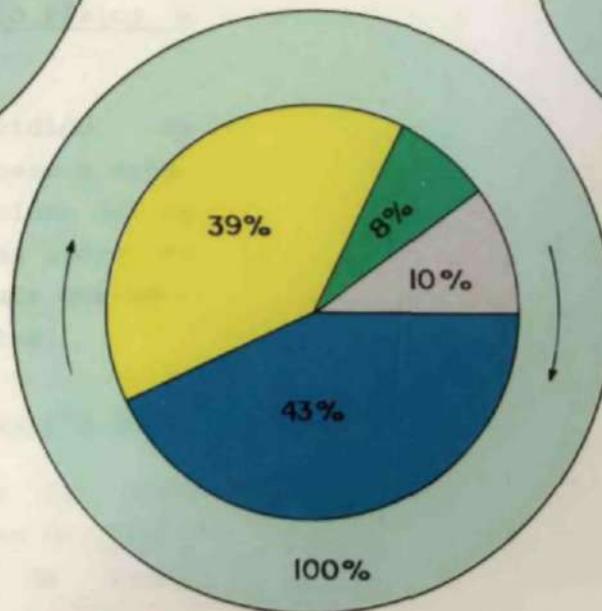

EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO

### LEGENDA

- PROGRAMAÇÃO GERAL - 80/85
- REALIZADO-80/82
- PROGRAMADO-83
- PROGRAMADO-84
- SALDO

Este Projeto desenvolve ações de elaboração de currículos básicos de ensino e programas para as séries de 1<sup>a</sup> a 4<sup>a</sup>, de materiais didáticos que servem de subsídios para professores e **alunos**, quando da implementação dos mesmos e da realização de estratégias para a melhoria da supervisão.

a) - Execução e Detalhamento Físico e Financeiro por Estado

O Projeto foi dividido em duas metas tendo por base o detalhamento físico e o volume de recursos alocados para as ações de maior representatividade que são: Livros / Guias e Pacotes.

b) - Análise dos Componentes Físicos

Os demonstrativos da Execução e do Detalhamento do Projeto de Desenvolvimento de Currí-

culo e Supervisão (ver QE 2/1 a 2/9 e QD 2/1 a 2/0), apresentados estão sendo submetidos a análises mais acuradas para um melhor entendimento do desempenho efetuado. Mesmo assim, o comportamento das metas se apresentou da seguinte forma:

i - LIVROS E GUIAS

Esta meta previa a elaboração de **2.842.735** unidades das quais foram executadas ..... 2.182.728 correspondente a **77%** do total previsto para 80/82 e 44% do total geral do Projeto. A defasagem apresentada é da ordem de 23%. No exercício de 1983 serão executadas mais 14% do projeto que corresponde a 679.304 unidades, insuficiente,

ainda, para corrigir a defasagem face a limitação de recursos financeiros previsto para o exercício.

Entretanto, em 1984 a meta global será fechada com a elaboração de 2.065.582 unidades correspondente a 42%. (ver DM 2) .

ii - PACOTES

A meta "pacotes" apresentou o seguinte comportamento:

Das 632.258 unidades previstas para 80/82 foram adquiridos e distribuídos 894.727 pacotes o que corresponde a 142% ou seja 46% do total geral programado. Estes dados representam um crescimento de

41% o que permitiu uma antecipação da referida meta. (ver DM 2) .

c) - Análise dos Componentes Financeiros

Quanto aos componentes financeiros do Projeto vale ressaltar que a linha de procedimentos seguida foi a mesma para os componentes físicos:

i - LIVROS E GUIAS

Para o período 80/82 foram alocados a importância de ..... US\$ 3.080 mil dos quais foram aplicados US\$ 3.077 mil o equivalente a aproximadamente 100%, que corresponde a 31% do valor total programado, (ver DM 2) .

ii - PACOTES

Nesta meta foram realizadas despesas da ordem de ..... US\$ 2.890 mil correspondente a 185% do valor previsto para o período 80/82 e 48% do total da meta.

Constata-se uma superestimação de custos sem que isto signifique, necessariamente, uma antecipação acentuada da meta. (ver DM 2).

d) - Conclusão

Em síntese, conclue-se que com relação ao nível de desempenho do Projeto Desenvolvimento de Currículo e Supervisão o resultado considerado razoável,

apesar das variáveis residuais nem sempre identificadas mas que interferem no processo, provocarem disfunções somente corrigidas ao longo do mesmo.

Em decorrência das razões expostas, comparando-se a previsão das metas desse projeto para os exercícios de 83/84 o percentual a ser atingido corresponde a mais de 55% superior ao desempenho realizado no período 80/82.

Quanto ao desempenho dos Estados nem sempre é possível uma comparação horizontal, uma vez que fatores heterogêneos têm influência significativa e ao mesmo tempo diferenciada de Estado para Estado, o que afeta as resultantes do produto final.

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: ALAGOAS  
 FOLHA Nº QE 2/1

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P. (I)		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P. (II)
<u>Desenvolvimento de Currículo e Supervisão</u> . Livros e Guias . Pacotes	1980 ANO I	12	20.954	0	20.954	0	2	9	0	9	0
			-	-	-	-		-	-	-	-
<u>Desenvolvimento de Currículo e Supervisão</u> . Livros e Guias . Pacotes	1981 ANO II	27	45.716	0	45.716	0	12	64	0	64	0
		19	12.557	0	12.557	0	4	20	0	20	0
							8	44	0	44	0
<u>Desenvolvimento de Currículo e Supervisão</u> . Livros e Guias . Pacotes	1982 ANO III	23	40.000	53.612	13.612	134	13	68	73	53	108
		22	14.756	22.550	7.794	153	3	18	47	29	26
							10	50	26	24	53
			<b>TOTAL GERAL</b>								
<u>Total Geral</u> . Livros e Guias . Pacotes		62	106.670	53.612	53.058	51	27	141	73	68	52
		41	27.313	22.550	4.763	83	9	47	47	0	100
							18	94	26	68	28

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (II)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
 1US\$=

ANO I - Cr\$ 65,17  
 ANO II - Cr\$ 80,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

**DETALHAMENTO BA EXECUÇÃO - 80/82**  
**CUSTO DO PROJETO**

ESTADO: ALAGOAS  
FOLHA Nº QD 2/1

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	CLIENTELA	QUANTIDADE		CUSTO US\$				TOTAL GERAL US\$ (1000)
			LIVROS	PACOTES	LIVROS		PACOTES		
					UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL US\$(1000)	UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL-US\$(1000)	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias . Pacotes	1980 ANO I	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias . Pacotes	1981 ANO II	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias . Pacotes	1982 ANO III	Alunos 1a. 2a.Série Alunos 1a. 4a.Série Alunos 1a. 4a.Série Professores	24.000 29.612 - -	- - 22.000 550	0,875 0,878 - -	21 26 - -	- - 1 7,27	- - 22 4	47 73 - -
. Livros e Guias . Pacotes									73 47 26

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: BAHIA  
FOLHA Nº QE 2/2

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1980 ANO I						0		23		
	. Livros e Guias	0	-	13.701	13.701	100	0	-	23	-	100
	. Pacotes	0	-	-	-			-	-		
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1981 ANO II						2	30	25	6	84
	. Livros e Guias	2	22.720	17.423	5.297	77	1,5	24	25	-	105
	. Pacotes	4	583	-	583	0	0,5	6	0	6	0
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1982 ANO III						55	1.346	1.569	969	117
	. Livros e Guias	98	1.113.280	722.000	391.280	65	48	1.172	799	373	69
	. Pacotes	11	17.379	110.510	93.131	636	7	174	770	596	443
			<b>TOTAL GERAL</b>								
Total Geral							56	1.376	1.617	939	118
	. Livros e Guias	100	1.136.000	753.124	382.876	67	48	1.196	847	349	71
	. Pacotes	15	17.962	110.510	92.548	616	8	180	770	590	428

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ = { ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 180,00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO - 80/82

ESTADO: BAHIA  
 FOLHA Nº QD 2/2

### CUSTO DO PROJETO

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	CLIENTELA	QUANTIDADE		CUSTO US\$				TOTAL GERAL US\$ (1000)
			LIVROS	PACOTES	LIVROS		PACOTES		
					UNITÁRIO-US\$ (I)	TOTAL US\$ (1000)	UNITÁRIO-US\$ (I)	TOTAL - US\$ (1000)	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias . Pacotes	1980 ANO I	Alunos 2a. série				<u>23</u>			<u>23</u>
			13.701	-	1,68	23	-	-	23
		-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias . Pacotes	1981 ANO II	Alunos 2a. 4a. Série				<u>25</u>			<u>25</u>
			17.423	-	1,43	25	-	-	25
		-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias . Pacotes	1982 ANO III	Alunos de 1a./4a. série Alunos Professores				<u>799</u>		<u>770</u>	<u>1.569</u>
			722.000	-	1,107	799	-	-	847
			-	100.510	-	6,71	674	770	
			-	10.000	-	9,60	96	-	
									<u>1.617</u>
									847
									770

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % (1)		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % (1)	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1980 ANO I											
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1981 ANO II						0,8	19	178	159	936	
			1	19.243	94.710	75.467	493	0,6	14	137	123	973
		0,3	224	60.000	59.776	26.786	0,2	5	41	36	825	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1982 ANO III						31	744	1.621	887	218	
			47	904.421	477.500	426.921	79	28	667	784	117	118
		6	35.248	207.000	171.752	588	3	77	837	760	1.088	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
Total Geral							32	763	1.799	1.036	236	
			48	923.664	572.210	351.454	62	28	681	921	240	135
		6,3	35.472	267.000	231.528	753	4	82	878	796	1.072	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (PJA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
TU\$ = { ANO I - Cr\$ 85,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO PA EXECUÇÃO - 80/82  
CUSTO DO PROJETO

ESTADO: CEARÁ  
FOLHA N° QD 2/3

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	CLIENTELA	QUANTIDADE		CUSTO US\$				TOTAL GERAL US\$ (1000)
			LIVROS	PACOTES	LIVROS		PACOTES		
					UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL US\$(1000)	UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL-US\$(1000)	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias . Pacotes	1980 ANO I	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias  . Pacotes	1981 ANO II	Alunos 1a. série Alunos 1a. série Livros p/ professoras Alunos 1a. 4a. Séries	46.200 46.200 2.310 -	- - - 60.000	1,796 1,06 2,16 -	83 49 5 -	- - - 0,68	41 - - 41	178 - - -
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias  . Pacotes	1982 ANO III	Alunos 1a. série Alunos 2a. série Prof. Guias Prof. Módulos Alunos Professores	300.000 124.000 13.000 40.500 - -	- - - - 200.000 7.000	1,70 0,895 1,23 3,63 - -	510 111 16 147 - -	- - - - 3,97 6,29	838 - - - 794 44	1.622 - - - - -
. Livros e Guias . Pacotes									1.800 178 1.622

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: MARANHÃO  
FOLHA Nº QE 2/4

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1980 ANO I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1981 ANO II	0,75	-	20.574	20.574	100	-	6	77	71	1.283	
		8	3.722	6.697	2.975	180	0,75	6	14	8	231	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1982 ANO III	24	-	-	-	-	-	197	186	11	94,5	
		27	107.028	82.340	24.688	77	22	180	148	32	83	
		25	11.911	70.000	58.089	588	2	17	38	21	223	
<b>TOTAL GERAL</b>												
Total Geral		25					25	203	263	60	129	
. Livros e Guias		27	107.028	102.914	4.114	97	22	180	211	31	118	
. Pacotes		33	15.633	76.697	61.964	491	3	23	52	29	225	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
TU\$:

ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 150,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## DETALHAMENTO PA EXECUÇÃO - 80/82

### CUSTO DO PROJETO

ESTADO: MARANHÃO

FOLHA Nº QD 2/4

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	CLIENTELA	QUANTIDADE		CUSTO US\$				TOTAL GERAL US\$ (1000)
			LIVROS	PACOTES	LIVROS		PACOTES		
					UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL - US\$(1000)	UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL -US\$(1000)	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias . Pacotes	1980 ANO I	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias  . Pacotes	1981 ANO II	Alunos 1a. série Professores Alunos 1a. 4a. Séries -	20.000 574 - -	- - 6.697 -	- 2,75 13,94 -	63 55 8 -	- - - 2,09	14 - - 14	77 - - -
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias  . Pacotes	1982 ANO III	Professores Alunos 1a. 2a. Séries Alunos 3a. 4a. Séries Alunos 1a. 8a. Séries	2.500 70.000 9.840 -	- - - 70.000	7,60 1,51 2,34 -	148 19 106 23 -	- - - - 0,54	38 - - - 38	186 - - - -
. Livros e Guias . Pacotes									263 77 186

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO PARAÍBA  
FOLHA Nº  
QE 2/5

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)					
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P (I) %		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P (I) %		
<u>Desenvolvimento de Currículo e Supervisão</u>	<u>1980</u> ANO I												
. Livros e Guias			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Pacotes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Desenvolvimento de Currículo e Supervisão</u>	<u>1981</u> ANO II						<u>33</u>	<u>355</u>	<u>363</u>	<u>8</u>	<u>102</u>		
. Livros e Guias		99	124.080	137.514	13.434	111	20	195	147	48	76		
. Pacotes		42	83.640	39.140	44.500	47	13	160	216	56	135		
<u>Desenvolvimento de Currículo e Supervisão</u>	<u>1982</u> ANO III						<u>26</u>	<u>285</u>	<u>285</u>	<u>0</u>	<u>100</u>		
. Livros e Guias		67	82.720	114.000	31.280	138	12	131	143	12	109		
. Pacotes		40	81.180	34.500	46.680	43	14	154	142	12	93		
			<b>TOTAL GERAL</b>										
<u>Total Geral</u>							<u>59</u>	<u>640</u>	<u>648</u>	<u>8</u>	<u>101</u>		
. Livros e Guias		166	206.800	251.514	44.714	122	30	326	290	36	89		
. Pacotes		82	164.820	73.640	91.180	45	29	314	358	44	115		

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(I)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1US=

ANO I - Cr\$ 85.17  
ANO II - Cr\$ 80.00  
ANO III - Cr\$ 160.00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO - 80/82

ESTADO: PARAÍBA  
 FOLHA Nº QD 2/5

### CUSTO DO PROJETO

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	CLIENTELA	QUANTIDADE		CUSTO US\$				TOTAL GERAL US\$ (1000)
			LIVROS	PACOTES	LIVROS		PACOTES		
					UNITÁRIO-US\$ (1)	TOTAL US\$ (1000)	UNITÁRIO-US\$ (1)	TOTAL-US\$ (1000)	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias . Pacotes	1980 ANO I	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias  . Pacotes	1981 ANO II	Alunos 1a. 4a.Séries Alunos 1a. 4a.Séries Professores	137.514 - -	- 37.724 1.416	1,07 - -	147 147 -	- - 19,07	215 - 188 27	362
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias  . Pacotes	1982 ANO III	Alunos 1a. a 4a.Série Alunos 1a. a 4a.série Professores	114.000 - -	- 33.000 1.500	1,25 - -	143 143 -	- 3,76 12,67	143 - 124 19	286
. Livros e Guias . Pacotes									648 362 286

OBS

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO:  
 PERNAMBUCO  
 FOLHA Nº QE 2/6

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % (1)		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % (1)	
<u>Desenvolvimento de Currículo, e Supervisão</u>	<u>1980</u> ANO I						<u>0,5</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	
. Livros e Guias		2	2.884	692	2.192	24	0,3	5	5	0	102	
. Pacotes		4	1.084	1.463	379	135	0,2	2	2	0	81	
<u>Desenvolvimento de Currículo e Supervisão</u>	<u>1981</u> ANO II						<u>15</u>	<u>194</u>	<u>159</u>	<u>35</u>	<u>82</u>	
. Livros e Guias		12	18.511	15.799	2.712	86	5	61	75	14	123	
. Pacotes		25	66.674	18.935	47.739	29	10	133	84	49	64	
<u>Desenvolvimento de Currículo e Supervisão</u>	<u>1982</u> ANO III						<u>23</u>	<u>303</u>	<u>315</u>	<u>12</u>	<u>103</u>	
. Livros e Guias		12	18.452	78.990	60.538	428	12	162	158	4	98	
. Pacotes		26	68.107	73.900	5.793	109	11	141	157	16	112	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
<u>Total Geral</u>							<u>38</u>	<u>504</u>	<u>481</u>	<u>23</u>	<u>95</u>	
. Livros e Guias		26	39.847	95.481	55.634	240	17	228	238	10	105	
. Pacotes		55	135.865	94.298	41.567	70	21	276	243	33	88	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
 1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 65,17  
 ANO II - Cr\$ 80,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO PA EXECUÇÃO - 80/82

ESTADO: PERNAMBUCO

CUSTO DO PROJETO

FOLHA Nº OD 2/5

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	CLIENTELA	QUANTIDADE		CUSTO US\$				TOTAL GERAL US\$ (1000)
			LIVROS	PACOTES	LIVROS		PACOTES		
					UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL US\$(1000)	UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL-US\$(1000)	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias  . Pacotes	1980 ANO I	Alunos 1a. série Alunos tipo A	692	-	7,23	5	-	-	7
			-	1.463	-	-	1,37	2	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias  . Pacotes	1981 ANO II	Alunos 1a. ALFA	4.000	-	11,25	45	-	-	158
		Alunos 1a. série	10.912	-	2,47	27	-	-	
		Professores	887	-	2,25	2	-	-	
		Alunos	-	15.831	-	-	3,03	48	
		Professores	-	1.581	-	-	4,43	7	
Escolas	-	1.523	-	-	19,04	29			
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão . Livros e Guias  . Pacotes	1982 ANO III	Alunos 1a. 3a, 4a.	61.990	-	0,61	38	-	-	316
		Versão Tes-te/Alunos	8.000	-	2,75	22	-	-	
		1a. série	9.000	-	11,00	99	-	-	
		Cartilha ALFA 1 e 2	-	73.200	-	-	2,08	152	
		ALFA 1 a 4	-	700	-	-	7,14	5	
		Professores	-	-	-	-	-	-	
. Livros e Guias	-	-	-	-	-	-	-	481	
. Pacotes	-	-	-	-	-	-	-	238	
								243	

OBS

1

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- <sup>(1)</sup> %		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- <sup>(1)</sup> %
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1980 ANO I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1981 ANO I	7	57.579	25.000	32.579	44	5.5	103	62	41	60
		7	28.333	12.607	15.726	45	2.7	51	38	13	74
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1982 ANO III	42	329.020	235.388	93.632	72	25	465	374	91	80
		39	160.175	100.059	60.116	63	16	290	199	91	69
			<b>TOTAL GERAL</b>								
Total Geral		49	386.599	260.388	126.211	68	30	568	436	132	76
		46	188.508	112.666	75.842	60	18	341	237	104	70
							12	227	199	28	88

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WPI- PLANO OPERATIVO ANUAL (PJA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
 1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 85.17  
 ANO II - Cr\$ 80.00  
 ANO III - Cr\$ 160.00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL / NE

**DETALHAMENTO PA EXECUÇÃO- 80/82**

**CUSTO DO PROJETO**

ESTADO: PIAUÍ  
 FOLHA Nº QD 2/7

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	CLIENTELA	QUANTIDADE		CUSTO US\$				TOTAL GERAL US\$ (1000)
			LIVROS	PACOTES	LIVROS		PACOTES		
					UNITÁRIO-US\$ (I)	TOTAL US\$ (1000)	UNITÁRIO-US\$ (I)	TOTAL US\$ (1000)	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1980 ANO I	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1981 ANO II	Aluno 1a. série	25.000	-	1,52	<u>38</u> 38	-	<u>24</u> -	<u>62</u>
		Aluno 1a. 4a.	-	12.207	-	-	1,64	20	
		Professores	-	400	-	-	10	4	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1982 ANO III	Aluno 2a.S	229.288	-	0,82	<u>199</u> 188	-	<u>175</u> -	<u>374</u>
		Aluno 2a.S	3.000	-	2	6	-	-	
		Professores	3.000	-	1,67	5	-	-	
		Professores	100	-	4	0.4	-	-	
		Aluno 1a. 4a. Professor 1a. 4a.	- -	97.006 3.053	- -	- -	- -	1,56 7,86	151 24
. Livros e Guias								<u>436</u>	
. Pacotes								237	
								199	

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO:  
RIO GRANDE DO NORTE  
FOLHA Nº QE 2/8

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % <sup>(1)</sup>
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1980 ANO I						0,14	1	38	37	3.800
. Livros e Guias		-	-	-	-	-	0,14	1	-	1	0
. Pacotes		0	-	8.165	3.165	100	-	-	38	38	100
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1981 ANO II						21	156	78	78	50
. Livros e Guias		-	-	-	-	-	0,5	4	-	4	0
. Pacotes		24	24.935	22.194	2.741	89	20,5	152	78	74	52
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1982 ANO III						17	129	161	32	80
. Livros e Guias		-	-	-	-	-	0,5	4	-	4	0
. Pacotes		21	21.750	17.007	4.743	79	16,5	125	161	36	129
			TOTAL GERAL								
Total Geral							38	286	277	9	97
. Livros e Guias		-	-	-	-	-	1	9	-	9	0
. Pacotes		45	46.685	47.366	681	102	37	277	277	0	100

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL { ANO I - Cr\$ 85,17  
ANO II - Cr\$ 90,00  
ANO III - Cr\$ 160,00  
1 US\$:

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDUCURJAL/NE

## DETALHAMENTO PA EXECUÇÃO - 80/82

### CUSTO DO PROJETO

ESTADO  
 R.G. DO NORTE  
 FOLHA Nº QD 2/8

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	CLIENTELA	QUANTIDADE		CUSTO US\$				TOTAL GERAL US\$ (1000)
			LIVROS	PACOTES	LIVROS		PACOTES		
					UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL US\$(1000)	UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL-US\$(1000)	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1980 ANO I	Aluno 1a. 4a.	-	7.750	-	-	2,71	21	<u>38</u>
		Professor	-	415	-	-	40,96	17	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1981 ANO II	Aluno 1a. série	-	11.000	-	-	3,55	39	<u>77.9</u>
		Aluno 2a.S.	-	4.762	-	-	3,15	15	
		Professor	-	615	-	-	1,46	0,9	
		Aluno 1 <sup>a</sup> 4 <sup>a</sup>	-	5.481	-	-	2,19	12	
		Sala de aula	-	336	-	-	32,74	11	
	1982 ANO III	Aluno	-	16.047	-	-	5,92	<u>161</u>	<u>161</u>
		Aluno/Prof.	-	960	-	-	68,75	95 66	
. Livros e Guias . Pacotes									<u>276.9</u> - <u>276.9</u>

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO:  
SERGIPE  
FOLHA Nº  
QE 2/9

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- <sup>(1)</sup> %		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- <sup>(1)</sup> %	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1980 ANO I											
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1981 ANO II						12	66	70	4	106	
			10	9.450	16.570	7.120	176	4	21	70	49	334
			-	-	-	0	8	45	-	45	0	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1982 ANO III						18	96	303	207	315	
			24	22.680	76.915	54.235	340	10	51	216	165	423
			-	90.000	-	300	8	45	87	42	195	
			TOTAL GERAL									
Total Geral							30	162	373	211	230	
				32.130	93.485	61.355	291	13	72	286	214	397
			-	90.000	-	150	17	90	87	3	98	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)-REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1US\$:

ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO - 80/82  
CUSTO DO PROJETO

ESTADO: SERGIPE  
FOLHA Nº QD 2/9

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	CLIENTELA	QUANTIDADE		CUSTO US\$				TOTAL GERAL US\$ (1000)
			LIVROS	PACOTES	LIVROS		PACOTES		
					UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL US\$(1000)	UNITÁRIO-US\$(1)	TOTAL-US\$(1000)	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1980 ANO I	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1981 ANO II	Aluno 1a.S	16.570	-	4,22	70 70	-	-	70
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão	1982 ANO III	Aluno 1a.S.	59.500	-	2,18	216 130	-	87	303
		Aluno 2a.S.	12.000	-	3,17	38	-	-	
		Escolas e Prof.	5.415	-	8,86	48	-	-	
		Alunos 1a. 4a.Séries	-	90.000	-	-	-	0,97	
.Livros e Guias . Pacotes									373 286 87

OBS

**PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO**

D M 2

**DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS**

METAS	REALIZADO		PREVISTO				REALIZADO	
	80/82	%	83	%	84	%	TOTAL	%
Livros e Guias	2.182.728	44	670.304	14	2.065.582	42	4.918.614	100
Pacotes	894.727	46	653.600	34	388.690	20	1.817.400	100


**DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS**

METAS	REALIZADO		PREVISTO				SALDO	%	TOTAL GERAL	%
	80/82	%	83	%	84	%				
Livros e Guias	3.077	31	1.677	17	5.166	52	-	-	9.920	100
Pacotes	2.890	48	1.961	33	1.168	19	-	-	6.019	100


# PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO

## PROGRAMAÇÃO FÍSICA

GRÁFICO Nº

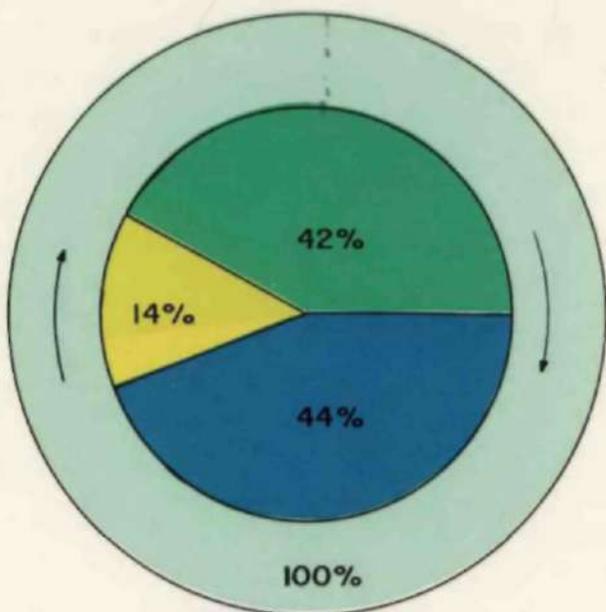

LIVROS E GUIAS

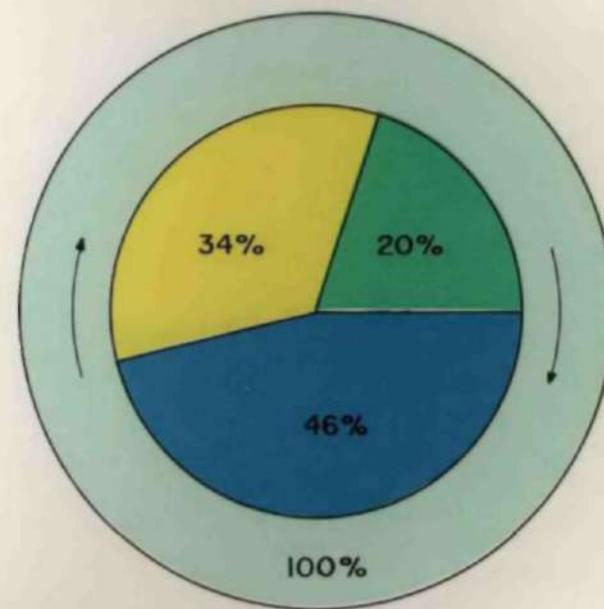


PACOTES


### LEGENDA

- PROGRAMAÇÃO GERAL-80/85
- REALIZADO-80/82
- PROGRAMADO-83
- PROGRAMADO-84

# PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

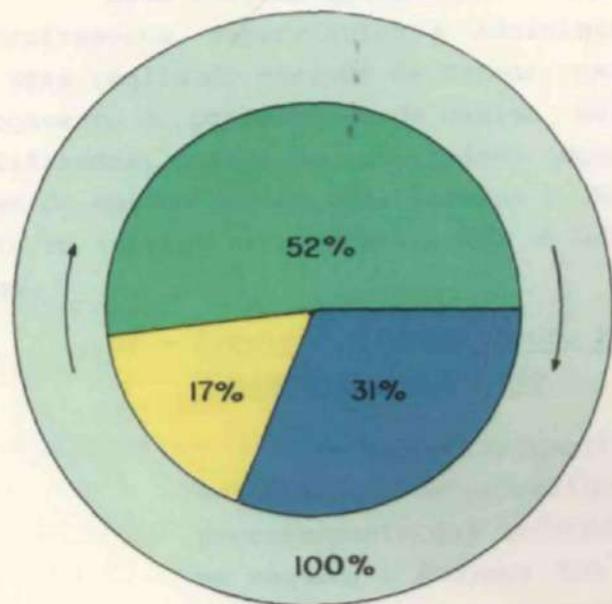

**LIVROS E GUIAS**

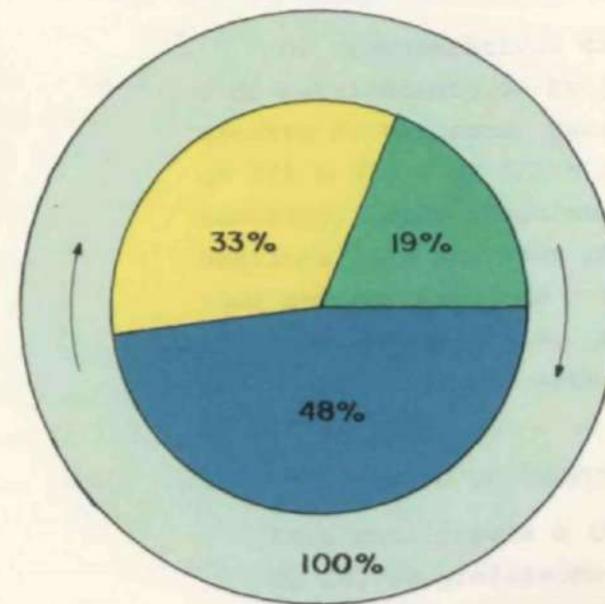

**PACOTES**

**LEGENDA**

-  PROGRAMAÇÃO GERAL - 80/85
-  REALIZADO - 80/82
-  PROGRAMADO - 83
-  PROGRAMADO - 84

Este Projeto destina-se a treinamento de Professores, Supervisores e Administradores, que será realizado através de cursos para aperfeiçoamento de professores de ensino básico não qualificados, cursos de atualização para professores de ensino básico qualificados e de treinamento em serviço para supervisores e administradores.

a) - Execução e Detalhamento Físico e Financeiro por Estado

Para maior racionalização e uniformidade de procedimentos no processamento das informações que se seguem, o Projeto foi subdividido em duas metas tendo por base o detalhamento físico e o volume de recursos alocados para as ações de maior representatividade que são: Treinamento de Professores e Outros.

b) - Análise dos Componentes Físicos

Os demonstrativos da Execução e do Detalhamento do Projeto Treinamento de Recursos Humanos (ver QE 3/1 a 3/9 e QD 3/1 a 3/9) apresentados, estão sendo submetidos a análises mais acuradas para um melhor entendimento do desempenho efetuado. Mesmo assim, o comportamento das metas se apresentou da seguinte forma:

i - TREINAMENTO DE PROFESSORES

Esta meta previa o treinamento de 20.780 professores dos quais foram treinados 21.175 equivalente a 102% no período 80/82. A diferença de 2% representa não somente o maior desempenho no período como também ultrapassa o total geral da meta.

Entretanto, pela natureza dos cursos existe uma correlação entre "tipo de curso", "clientela diversificada" e "mesma clientela" que se faz presente de forma constante e repetida durante o processo. (ver DM 3).

ii - OUTROS

A meta tem como previsão o treinamento de 2.950 técnicos dos quais foram treinados 2.239 o equivalente a 76% da total geral programado. Este desempenho acima da média tem como justificativa as mesmas razões anteriormente apresentadas, o que se não for devidamente esclarecido dará margem a uma interpretação distorcida da realidade. (ver DM 3).

c) - Análise dos Comportamentos Financeiros

Quanto aos componentes financeiros do Projeto, vale dizer que a linha de procedimentos foi a mesma seguida para os componentes físicos.

i - TREINAMENTO DE PROFESSORES

Foram alocados para o período 80/82 a importância de U\$ 9.104 mil para uma aplicação no valor de U\$ 5.251 mil o que representa 58% previsto para o período e 40% do total geral da meta. A diferença apresentada entre o valor alocado e o aplicado correspondente a U\$ 3.853 mil equivalente a 42% é decorrente da superestimação

de custos e uma diferença insignificante de 3% entre a meta física programada e a realizada (ver DM 3).

ii - OUTROS

Nesta meta foram realizadas despesas da ordem de U\$ 395 mil correspondente a 106% do valor previsto para o período 80/82 e 59% do valor total da meta. Fica configurado um excesso de aplicação na ordem de 6% não se identificando a contrapartida correspondente através de antecipação na meta física. (ver DM 3).

d) - Conclusão

Em síntese, conclue-se que as metas físicas apresentam uma diferença entre a relação do que foi executado pelos Estados, 50%, (média) e o previsto no WP 53%

(média) pode ser considerado como um resultado satisfatório e altamente positivo.

Seguindo o mesmo procedimento foi levantada a média da execução financeira realizada pelos Estados (49,5%) para o período 80/82, e o previsto nos WPs (90%) para o mesmo período. O resultado indica uma significativa defasagem, confirmando certa superestimação de custos no orçamento do projeto.

No que diz respeito aos custos dos cursos programados a falta de homogeneidade, em função do número de horas e do número de participantes e dos locais diferenciados onde são realizados os cursos não permite uma comparação efetiva. Tal fato é

é também decorrente da inexistên  
cia de um estudo mais elaborado  
sobre custo quando da elaboração  
do projeto.

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1980</u>						<u>25</u>	<u>104</u>	<u>56</u>	<u>48</u>	<u>54</u>
. Treinamento de Professores	ANO I	100	356	276	80	77	24	98	55	42	56
. Outros		72	132	23	109	17	1	6	1	6	17
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1981</u>						<u>37</u>	<u>153</u>	<u>18</u>	<u>135</u>	<u>12</u>
. Treinamento de Professores	ANO II	100	356	227	129	64	36	146	13	133	9
. Outros		38	69	47	22	68	1	7	5	2	71
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1982</u>						<u>14</u>	<u>59</u>	<u>79</u>	<u>20</u>	<u>134</u>
. Treinamento de Professores	ANO III	100	356	336	20	94	13	52	76	(*) 24	147
. Outros		69	125	69	56	55	1	7	3	4	43
<b>TOTAL GERAL</b>											
TOTAL GERAL							<u>76</u>	<u>316</u>	<u>153</u>	<u>163</u>	<u>49</u>
. Treinamento de Professores		-	-	-	-	-	73	296	144	152	48
. Outros		-	-	-	-	-	3	20	9	11	45

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL {  
ANO I - Cr\$ 63.17  
ANO II - Cr\$ 80.00  
ANO III - Cr\$ 160.00  
1U\$=

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO ALAGOAS  
 FOLHA Nº QD 3/1

PROJETO META	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		CUSTO US\$ 1.000,00			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		Nº DE PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO PARTICIPANTE		TOTAL US\$ (1000)	
				HORA-US\$(1)	UNITÁRIO US\$(1)		
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1980</u> ANO I						<u>56</u>
. Qualif. de Profºs Leigos		276	240	0,80	201	55	
. Atual. de eqs. SEC e Órgs. Regionais		23	40	0,40	17	1	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1981</u> ANO II						<u>18</u>
. Qual. de Profºs Leigos		227	80	0,70	58	13	
. Atual. das equipes OMES		19	60	1,05	64	1	
. Atual. de Superv. em serviço		15	80	1,80	51	2	
. Atual. de Superv. em trein. básico		13	120	0,90	111	2	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1982</u> ANO III						<u>79</u>
. Qual. de Profºs Leigos		280	320	0,80	263	74	
. Atual. de Profºs de 1ª a 4ª séries		56	80	0,60	49	2	
. Atual. de Superv. em Serviço		43	40	1,30	43	2	
. Atual. das equipes OMES		26	40	0,75	31	1	
. Professores							<u>153</u>
. Outros							<u>144</u>
							9

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA - 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1980</u>						<u>1</u>	<u>18</u>	<u>56</u>	<u>38</u>	<u>311</u>	
. Treinamento de Professores	ANO I	1,4	40	1.352	1.312	3.380	0,8	15	55	40	366	
. Outros		4,7	31	54	23	174	0,2	3	1	2	33	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1981</u>						<u>48</u>	<u>856</u>	<u>48</u>	<u>808</u>	<u>5</u>	
. Treinamento de Professores	ANO II	65	1.890	720	1.170	38	47	846	29	817	3,5	
. Outros		13	84	48	36	57	1	10	19	9	190	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1982</u>						<u>51</u>	<u>922</u>	<u>484</u>	<u>438</u>	<u>52</u>	
. Treinamento de Professores	ANO III	64	1.856	720	1.136	39	50	910	426	484	47	
. Outros		13	84	118	34	140	1	12	58	46	483	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
TOTAL GERAL							<u>100</u>	<u>1.796</u>	<u>588</u>	<u>1.208</u>	<u>33</u>	
. Treinamento de Professores		-	-	-	-	-	98	1.771	510	1.261	29	
. Outros		-	-	-	-	-	2	25	78	53	312	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
 1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 85,17
ANO II - Cr\$ 80,00
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SÉPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80 / 82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO BAHIA  
FOLHA Nº QD 3/2

PROJETO META	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		CUSTO US\$			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		Nº DE PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO PARTICIPANTE		TOTAL US\$ (1000)	
				HORA-US\$(1)	UNITÁRIO US\$(1)		
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1980</u>						<u>56</u>
. Atualização de Professores		1.352	80	0,50	41	55	
. Atualização de Técnicos OMES		54	80	0,09	7	1	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1981</u>						<u>48</u>
. Atualização de Professores		720	80	0,50	41	29	
. Atualização de Técnicos dos OMES		48	80	5,0	408	19	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1982</u>						<u>484</u>
• Treinamento de Professores Leigos		-	-	-	-	189	
. Atualização de Professores		720	80	4,0	329	237	
. Atualização de Prof. Trein. básico		40	80	4,0	348	14	
. Atualização de Superv. Trein. em Serviço		78	80	7,0	576	44	
. Professores							<u>588</u>
. Outros							524
							64

OBS

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: CEARÁ

FOLHA Nº 02 3/3

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros	<u>1980</u> ANO I	- 7	- 75	- 74	- 1	- 99,0	<u>1</u> 1	<u>10</u> 10	<u>6</u> 6	<u>4</u> 4	- 60	
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros	<u>1981</u> ANO II	0,16 66	800 693	491 234	309 459	61,0 34,0	<u>18</u> 15 3	<u>550</u> 469 81	<u>254</u> 222 32	<u>296</u> 247 49	<u>46</u> 47 39	
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros	<u>1982</u> ANO III	68 16	3.400 163	3.000 505	400 342	88,0 309,0	<u>65</u> 64 1	<u>2.031</u> 1.993 38	<u>1.028</u> 957 71	<u>1.003</u> 1.036 33	<u>50</u> 48 187	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
TOTAL GERAL . Treinamento de Professores . Outros		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	<u>84</u> 79 5	<u>2.591</u> 2.472 119	<u>1.288</u> 1.185 103	<u>1.303</u> 1.287 16	<u>50</u> 48 87	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WPI)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
 1US\$=

ANO I - Cr\$ 65,17  
 ANO II - Cr\$ 80,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80 / 82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO CEARÁ  
FOLHA Nº QD 3/3

PROJETO META	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		CUSTO US\$			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		Nº DE PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO PARTICIPANTE		TOTAL US\$ (1000)	
				HORA-US\$(I)	UNITARIO US\$(I)		
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento de Instrutores	<u>1980</u>	74	40	2,2	89	6	<u>6</u>
TREINAMENTO CE RECURSOS HUMANOS . Treinamento de Instrutores . Qualificação de Professores Leigos . Atualização de Sup.Trein.Básico . Treinamento de Técnico dos OMES	<u>1981</u>	60 491 96 78	40 120 120 80	1,4 3,7 1,1 2,5	58 453 136 196	4 222 13 15	<u>254</u>
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento de Instrutores . Qualificação de Professores Leigos . Atualização de Supervisores Treinamento básico	<u>1982</u>	346 3.000 159	40 154 120	2,0 2,1 2 3	81 319 271	28 957 43	<u>1.028</u>
. Professores . Outros							<u>1.238</u> 1.179 109

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % <sup>(1)</sup>	
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros	<u>1980</u>											
	ANO I	68	95	22	73	23,0	2 2	14 14	2 2	12 12	14 14	
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros	<u>1981</u>											
	ANO II	100 68	1.800 95	600 27	1.200 68	33,0 28,0	39 38 1	420 408 12	205 196 9	215 212 3	49 48 75	
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros												
		100 68	1.800 95	1.800 176	- 81	100,0 185,0	33 32,5 0,5	353 346 7	473 446 27	120(-) 100 20	134 134 190	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
TOTAL GERAL . Treinamento de Professores . Outros							74 72 2	787 768 19	680 644 36	107 124 17	87 84 190	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (PJA)  
 (1)-REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL < { ANO I - Cr\$ 88,17  
 ANO II - Cr\$ 80,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00  
 1US\$=

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80 / 82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO MARANHÃO  
FOLHA Nº QD 3/4

PROJETO META	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		CUSTO US\$			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		Nº DE PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO PARTICIPANTE		TOTAL US\$ (1000)	
				HORA-US\$(I)	UNITÁRIO US\$(I)		
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Atualização de Técnicos da Séc. e Equipes Regionais e Municipais	<u>1980</u>	22	64	1,4	89	2	<u>2</u>
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Atualização de Técnicos das Equipes OMES . Qualificação de Professores Leigos	<u>1981</u>	27 600	320 630	1,0 0,5	363 1	9 196	<u>205</u>
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Atualização de Téc. da Séc. e Equipes Regionais e Municipais . Atualização de Téc. das Equipes OMES . Qualificação de Professores Leigos . Semana Pedagógica	<u>1982</u>	23 23 600 1.200 130	40 320 670 630 40	2,2 0,5 0,4 0,4 4,0	87 149 1 1 172	2 3 151 295 22	<u>473</u>
. Professores							<u>680</u>
. Outros							642
							38

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros	<u>1980</u>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros	<u>1981</u>	33 100	450 87	450 24	- 63	100,0 30,0	32 1	358 14	211 3	147 11	60,0 21,0	
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros	<u>1982</u>	67	900 -	900 64	- -	100,0 100,0	31 -	356 -	356 14	- 14	96,0 100,0	
<b>TOTAL GERAL</b>												
TOTAL GERAL . Treinamento de Professores . Outros							63 62 1	714 700 14	567 550 17	147 150 3	80 79 120	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA GAMBIAL  
 1 US\$

ANO I - Cr\$ 65,17  
 ANO II - Cr\$ 80,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80 / 82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO PARAÍBA  
FOLHA Nº QD 3/5

PROJETO	META	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		CUSTO US\$			TOTAL GERAL US\$ (1000)
			Nº DE PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO PARTICIPANTE		TOTAL US\$ (1000)	
		HORA-US\$ (I)			UNITÁRIO US\$ (I)			
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		(*) <u>1981</u>						<u>211</u>
. Qualificação de Professores Leigos a nível de 1º grau			450	500	0,80	464	208	
. Treinamento de Supervisores			24	120	0,9	106	3	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		<u>1982</u>						<u>356</u>
. Qualificação de Professores Daigos a nível de 1º grau			900	720	0,5	381	342	
. Treinamento de Supervisores			32	160	1,4	218	7	
. Treinamento de Chefes dos OMES			31	80	2,5	202	7	
1980 - ANO I: Não houve programação								
. Professores								<u>567</u>
. Outros								550
								17

OBS

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO:  
 PERNAMBUCO  
 FOLHA Nº QE 3/6

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros	1980						<u>7</u>	<u>7</u>	<u>31</u>	<u>9</u>	<u>22</u>	<u>29</u>
			-	374	-	100,0	7	7	31	9	22	
			127	-	-	0						
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros	1981						<u>13</u>	<u>57</u>	<u>48</u>	<u>9</u>		
			22	468	16	97,0	12,5	52	34	18	66	
			40	88	71	180,0	0,5	5	14	9	27	
Treinamento de Recursos Humanos . Treinamento de Professores . Outros	1982						<u>15</u>	<u>63</u>	<u>82</u>	<u>19</u>		
			25	520	60	88,0	13	58	65	7	112	
			40	88	12	114,0	2	5	17	12	340	
<b>TOTAL GERAL</b>												
TOTAL GERAL . Treinamento de Professores . Outros							<u>35</u>	<u>151</u>	<u>139</u>	<u>12</u>	<u>92</u>	
							32	141	108	33	77	
							3	10	31	21	310	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
 US\$ = { ANO I - Cr\$ 65,17  
 ANO II - Cr\$ 60,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80 / 82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO PERNAMBUCO

FOLHA Nº QD 3/6

PROJETO META	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		CUSTO US\$			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		Nº DE PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO PARTICIPANTE		TOTAL US (1000)	
				HORA-US\$(1)	UNITARIO US\$(1)		
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Atualização de Professores 1a./4a.	<u>1980</u>	374	120	0,2	24	9	<u>9</u>
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Atualização de Técnicos da SEC e Órgãos Regionais . Atualização de Supervisores . Atualização de Professores 1a./4a. . Atualização de Merendeira	<u>1981</u>	48 91 452 20	80 80 80 40	0,1 1,2 1,0 1,8	78 93 76 69	4 9 34 1	<u>48</u> 4 9 34 1
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Atualização de Supervisores . Atualização de Professores 1a./4a. . Atualização de Merendeira	<u>1982</u>	60 460 40	160 80 40	1,5 1,8 1,6	234 144 64	14 65 3	<u>82</u> 14 65 3
. Professores . Outros							<u>139</u> 108 31

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: PIAUÍ  
FOLHA Nº QE 3/7

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % <sup>(1)</sup>	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1980</u>						<u>6</u>	<u>210</u>	<u>87</u>	<u>123</u>	<u>41</u>	
. Treinamento de Professores		19	604	310	294	51,0	5	190	71	119	37	
. Outros		43	150	80	70	53,0	1	20	16	4	80	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1981</u>						<u>15</u>	<u>522</u>	<u>263</u>	<u>259</u>	<u>50,0</u>	
. Treinamento de Professores		46	1.476	640	836	43,0	14	492	248	244	50,0	
. Outros		100	350	180	170	51,0	1	30	15	15	50,0	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1982</u>						<u>30</u>	<u>1.029</u>	<u>1.037</u>	<u>18</u>	<u>101</u>	
. Treinamento de Professores		77	2.480	3.081	601	124,0	29,5	1.017	1.017	-	100	
. Outros		57	200	270	70	135,0	0,5	12	20	8	166	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
TOTAL GERAL							<u>51</u>	<u>1.761</u>	<u>1.387</u>	<u>374</u>	<u>79</u>	
. Treinamento de Professores							48	1.699	1.336	363	78	
. Outros							3	62	51	11	83	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (FJA)  
III- REALIZADO & PREVISTO

TAXA CAMBIAL {  
ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00  
1 US\$ =

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80 / 82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO PIAUÍ  
FOLHA Nº QD 3/7

PROJETO META	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		CUSTO US\$			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		Nº DE PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO PARTICIPANTE		TOTAL US\$ (1000)	
				HORA-US\$(1)	UNITARIO US\$(1)		
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Qualificação de Professores Leigos . Aperfeiçoamento de Supervisores	<u>1980</u>						<u>87</u>
		310	600	0,4	230	71	
		80	300	0,7	204	16	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Qualificação de Professores Leigos . Atualização de Professores . Aperfeiçoamento de Supervisores . Seminário de Avaliação	<u>1981</u>						<u>263</u>
		440	460	1,0	516	227	
		200	120	0,9	106	21	
		80	100	1,2	119	9	
		100	40	1,4	55	6	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Qualificação de Professores Leigos . Atualização de Professores . Aperfeiçoamento de Supervisores . Seminário de Avaliação	<u>1982</u>						<u>1.037</u>
		2.081	799	0,6	461	958	
		1.000	120	0,5	59	59	
		135	120	0,7	89	12	
		135	40	1,4	58	8	
							<u>1.387</u>
. Professores							1.336
. Outros							51

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO:  
RIO GRANDE DO NORTE  
FOLHA Nº  
QE 3/8

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1980</u>						<u>18</u>	<u>60</u>	<u>24</u>	<u>36</u>	<u>40</u>	
. Treinamento de Professores		10	260	-	-	0	15	51	24	27	47	
. Outros		24	55	-	-	0	3	9	-	-	0	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1981</u>						<u>22,5</u>	<u>76</u>	<u>41</u>	<u>35</u>	<u>54</u>	
. Treinamento de Professores		19	480	606	126	126,0	20	68	38	30	55	
. Outros		27	62	44	18	70,0	2,5	8	3	5	38	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1982</u>						<u>22</u>	<u>73</u>	<u>72</u>	<u>1</u>	<u>99</u>	
. Treinamento de Professores		22	584	700	116	120,0	20	66	59	7	90	
. Outros		28	64	57	7	89,0	2	7	13	6	186	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
TOTAL GERAL							<u>62,5</u>	<u>209</u>	<u>137</u>	<u>72</u>	<u>66</u>	
. Treinamento de Professores							54	185	121	64	66	
. Outros							8,5	24	16	8	67	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(i)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1US\$=

ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80 / 82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO  
R.G. DO NORTE  
FOLHA Nº QD 3/8

PROJETO META	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		CUSTO US\$			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		Nº DE PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO PARTICIPANTE		TOTAL US\$ (1000)	
				HORA-US\$(I)	UNITÁRIO US\$(I)		
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento inicial de Professores e Supervisores	<u>1980</u>	-	-	-	-	24	<u>24</u>
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento inicial de Professores . Treinamento inicial de Supervisores	<u>1981</u>	606 44	80 80	0,8 0,8	64 64	38 3	<u>41</u>
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento inicial de Supervisores . Reciclagem para Professores	<u>1982</u>	57 700	- 80	- 1,0	215 86	13 59	<u>72</u>
. Professores . Outros							<u>137</u> 121 16

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1980</u>											
. Treinamento de Professores		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
. Outros		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1981</u>						<u>34</u>	<u>583</u>	<u>273</u>	<u>310</u>	<u>47</u>	
. Treinamento de Professores	(*)	152	2.287	1.500	787	66,0	31	544	273	271	50,0	
. Outros		-	40	-	-	0	3	39	-	39	100	
Treinamento de Recursos Humanos	<u>1982</u>						<u>33</u>	<u>567</u>	<u>434</u>	<u>133</u>	<u>76</u>	
. Treinamento de Professores	(*)	152	2.287	2.100	187		30	528	380	148	72,0	
. Outros		100	40	40	-		3	39	54	15	138,0	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
TOTAL GERAL							<u>67</u>	<u>1.150</u>	<u>707</u>	<u>443</u>	<u>62</u>	
. Treinamento de Professores							61	1.072	653	419	61	
. Outros							6	78	54	24	70	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1US\$ { ANO I - Cr\$ 69,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80 / 82

ESTADO SERGIPE  
FOLHA Nº QD 3/9

CUSTOS DO PROJETO

PROJETO META	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		CUSTO US\$			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		Nº DE PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO PARTICIPANTE		TOTAL US\$ (1000)	
				HORA-US\$(1)	UNITÁRIO US\$(1)		
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Habilitação de Professores Leigos	<u>1981</u>	1.500	(*)	-	182	273	<u>273</u>
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Habilitação de Professores Leigos	<u>1982</u>	1.500	(*)	-	222	333	<u>434</u>
. Habilitação de Supervisores		600	48	1,7	79	47	<u>47</u>
. Habilitação de Supervisores		40	710	2,0	1.349	54	<u>54</u>
. Professores							<u>707</u>
. Outros							606
							101

OBS (\*) Ensino Individualizado

PROJETO DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS


METAS	REALIZADO		PREVISTO				REALIZADO	
	80/82	%	83	%	84	%	TOTAL	%
Treinamento de Profs.	21.175	44	16.245	34	10.830	22	48.250	100
Outros	2.239	56	1.139	29	602	15	3.980	100

DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS


METAS	REALIZADO		PREVISTO				SALDO	%	TOTAL GERAL	%
	80/82	%	83	%	84	%				
Treinamento de Profs.	5.251	40	5.167	40	1.247	10	1.359	10	13.024	100
Outros	395	59	195	29	64	9	7	3	661	100

# PROJETO DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

## PROGRAMAÇÃO FÍSICA

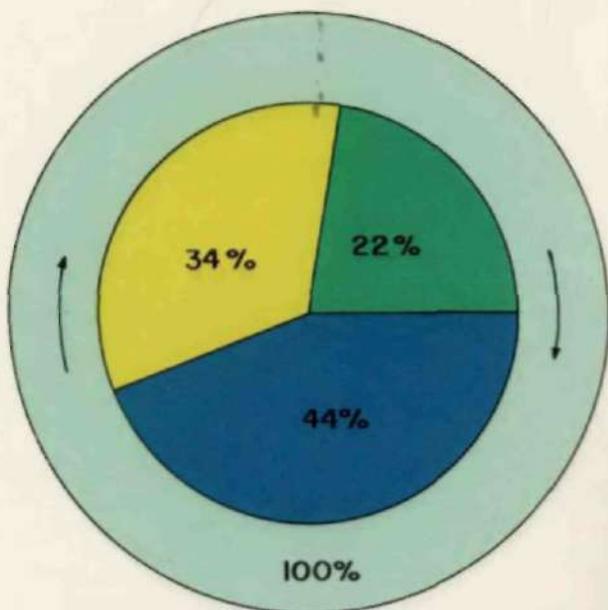

TREINAMENTO DE PROFESSORES

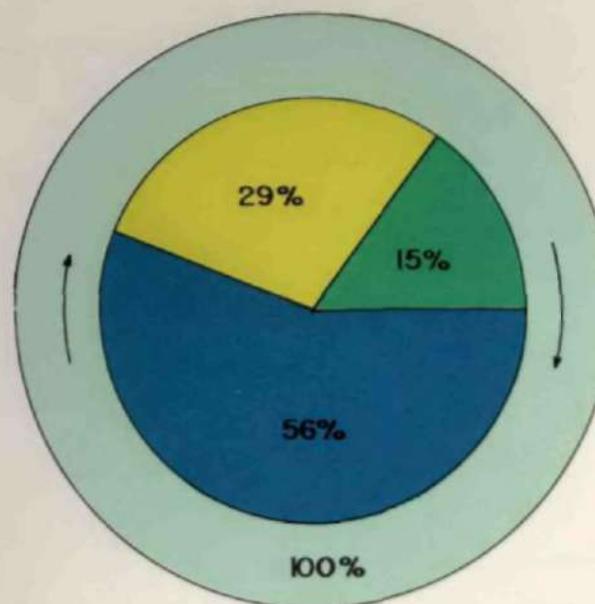

OUTROS


### LEGENDA

- PROGRAMAÇÃO GERAL - 80/85
- REALIZADO - 80/82
- PROGRAMADO - 83
- PROGRAMADO - 84


# PROJETO DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

GRÁFICO Nº

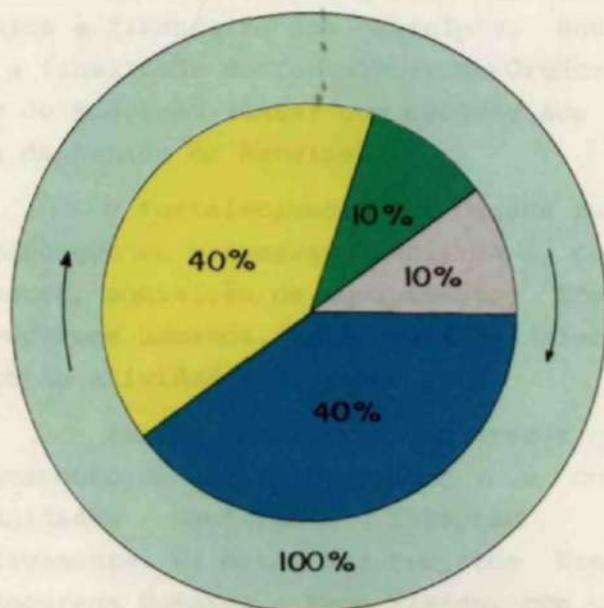

TREINAMENTO DE PROFESSORES

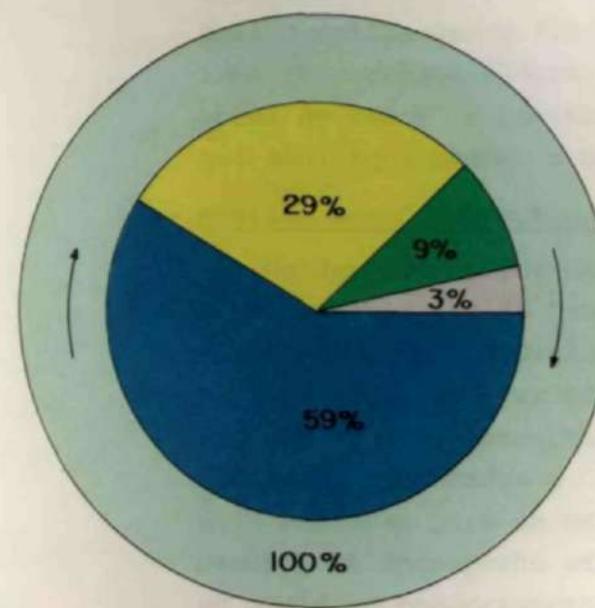

OUTROS

### LEGENDA

-  PROGRAMAÇÃO GERAL - 80/85
-  REALIZADO - 80/82
-  PROGRAMADO - 83
-  PROGRAMADO - 84
-  SALDO

Este Projeto objetiva dar assistência técnica e financeira aos municípios envolvidos, com a finalidade de fortalecer os Órgãos Municipais de Educação (OMEs) com exceção aos municípios do Estado de Sergipe.

O fortalecimento dos órgãos Municipais de Educação se processará mediante a construção de sedes, aquisição de equipamento, treinamento de recursos humanos, suplementação salarial e reforço às atividades de apoio.

Faz-se necessário esclarecer que o treinamento de recursos humanos e a construção de unidades municipais integram respectivamente, às metas dos Projetos Treinamento de Recursos Humanos e Rede Física, com os recursos financeiros correspondentes devidamente alocados aos mesmos.

a) - Execução e Detalhamento Físico e Financeiro por Estado

Assim sendo, o Projeto foi

agrupado em duas metas tendo por base o detalhamento físico e o volume de recursos alocados para as ações de maior representatividade que são: Equipamento e Salário.

b) - Análise dos Componentes Físicos

Os demonstrativos da Execução e do Detalhamento do Projeto de Fortalecimento dos Órgãos Municipais de Educação (ver QE 4/1 a 4/8 e QD 4/1 a 4/8) apresentados, estão sendo submetidos a análises mais acuradas para um melhor entendimento do desempenho efetuaao. Mesmo assim, o comportamento das Metas se apresentou da seguinte forma:

i - EQUIPAMENTO

Nesta meta foram cumpridas todas as ações previstas para o período

80/82. Ou seja o equipamento de 234 unidades referentes as sedes dos Órgãos Municipais de Educação.

ii - SALÁRIOS

No que se refere a esta meta o projeto atingiu a 53% do previsto suplementando salários de 1.085 pessoas, ficando 47% do total geral programado para ser realizado no período 83/84.

c) - Análise dos Componentes Financeiros

Quanto aos componentes financeiros do Projeto vale ressaltar que a linha de procedimentos seguida, foi a mesma para os componentes físicos.

i - EQUIPAMENTO

Para o período 80/82 foram alocados a importância de U\$ 4 58 mil dos quais foram aplicados U\$ 330 mil o equivalente a aproximadamente 60%, que corresponde a 66% do valor total programado (ver DM 4).

ii - SALÁRIO

Nesta meta foram realizadas no período 80/82 a aplicação de U\$ 1.039 mil equivalente a 72%, que corresponde a 54% do valor total programado (ver DM 4).

d) - Conclusão

Em síntese, para uma melhor compreensão do desenvolvimento do Projeto de Fortalecimento dos Órgãos Municipais de Educação, no aspecto físico, comparamos as médias

entre o que foi executado pelas unidades federadas 58% e o previsto nos Working Papers 60% e se constata que a diferença é irrelevante dada as peculiaridades do projeto, e que a correlação entre os dois percentuais indica uma situação altamente positiva.

Quanto ao aspecto financeiro do projeto é conveniente ressaltar, que muito embora a meta física "equipamento", já esteja concluída ainda assim faz-se necessário a alocação de recursos para o exercício de 83 com a finalidade de complementar o "equipamento" de algumas unidades do projeto, apresentando ainda aquela meta um saldo de U\$ 93 mil.

Quanto a meta "salários" apesar das ações programadas para os

exercícios de 1983 e 1984, mesmo assim, estima-se um saldo da ordem de U\$ 218 mil o equivalente a 11% do valor total programado.

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: ALAGOAS  
FOLHA Nº QE 4/1

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1980 ANO I		(*)				14	12	0	12	—	
. Equipamento				-			12	10	0	10		
. Salário				-			2	2	0	2		
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1981 ANO II		(*)				44	39	0	39	—	
. Equipamento				-			19	17	0	17	-	
. Salário				-			25	22	0	22	-	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1982 ANO III		(*)				45	40	40	0	100	
. Equipamento				13			20	18	0	18	-	
. Salário				72			25	22	40	18	181	
			TOTAL GERAL									
. Equipamento				13			103	91	40	51	44	
. Salário				72			51	45	0	45	-	
							52	46	40	6	87	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

(\*) Não houve previsão das metas físicas por exercício

TAXA CAMBIAL  
1US\$ =

ANO I - Cr\$ 69,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

### CUSTOS DO PROJETO

ESTADO ALAGOAS  
FOLHA Nº QD 4/1

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO			CUSTOS				TOTAL GERAL US\$(1000)
		Nº MUN.	UNID./ EQUIP.	PESSOAL H/A	PESSOAL		EQUIPAMENTO		
					UNITÁRIO US\$ ( )	SUBTOTAL US\$(1000)	UNITÁRIO US\$ ( )	SUBTOTAL US\$(1000)	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1980 ANO I	-	-	-	-	-	-	-	-
. Equipamento		-	-	-	-	-	-	-	-
. Salário		-	-	-	-	-	-	-	-
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1981 ANO II	-	-	-	-	-	-	-	-
. Equipamento		-	-	-	-	-	-	-	-
. Salário		-	-	-	-	-	-	-	-
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1982 ANO III					40			40
. Equipamento		0	0	0	0	0	0	0	
. Salário		13	0	72	555	40	-	-	
. Equipamento						40	-	-	40
. Salário						-	-	-	

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: BAHIA  
FOLHA Nº QE 4/2

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P. (%) <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P. (%) <sup>(1)</sup>	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1980 ANO I		(*)				36	78	47	31	60	
. Equipamento				25			26	57	25	32	44	
. Salário				27			10	21	22	1	105	
FXDPTALECIMENTO DOS OME'S	1981 ANO II		(*)				52	112	91	21	81	
. Equipamento				-			22	47	0	47	-	
. Salário				45			30	65	91	26	140	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1982 ANO III		(*)				52	112	109	3	97	
. Equipamento				36			22	47	14	33	30	
. Salário				72			30	65	95	30	146	
			TOTAL GERAL									
							140	302	247	55	82	
. Equipamento				36			70	151	39	112	26	
. Salário				117			70	151	208	57	138	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO  
(\*) Não houve previsão das metas físicas por exercício

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ { ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL / NE

**DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82**

**CUSTOS DO PROJETO**

ESTADO BAHIA

FOLHA Nº QD 4/2

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO			CUSTOS				TOTAL GERAL U\$(1000)
		Nº MUN.	UNID./ EQUIP.	PESSOAL H/A	PESSOAL		EQUIPAMENTO		
					UNITÁRIO U\$(1)	SUBTOTAL U\$(1000)	UNITÁRIO U\$(1)	SUBTOTAL U\$(1000)	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1980</u> ANO I					<u>22</u>		<u>25</u>	<u>47</u>
. Equipamento		36	26*	-	-	-	961	25	
. Salário		36	0	27	814	22	-	0	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1981</u> ANO II					<u>91</u>			<u>91</u>
. Equipamento		-	-	-	-	-	-	-	
. Salário		36	0	45	2.023	91	-	-	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1982</u> ANO III					<u>95</u>	<u>7</u>	<u>14</u>	<u>109</u>
. Equipamento		36	2**	-	-	-	-	14	
. Salário		36	0	117	812	95	-	0	
. Equipamento						<u>208</u>		<u>39</u>	<u>455</u>
. Salário						-		39	
						208		-	

OBS (\*) Material de consumo, incluindo aquisição de 1 veículo  
 (\*\*) Material de consumo, incluindo aquisição de 2 veículos

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: CEARÁ  
 FOLHA Nº QE 4/3

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1980 ANO I		(*)				16	100	40	60	40
. Equipamento				15			4	27	22	5	81
. Salário				45			12	73	18	55	3
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1981 ANO II		(*)				25	156	63	93	40
. Equipamento				26			5	29	13	16	45
. Salário				26			20	127	50	77	40
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1982 ANO III		(*)				21	125	338	213	270
. Equipamento				53			6	34	56	22	164
. Salário				318			15	91	282	191	309
				TOTAL GERAL							
. Equipamento				53			62	381	441	60	0,2
. Salário				389			15	90	91	1	101
							47	291	350	59	120

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO  
 (\*) Não houve previsão das metas físicas por exercício

TAXA CAMBIAL  
 1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 85,17
ANO II - Cr\$ 80,00
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

**DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82**

**CUSTOS DO PROJETO**

ESTADO

CEARÁ

FOLHA Nº

QD 4/3

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO			CUSTOS				TOTAL GERAL US\$ (1000)
		Nº MUN.	UNID./ EQUIP.	PESSOAL H/A	PESSOAL		EQUIPAMENTO		
					UNITÁRIO US\$ (   )	SUBTOTAL US\$(1000)	UNITÁRIO US\$ (   )	SUBTOTAL US\$(1000)	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1980</u> ANO I					<u>18</u>		<u>22</u>	<u>40</u>
. Equipamento		53	15	-	-	-	1.5	22	
. Salário		13	0	45	127	18	-	0	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1981</u> ANO II					<u>50</u>		<u>13</u>	<u>63</u>
. Equipamento		53	26	-	-	-	500	13	
. Salário		27	0	26	1.926	50	-	0	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1982</u> ANO III					<u>282</u>		<u>56</u>	<u>338</u>
. Equipamento		53	53	-	-	-	1.1	56	
. Salário		43	0	318	886	282	-	0	
. Equipamento						<u>350</u>	-	<u>91</u>	<u>441</u>
. Salário						-	-	91	
						350	-	-	

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % <sup>(1)</sup>
FORTEALECIMENTO DOS OME'S	1980 ANO I		(*)				12	58	33	25	57
. Equipamento				7			2	10	9	1	90
. Salário				34			10	48	24	24	24
FORTEALECIMENTO DOS OME'S	1981 ANO II		(*)				27	131	22	109	17
. Equipamento				16			3	15	16	1	106
. Salário				34			24	116	6	110	5
FORTEALECIMENTO DOS OME'S	1982 ANO III		(*)				36	173	79	94	45
. Equipamento				23			3	14	14	0	100
. Salário				47			33	159	65	94	41
				TOTAL GERAL							
							75	362	134	228	37
. Equipamento				23			8	39	39	0	100
. Salário				88			67	323	95	228	29

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO

(\*) Não houve previsão das metas físicas por exercício

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 65,17  
 ANO II - Cr\$ 80,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

### CUSTOS DO PROJETO

ESTADO MARANHÃO  
FOLHA N° QD 4/4

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO			CUSTOS				TOTAL GERAL US\$(1000)
		N° MUN.	UNID. / EQUIP.	PESSOAL H/A	PESSOAL		EQUIPAMENTO		
					UNITÁRIO US\$(1)	SUBTOTAL US\$(1000)	UNITÁRIO US\$(1)	SUBTOTAL US\$(1000)	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1980</u> ANO I					<u>24</u>		<u>9</u>	<u>33</u>
. Equipamento		22	7	-	-	-	1.2	9	
. Salário		7	0	34	705	24	-	0	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1981</u> ANO II					<u>6</u>		<u>16</u>	<u>22</u>
. Equipamento		22	16	-	-	-	1	16	
. Salário		16	0	34	176	6	-	0	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1982</u> ANO III					<u>65</u>		<u>14</u>	<u>79</u>
. Equipamento		23	23	-	-	-	609	14	
. Salário		23	0	47	1.382	65	-	0	
						<u>95</u>		<u>39</u>	<u>134</u>
. Equipamento						-		39	
. Salário						95		-	

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1980 ANO I		(*)				11	15	0	15	
Equipamento				-			-	-	-	-	
Salário				-			11	15	0	15	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1981 ANO II		(*)				60	82	48	34	58
Equipamento				31			33	45	29	16	65
Salário				24			27	37	19	18	51
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1982 ANO II		(*)				27	37	37	0	100
Equipamento				-			-	-	-	-	-
Salário				31			27	37	37	0	100
			TOTAL GERAL								
Equipamento				31			98	134	85	49	63
Salário				55			33	45	29	16	64
							65	89	56	33	62

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO  
(\*): Não houve previsão das metas físicas por exercício

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ { ANO I - Cr\$ 85,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

### CUSTOS DO PROJETO

ESTADO PARAÍBA  
FOLHA Nº QD 4/5

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO			CUSTOS				TOTAL GERAL U\$(1000)
		Nº MUN.	UNID./ EQUIP.	PESSOAL H/A	PESSOAL		EQUIPAMENTO		
					UNITÁRIO U\$(1)	SUBTOTAL U\$(1000)	UNITÁRIO U\$(1)	SUBTOTAL U\$(1000)	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1980</u> ANO I								
. Equipamento		-	-	-	-	-	-	-	-
. Salário		-	-	-	-	-	-	-	-
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1981</u> ANO II					<u>19</u>		<u>29</u>	<u>48</u>
. Equipamento		31	31	-	-	-	936	29	
. Salário		24	0	72	264	19	-	0	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1982</u> ANO III					<u>37</u>			<u>37</u>
. Equipamento		31	0	-	-	-	-	-	
. Salário		31	0	93	398	37	-	0	
						<u>56</u>		<u>29</u>	<u>85</u>
. Equipamento						-		29	
. Salário						56		-	

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA - 80/82

ESTADO PERNAMBUCO  
FOLHA Nº QE 4/6

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1980 ANO I		(*)				27	51	37	14	72	
. Equipamento				-				-	-	-	-	
. Salário				58			27	51	37	14	72	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1981 ANO II		(*)				27	51	45	6	88	
. Equipamento				-				-	-	-	-	
. Salário				58			27	51	45	6	88	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1982 ANO III		(*)				27	51	51	0	100	
. Equipamento				-				-	-	-	-	
. Salário				58			27	51	51	0	100	
			TOTAL GERAL									
. Equipamento				-			80	153	133	20	87	
. Salário				174			80	153	133	20	87	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO  
(\*) Não houve previsão das metas físicas por exercício

TAXA CAMBIAL  
US\$: ANO I - Cr\$ 65.17  
ANO II - Cr\$ 80.00  
ANO III - Cr\$ 160.00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO  
PERNAMBUCO  
FOLHA Nº QD 4/6

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO			CUSTOS				TOTAL GERAL US\$(1000)
		Nº MUN.	UNID./ EQUIP.	PESSOAL H/A	PESSOAL		EQUIPAMENTO		
					UNITÁRIO US\$(1)	SUBTOTAL US\$(1000)	UNITÁRIO US\$(1)	SUBTOTAL US\$(1000)	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1980 ANO I					37			37
. Equipamento		29	0	-	-	-	-	-	
. Salário		29	0	58	637	37	-	0	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1981 ANO II					45			45
. Equipamento		29	0	-	-	-	-	-	
. Salário		29	0	58	775	45	-	0	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1982 ANO III					51		-	51
. Equipamento		29	0	-	-	-	-	-	
. Salário		29	0	58	879	51	-	0	
						133		-	133
. Equipamento						-		-	
. Salário						133		0	

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: PIAUÍ  
FOLHA Nº QE 4/7

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % <sup>(1)</sup>	
PORTAIECIMENTO DOS OME'S	1980 ANO I		(*)				12	73	9	64	12	
. Equipamento				-			2	14	-	14	15	
. Salário				42			10	59	9	50		
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1981 ANO II						39	232	90	142	39	
. Equipamento				35			17	103	50	53	48	
. Salário				50			22	129	40	89	31	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	1982 ANO III		(*)				24	139	79	60	57	
. Equipamento				35			2	10	10	0	100	
. Salário				98			22	129	69	60	55	
			TOTAL GERAL									
. Equipamento				35			75	444	178	266	40	
. Salário				190			21	127	69	67	54	
							54	317	157	199	49	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

(\*) Não houve previsão das metas físicas por exercício

TAXA CAMBIAL  
1US\$:

ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

### CUSTOS DO PROJETO

ESTADO PIAUÍ  
FOLHA Nº QD 4/7

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO			CUSTOS				TOTAL GERAL US\$ (1000)
		Nº MUN.	UNID./ EQUIP.	PESSOAL N/A	PESSOAL		EQUIPAMENTO		
					UNITÁRIO US\$ (1000)	SUBTOTAL US\$ (1000)	UNITÁRIO US\$ (1000)	SUBTOTAL US\$ (1000)	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1980</u> ANO I					<u>9</u>			<u>9</u>
. Equipamento		35	0	-	-	-	-	-	
. Salário		21	0	42	214	9	-	0	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1981</u> ANO II					<u>40</u>		<u>50</u>	<u>90</u>
. Equipamento		35	35	-	-	-	1.4	50	
. Salário		25	0	50	799	40	-	0	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1982</u> ANO III					<u>69</u>		<u>10</u>	<u>79</u>
. Equipamento		35	35	-	-	-	286	10	
. Salário		30	0	98	704	69	-	0	
. Equipamento						<u>118</u>		<u>60</u>	<u>178</u>
. Salário						-		60	
						118		-	

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: R.G. NORTE  
FOLHA Nº QE 4/8

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>
FORTALECIMENTO DOS OME'S · Equipamento · Salário	1980 ANO I		(*)	-	-		8	10	0	10	-
								-	-	-	-
FORTALECIMENTO DOS OME'S · Equipamento · Salário	1981 ANO II		(*)	14	-		68	81	33	48	40
								51	33	18	64
FORTALECIMENTO DOS OME'S · Equipamento · Salário	1982 ANO III		(*)	14	-		25	30	30	0	100
								0	30	30	30
TOTAL GERAL											
· Equipamento · Salário				14	-		101	121	63	58	52
								51	63	12	53
				-			58	70	70		

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

(\*) Não houve previsão das metas físicas por exercício

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 65,17
ANO II - Cr\$ 80,00
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

### CUSTOS DO PROJETO

ESTADO  
RIO GRANDE DO NORTE  
FOLHA Nº QD 4/8

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO			CUSTOS				TOTAL GERAL U\$(1000)
		Nº MUN.	UNID./ EQUIP.	PESSOAL M/A	PESSOAL		EQUIPAMENTO		
					UNITÁRIO U\$(1)	SUBTOTAL U\$(1000)	UNITÁRIO U\$(1)	SUBTOTAL U\$(1000)	
FORTALECIMENTO DOS OME'S . Equipamento . Salário	1980 ANO I	-	-	-	-	-	-	-	-
FORTALECIMENTO DOS OME'S . Equipamento . Salário	1981 ANO II	14	14	-	-	-	2.3	33	33
FORTALECIMENTO DOS OME'S . Equipamento . Salário	1982 ANO III	14	14	-	-	-	2.1	30	30
. Equipamento . Salário		-	-	-	-	-	-	66	66

OBS

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: SERGIPE  
 FOLHA Nº QE 4/9

PROJETOS  METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA, R/P - %	(1) %		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	(1) R/P - %	
FORTALECIMENTO DOS OME'S  . Equipamento . Salário												
FORTALECIMENTO DOS OME'S  . Equipamento . Salário												
FORTALECIMENTO DOS OME'S  . Equipamento . Salário			<del>NÃO TEM OME'S</del>									
			TOTAL GERAL									
. Equipamento  . Salário												

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
 1 US\$ =

- ANO I - Cr\$ 65,17
- ANO II - Cr\$ 80,00
- ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL / NE

**DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82**

**CUSTOS DO PROJETO**

ESTADO SERGIPE  
 FOLHA Nº QD 4/9

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO			CUSTOS				TOTAL GERAL U\$(1000)
		Nº MUN.	UNID./ EQUIP.	PESSOAL H/A	PESSOAL		EQUIPAMENTO		
					UNITÁRIO U\$(1)	SUBTOTAL U\$(1000)	UNITÁRIO U\$(1)	SUBTOTAL U\$(1000)	
FORTALECIMENTO DOS OME'S . Equipamento . Salário	1980 ANO I								
FORTALECIMENTO DOS OME'S . Equipamento . Salário	1981 ANO II								
FORTALECIMENTO DOS OME'S . Equipamento . Salário	1982 ANO III								

NÃO TEM OME'S

OBS

DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS


METAS	REALIZADO		PREVISTO				REALIZADO	
	80/82	%	83	%	84	%	TOTAL	%
Equipamento	234	100	-	-	-	-	234	100
Salário	1.085	53	582	29	369	18	2.036	100

DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS


METAS	REALIZADO		PREVISTO				SALDO	%	TOTAL GERAL	%
	80/82	%	83	%	84	%				
Equipamento	330	66	80	16	-	-	93	18	503	100
Salário	1.039	54	487.5	25	188.5	10	218	11	1.933	100

# PROJETO DE FORTALECIMENTO DE OMES

## PROGRAMAÇÃO FÍSICA

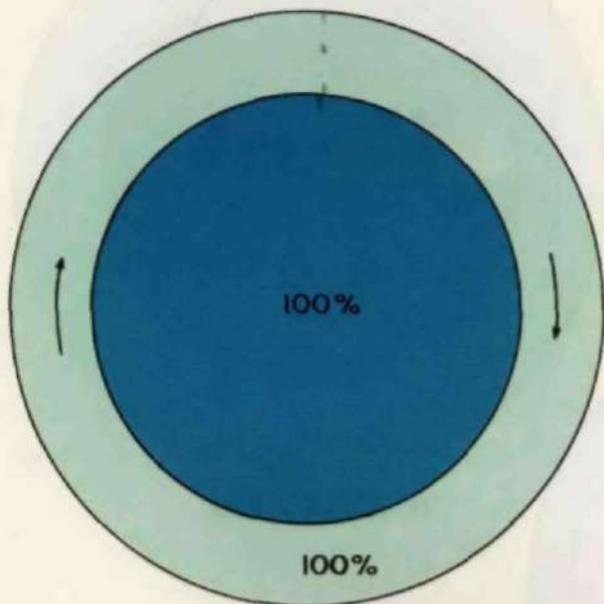

**EQUIPAMENTO**

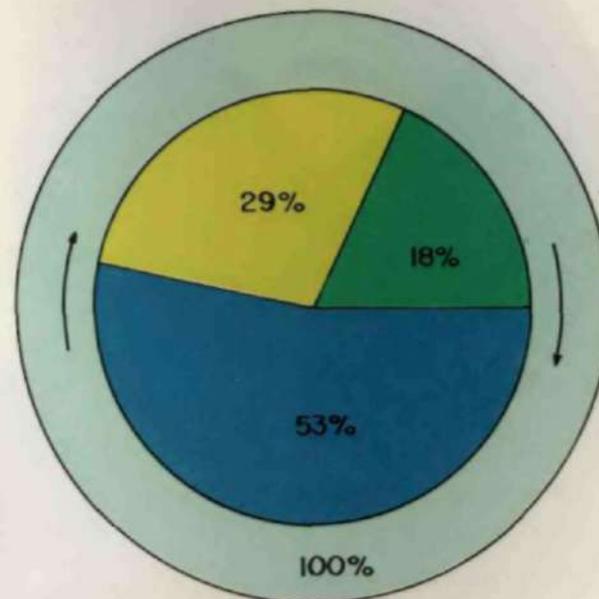


**SALÁRIO**

### LEGENDA


- PROGRAMAÇÃO GERAL - 80/82
- REALIZADO - 80/82
- PROGRAMADO - 83
- PROGRAMADO - 84

# PROJETO DE FORTALECIMENTO DE OMES


## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

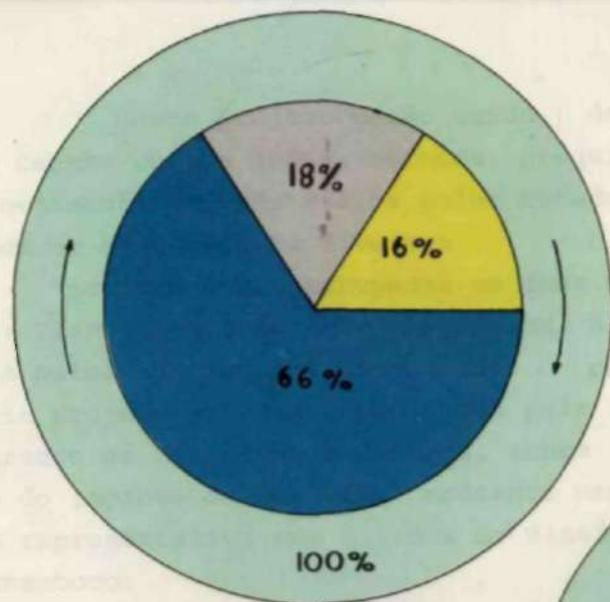

**EQUIPAMENTO**

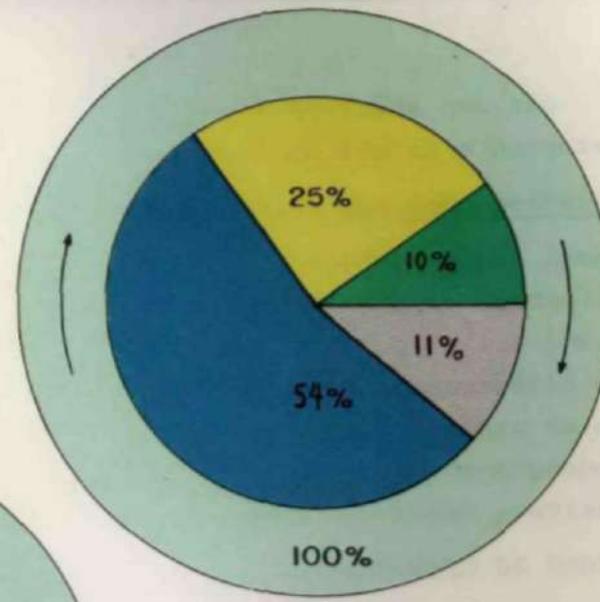

**SALÁRIO**

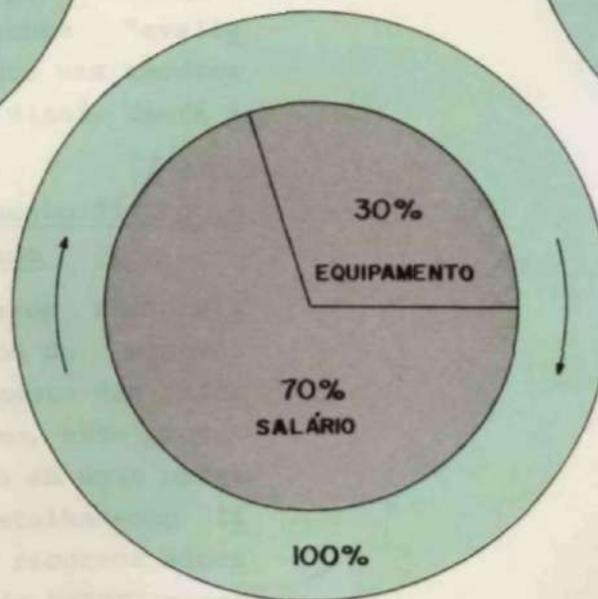

- LEGENDA**
- PROGRAMAÇÃO GERAL-80/82
  - REALIZADO-80/82
  - PROGRAMADO-83
  - PROGRAMADO-84
  - SALDO

Neste projeto estão sendo desenvolvidas dentre outras ações, estudos, pesquisas e planejamento de rede física, pelos Estados envolvidos no Programa. As diversas ações do projeto foram agrupadas em duas metas que são: Planejamento de Rede e Pesquisa. Além das duas metas mencionadas estão sendo realizadas neste projeto estudos específicos pela Fundação Cearense de Pesquisas e Cultura, sobre "avaliação do impacto do programa" mediante uma amostragem representativa nos Estados do Piauí, Ceará e Pernambuco.

a) - Execução e Detalhamento Físico e Financeiro por Estado

Objetivando maior racionalização e uniformidade de procedimentos no processamento das informações que se seguem, este projeto foi desenvolvido em duas metas, tendo por base o detalhamento físico e o volume de recursos alocados para as ações de maior repre-

sentatividade que são: Planejamento de Rede Física e Pesquisa.

b) - Análise dos Componentes Físicos

Considerando os demonstrativos apresentados na Execução e Detalhamento, ver QE 5/1 a 5/9 e QD 5/1 a 5/9, faz-se necessário maiores esclarecimentos, para um melhor entendimento do desempenho efetuado, segundo as metas previstas.

i - PLANEJAMENTO DE REDE FÍSICA

Esta meta teve uma realização de 96% no período 1980/82 ficando apenas 4% para o ano seguinte, podemos constatar que grande parte das ações previstas já foram atingidas nos anos 1980/82, prevendo-se o término da execução para o ano de 1983.

ii - PESQUISA

A meta Pesquisa teve uma realização de 58% e ficando 42% para concluir a meta em 1983.

Se comparada a execução física com a financeira, vê-se que grande parte dos recursos foram concentrados na meta Pesquisa, isto pela natureza do trabalho que vem sendo desenvolvido, elaboração de documentos e outras despesas que garantam o suporte técnico para o projeto.

c) - Análise dos Componentes Financeiros

Quanto aos componentes financeiros do Projeto vale dizer que a linha de procedimentos adotada foi a mesma para os componentes físicos. Deve-se no entanto

ressaltar que na 1ª meta houve um saldo de U\$ 496 mil e na 2ª meta de U\$ 781,5 mil devendo os respectivos valores serem reaplicados.

d) - Conclusão

Em síntese, conclue-se que este projeto teve um desempenho considerado satisfatório tanto em seus aspectos físicos como financeiros uma vez que no ano de 1983 todas as ações deverão estar cumpridas.

OBSERVAÇÃO: A avaliação do Impacto do Programa, no período 81/82 obteve os melhores resultados.

O projeto de administração financiou, nesta etapa, as atividades previstas, em virtude de não estarem bem especificados os recursos financeiros para suas atividades.

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: ALAGOAS  
FOLHA Nº  
QE 5/1

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1980 ANO I						58	11	5	6	45
. Planejamento Rede Física		70	9	13	4	144	58	11	5	6	45
. Pesquisa		-	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1981 ANO II						10	2	1	1	50
. Planejamento Rede Física		10	1	0	1	0	10	2	1	1	50
. Pesquisa		-	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1982 ANO III						10	2	2	0	100
. Planejamento Rede Física		10	2	0	2	0	10	2	2	0	100
. Pesquisa		-	1	0	1	0	0	0	0	0	0
			TOTAL GERAL								
. Planejamento Rede Física	1980						78	15	8	7	53
. Pesquisa	1982						0	0	0	0	0
		90	12	13	1	144	78	15	8	7	53
		-	3	0	3	0	0	0	0	0	0

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO  
(\* ) Nº de Municípios

TAXA CAMBIAL { ANO I - Cr\$ 65.17  
ANO II - Cr\$ 80.00  
ANO III - Cr\$ 180.00  
1 US\$

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO ALAGOAS

FOLHA Nº  
 QD 5/1

PROJETO	METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS		TOTAL US\$ (1000)
			MUN./NºS	PESQ./MUN.	PLAN.REDE US\$(I)	PESQUISA US\$(I)	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO		<u>1980</u> ANO I					
	. Planejamento Rede Física		13	0	384	0	5
	. Pesquisa		0	0	0	0	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO		<u>1981</u> ANO II					
	. Planejamento Rede Física		0	0		0	1
	. Pesquisa		0	0	0	0	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO		<u>1982</u> ANO III					
	. Planejamento Rede Física		0	0		0	2
	. Pesquisa		0	0	0	0	
					<u>384</u>		<u>7</u>
	. Planejamento Rede Física				384	0	
	. Pesquisa				0	0	

OBS



MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

# DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

## CUSTOS DO PROJETO

ESTADO BAHIA

FOLHA Nº  
QD 5/2

PROJETO	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS		TOTAL U\$(1000)
		MUN./NºS	PESQ./MUN.	PLAN REDE U\$(1)	PESQUISA U\$(1)	
METAS						

NÃO HÁ PROJETO DE  
ESTUDOS E AVALIAÇÃO

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA - 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % <sup>(1)</sup>	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	<u>1980</u> ANO I						<u>17</u>	<u>22</u>	<u>9</u>	<u>13</u>	<u>41</u>	
. Planejamento Rede Física		60	32	15	17	47	8	10	9	1	90	
. Pesquisa		-	-	-	-	-	9	12	0	12	-	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	<u>1981</u> ANO II						<u>17</u>	<u>21</u>	<u>43</u>	<u>22</u>	<u>204</u>	
. Planejamento Rede Física		10	5	26	21	520	2	2	43	41	2,2	
. Pesquisa		-	-	-	-	-	15	19	0	19	-	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	<u>1982</u> ANO III						<u>17</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	
. Planejamento Rede Física		10	5	27	22	540	2	2	10	8	500	
. Pesquisa		-	-	1	1	-	15	19	11	8	58	
			TOTAL GERAL									
. Planejamento Rede Física	1980	80	42	68	26	162	<u>51</u> 11	<u>64</u> 14	<u>73</u> 62	<u>9</u> 48	<u>114</u> 442	
. Pesquisa	1982	-	0	1	1		40	50	11	39	22	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO  
(\* ) Nº de Municípios

TAXA CAMBIAL { ANO I - C. \$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$160,00  
10\$=

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO CEARÁ  
 FOLHA Nº  
 QD 5/3

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS		TOTAL U\$(1000)
		MUN./NºS	PESQ./MUN.	PLAN.REDE U\$(I)	PESQUISA U\$(I)	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1980 ANO I	15	0	600	0	9
		0	0	0	0	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Fisica . Pesquisa	1981 ANO II	26	0	1.653	0	43
		0	0	0	0	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Fisica . Pesquisa	1982 ANO III	27	0	370	0	10
		0	1	0	11.000	11
. Planejamento Rede Fisica . Pesquisa				<u>2.623</u>	<u>11.000</u>	<u>73</u>
				2.623 0	0 11.000	<u>62</u> <u>11</u>

085

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	<u>1980</u> ANO I						<u>55</u>	<u>10</u>	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>60</u>	
. Planejamento Rede Física*		70	15	7	8	46	33	6	6	0	100	
. Pesquisa		-	-	-	-	-	22	4	0	4	-	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	<u>1981</u> ANO II						<u>11</u>	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>400</u>	
. Planejamento Rede Física*		10	3	9	6	300	11	2	8	6	400	
. Pesquisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	<u>1982</u> ANO III						<u>11</u>	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>300</u>	
. Planejamento Rede Física*		10	2	7	5	350	11	2	6	4	300	
. Pesquisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
. Planejamento Rede Física	1980						<u>77</u>	<u>14</u>	<u>20</u>	<u>6</u>	<u>143</u>	
. Pesquisa	1982						55	10	20	-	200	
		90	20	23	3	115		4	-	6	-	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(II)- REALIZADO X PREVISTO  
(\* ) Nº de Municípios

TAXA CAMBIAL  
TU\$=

ANO I - Cr\$ 85,17
ANO II - Cr\$ 80,00
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-3R  
 EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO  
 MARANHÃO  
 FOLHA Nº  
 QD 5/4

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS		TOTAL U\$(1000)
		MUN./NºS	PESQ./MUN.	PLAN.REDE U\$(1)	PESQUISA U\$(1)	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Fisica . Pesquisa	1980 ANO I	7 0	0 0	857 0	0 0	6
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Fisica . Pesquisa	1981 ANO II	9 0	0 0	888 0	0 0	8
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Fisica . Pesquisa	1982 ANO III	7 0	0 0	857 0	0 0	6
. Planejamento Rede Física . Pesquisa				<u>2.664</u> 2.664 0	0 0	<u>20</u>

085

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO:  
**PARAIBA**  
FOLHA Nº  
QE 5/5

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % <sup>(1)</sup>
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1980 ANO I						55	10	0	10	0
. Planejamento Rede Física		70	22	0	22	0	55	10	-	-	0
. Pesquisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1981 ANO II						11	2	2	0	100
. Planejamento Rede Física		10	3	31	28	1.033	11	2	2	0	100
. Pesquisa.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1982 ANO III						11	2	2	0	100
. Planejamento Rede Física		10	3	31	28	1.033	11	2	2	0	100
. Pesquisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL											
. Planejamento Rede Física	1980						77	14	4	10	28
		90	28	62	34	221	77	14	4	10	28
. Pesquisa	1982		-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO  
(\* ) Nº de Municípios

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO  
PARAIBA  
FOLHA Nº  
QD 5/5

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS		TOTAL U\$(1000)
		MUN./NºS	PESQ./MUN.	PLAN. REDE U\$(I)	PESQUISA U\$(II)	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO  . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1980 ANO I	0 0	0 0	0 0	0 0	0
ESTUDOS E AVALIAÇÃO  . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1981 ANO II	31 0	0 0	64 0	0 0	2
ESTUDOS E AVALIAÇÃO  . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1982 ANO III	31 0	0 0	64 0	0 0	2
. Planejamento Rede Física . Pesquisa				<u>128</u> 128 0	0 0	<u>4</u>

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA-80/82

ESTADO  
PERNAMBUCO  
FOLHA Nº  
QE 5/6

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - (%) <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - (%) <sup>(1)</sup>
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1980 ANO I						4	15	14	1	93
. Planejamento Rede Física*		70	15	5	10	33	4	15	14	1	93
. Pesquisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1981 ANO II						47	155	128	27	82
. Planejamento Rede Física*		10	2	10	8	500	0,6	2	20	13	1.000
. Pesquisa		-	-	3	-	-	46,4	153	108	40	71
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1982 ANO III						47	154	154	0	100
. Planejamento Rede Física*		10	2	21	19	1.050	0,6	2	35	33	1.750
. Pesquisa		-	-	3	-	-	46,4	152	119	33	78
			TOTAL GERAL								
. Planejamento Rede Física	1980						98	324	296	28	91
. Pesquisa	1982						6	19	64	45	337
		90	19	36	17	189	6	19	64	45	337
		-	0	6	-	-	92	305	232	73	76

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO  
(\* ) Nº de Municípios

TAXA CAMBIAL  
10\$\*

ANO I - C. \$ 68,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO  
PERNAMBUCO  
FOLHA Nº  
QD 5/6

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS		TOTAL U\$(1000)
		MUN./NºS	PESQ./MUN.	PLAN.REDE U\$(1)	PESQUISA U\$(1)	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1980 ANO I	5	0	2.800	0	14
		0	0	0	0	0
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1981 ANO II	10	0	2.000	0	20
		0	0	0	36.000	108
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1982 ANO III	21	0	1.666	0	35
		0	3	0	39.666	119
. Planejamento Rede Física . Pesquisa				6.466	75.666	365
				6.466 0	0 75.666	69 296

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: PIAUÍ  
FOLHA Nº  
QE 5/7

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % <sup>(1)</sup>	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1980 ANO I						100	41	27	17	66	
. Planejamento Rede Física		60	21	35	14	166	59	24	27	0	100	
. Pesquisa		-	-	-	-	-	41	17	0	17	0	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1981 ANO II						0	0	35	35	0	
. Planejamento Rede Física		10	4	10	6	250	0	0	35	35	0	
. Pesquisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1982 ANO III						-	-	-	-	-	
. Planejamento Rede Física		10	4	0	4	0	-	-	-	-	-	
. Pesquisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTAL GERAL									
. Planejamento Rede Física	1980						100	41	59	18	144	
. Pesquisa	1982							24	24	35	0	
		80	29	45	24	129	59					
		-	-	-	-	-	41	17	35	17	50	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WPI- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1) - REALIZADO X PREVISTO  
(\* ) Nº de Municípios

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 85,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1667-BR  
 EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO PIAUÍ  
 FOLHA Nº  
 QD 5/7

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS		TOTAL US\$(1000)
		MUN./NºS	PESQ./MUN.	PLAN. REDE US\$(I)	PESQUISA US\$(II)	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1980 ANO I	35 0	0 0	771 0	0 0	27
	1981 ANO II	10 0	0 0	350 0	0 0	35
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1982 ANO III	0 0	0 0	0 0	0 0	
				<u>1.121</u> 1.121 0	0 0	<u>62</u>

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA-80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	(I) R/P - %		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	(II) R/P - %	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	<u>1980</u> ANO I						<u>25</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	
. Planejamento Rede Física		25	4	0	4	0	25	4	0	4	0	
. Pesquisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	<u>1981</u> ANO II						<u>25</u>	<u>4</u>	<u>2.5</u>	<u>1.5</u>	<u>63</u>	
. Planejamento Rede Física*		25	4	4	0	100	25	4	2.5	1.5	1	
. Pesquisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	<u>1982</u> ANO III						<u>25</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	
. Planejamento Rede Física*		25	4	0	4	0	25	4	0	4	0	
. Pesquisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
. Planejamento Rede Física	1980	75	12	4	8	34	<u>75</u>	<u>12</u>	<u>2.5</u>	<u>9.5</u>	<u>21</u>	
. Pesquisa	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)-PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (II)-REALIZADO X PREVISTO

(\*) Nº de Municípios

TAXA CAMBIAL  
 1US=

ANO I - Cr\$ 85,17  
 ANO II - Cr\$ 80,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO  
 RIO GRANDE DO NORTE  
 FOLHA Nº  
 00 5/8

PROJETO  METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS		TOTAL U\$(1000)
		MUN./NºS	PESQ./MUN.	PLAN.REDE U\$(I)	PESQUISA U\$(I)	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO  . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1980 ANO I	0 0	0 0	0 0	0 0	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO  . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1981 ANO II	4 0	0 0	625 0	0 0	25
ESTUDOS E AVALIAÇÃO  . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1982 ANO III	0 0	0 0	0 0	0 0	
. Planejamento Rede Física . Pesquisa				625 625 0	0 0	25

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO. SERGIPE  
FOLHA Nº  
QE 5/9

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1980 ANO I						27	6	0	6	
		25	4	0	4	0	27	6	0	6	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1981 ANO II						18	4	2	2	50
		25	4	15	11	375	18	4	2	2	50
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Física . Pesquisa	1982 ANO III						18	4	4	0	100
		25	4	15	11	375	18	4	4	0	100
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>											
. Planejamento Rede Física . Pesquisa	1980						63	14	6	8	43
		75	12	30	18	375	63	14	6	8	43
	1982						-	-	-	-	-

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO  
(\* ) Nº de Municípios

TAXA CAMBIAL  
1 US\$

ANO I - C: \$ 65.17  
ANO II - C: \$ 80.00  
ANO III - C: \$ 160.00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO  
 SERGIPE  
 FOLHA Nº  
 QD 5/9

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS		TOTAL U\$(1000)
		MUN./NºS	PESQ./MUN.	PLAN.REDE U\$(I)	PESQUISA U\$(I)	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Fisica . Pesquisa	1980 ANO I					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Fisica . Pesquisa	1981 ANO II					
		15	0	133	0	2
		0	0	0	0	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO . Planejamento Rede Fisica . Pesquisa	1982 ANO III					
		15	0	267	0	4
		0	0	0	0	
. Planejamento Rede Física . Pesquisa				400		6
				400	0	
				0	0	


OBS

DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS



METAS	REALIZADO		PREVISTO				REALIZADO	
	80/82	%	83	%	84	%	TOTAL	%
Planejamento Rede Física	281	96	12	4	-	-	293	100
Pesquisa	7	58	5	42	-	-	12	100

DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS

METAS	REALIZADO		PREVISTO				SALDO	%	TOTAL GERAL	%
	80/82	%	83	%	84	%				
Planejamento Rede Física	190.5	28	7.5	1	-	-	496	71	694	100
Pesquisa	278.	26	20.5	2	-	-	781.5	72	1.080	100

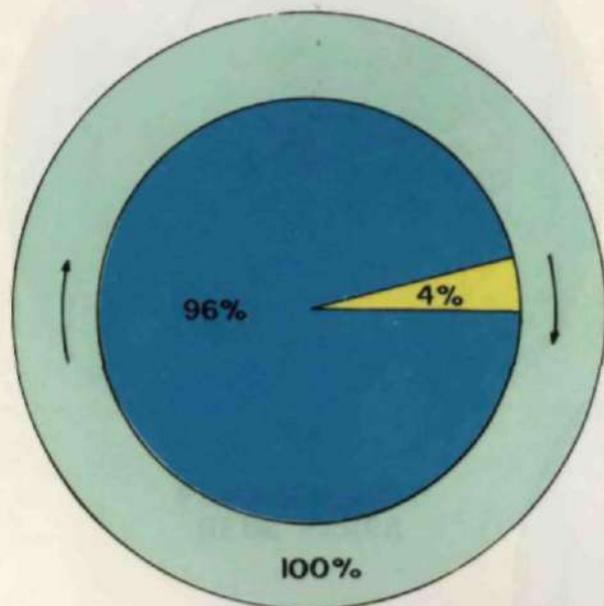


PLANEJAMENTO- REDE FÍSICA

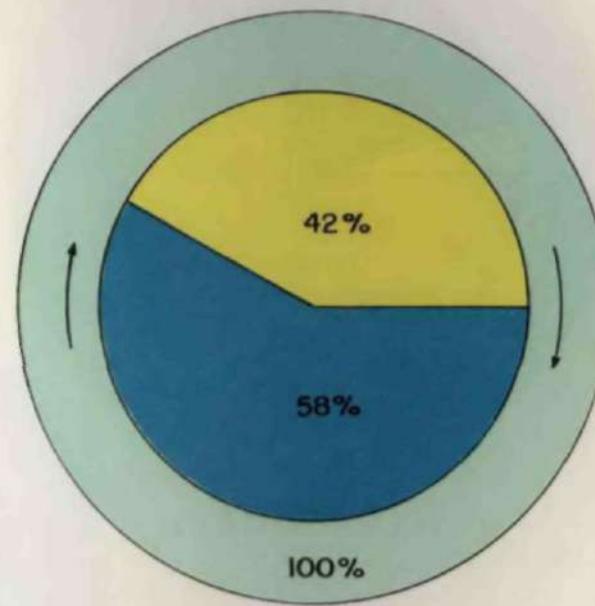


PESQUISA


# PROJETO DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

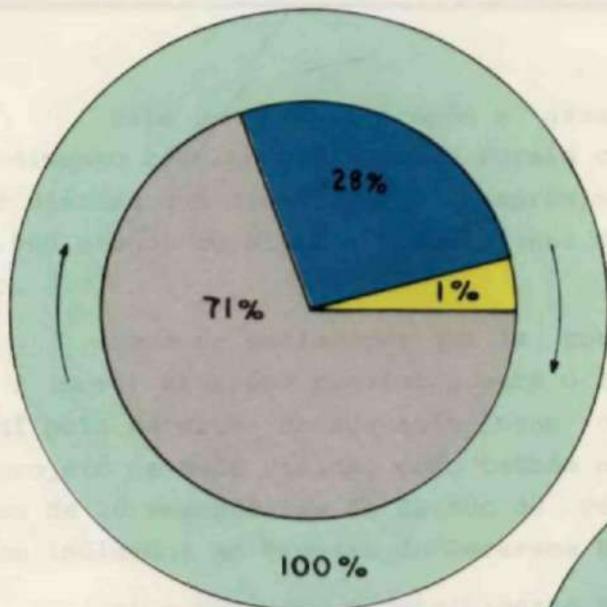

**PLANEJAMENTO  
REDE FÍSICA**

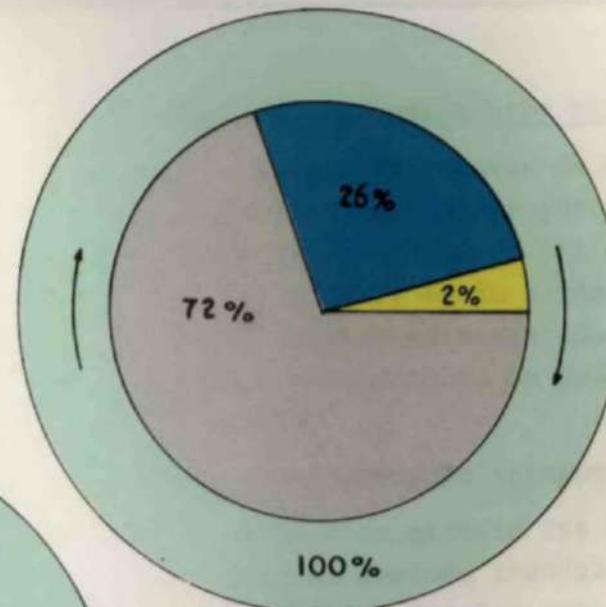

**PESQUISA**

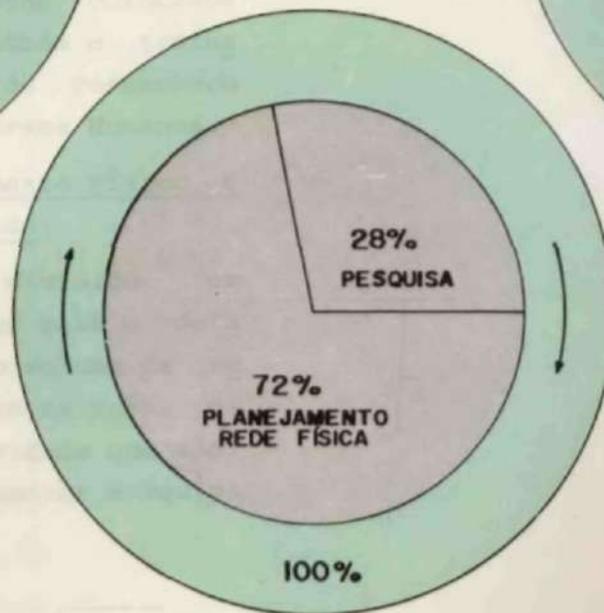

**LEGENDA**

- PROGRAMAÇÃO GERAL - 80/85
- REALIZADO - 80/82
- PROGRAMADO - 83
- SALDO

Este projeto se propõe a assegurar o atendimento regular das escolas rurais com refeições diárias que beneficiarão aproximadamente 150.000 alunos do Piauí e 5.000 alunos de Pernambuco.

Deve-se esclarecer que as construções dos 9 (nove) armazéns previstos para o Estado de Piauí pela natureza de sua ação foram colocados no projeto de Rede Física, como também o treinamento de 20 merendeiras do Estado de Pernambuco foram incluídos no Projeto de Recursos Humanos.

a) - Execução e Detalhamento Físico e Financeiro por Estado:

O Projeto foi dividido em duas metas tendo por base o detalhamento físico e o volume de recursos alocados para as ações de maior representatividade que são: Complementação Alimentar e Equipamento.

b) Análise dos Componentes Físicos

Os demonstrativos da Execução e do Detalhamento do Projeto de Alimentação Escolar (ver QE 6/1 a 6/2 e QD 6/1 a 6/2), estão sendo submetidos a análise mais acuradas para um melhor entendimento do desempenho e efetuado.

i - COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

Esta meta atingiu 25% de seu total no período 1980/82 ou seja 900.000 refeições estando previsto para o exercício de 1983 - 25% e para 1984 será fechada com a distribuição de 1.800.000 refeições ou seja os 50% restantes. Financeiramente foi aplicado para o mesmo período 25% de seu total ou seja U\$ 296 mil ficando para os anos 1983/84 - 75%.

ii - EQUIPAMENTO

A meta equipamento apresentou o seguinte comportamento no período 1980/82, das 7 viaturas previstas para este exercício, 6 já foram adquiridas ou seja 86% da meta, restando para o ano de 1983, 1 ou 14%.

Finalmente foi aplicado para o mesmo período 19% estando previsto para o ano de 1983 - 4%. Vale ressaltar que o saldo de 77% ou seja U\$ 283 mil serão reaplicados.

c) - Análise dos Componentes Financeiros

Quanto aos componentes financeiros do Projeto vale ressaltar que a linha de procedimentos seguida foi a mesma para os componentes físicos.

d) - Conclusão

Em síntese, conclui-se que com relação ao nível de desempenho do Projeto Alimentação Escolar ficou evidenciado que os aspectos físicos e financeiros encontram-se em níveis que podem ser considerados positivos.

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . Complementação Alimentar (*) . Equipamento	1980 ANO I	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . Complementação Alimentar (*) . Equipamento	1981 ANO II	25	5.000	0	5.000	0	25,2 0,2	301 299 2	0 0 0	301 299 2	0 0 0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . Complementação Alimentar (*) . Equipamento	1982 ANO III	25	5.000 -	5.000 -	0 -	100 -	25 25	296 296 -	296 296 -	0 0 -	100 100 -
			TOTAL GERAL								
. Complementação Alimentar (*) . Equipamento	1980 / 1982	50	10.000 -	5.000 -	5.000 -	50 -	50,2 0,2	597 595 2	296 296 0	301 299 2	50 50 0

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (FJA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

(\*) Estudos alternativos para aquisição de alimentos para atendimento a 5.000 alunos

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 85,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURJRAL/NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

### CUSTOS DO PROJETO

ESTADO  
P.LAUI  
FOLHA Nº  
QD 6/1

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO			CUSTOS		TOTAL US\$(1000)
		ESCOLAS	ALUNOS ATENDIDOS	REFEICOES (EM MIL)	COMPL. ALIMENTAR P/REFEICAO US\$(I)	EQUIPAMENTO UNITARIO US\$(I)	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<u>1980</u> ANO I						
. Complementação Alimentar		-	-	-	-	-	-
. Equipamento		-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<u>1981</u> ANO II						
. Complementação Alimentar		-	-	-	-	-	-
. Equipamento		-	-	-	-	8	<u>8</u>
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<u>1982</u> ANO III						
. Complementação Alimentar		-	-	-	-	-	-
. Equipamento		-	-	-	-	12.600	<u>63</u>

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: PIAUI  
FOLHA Nº QE 6/2

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % <sup>(1)</sup>	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR · Complementação Alimentar · Equipamento	1980 ANO I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR · Complementação Alimentar · Equipamento	1981 ANO II	100	7(*)	1	6	14	34	91	8	83	8,7	8,7
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR · Complementação Alimentar · Equipamento	1982 ANO III	0	0	5(*)	5	66	46	122	63	59	51,6	51,6
			TOTAL GERAL									
· Complementação Alimentar · Equipamento	1980 / 1982	- 100	- 7	- 6	- 1	- 85	80 80	219 213	71 71	142 142	33 33	33 33

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO  
(\*) Aquisição de veículos

TAXA CAMBIAL { ANO I - Cr\$ 85,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00  
1 US\$:

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

ESTADO PERNAMBUCO  
FOLHA Nº QD 6/2

### CUSTOS DO PROJETO

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO			CUSTOS		TOTAL US\$(1000)
		ESCOLAS	ALUNOS ATENDIDOS	REFEICOES (EM MIL)	COMPL ALIMENTAR P/REFEICAO US\$(I)	EQUIPAMENTO UNITARIO US\$(II)	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR · Complementação Alimentar · Equipamento	<u>1980</u> ANO I	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR · Complementação Alimentar · Equipamento	<u>1981</u> ANO II	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR · Complementação Alimentar · Equipamento	<u>1982</u> ANO III	-	5.000	900	0,33	-	<u>296</u>

OBS


**PROJETO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

**DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS**


METAS	REALIZADO		PREVISTO				REALIZADO	
	80/82	%	83	%	84	%	TOTAL	%
Complementação Alimentar	900.000	25	900.000	25	1.800.000	50	3.600.000	100
Equipamento	6	86	1	14	-	-	7	100

**DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS**

METAS	REALIZADO		PREVISTO				SALDO	%	TOTAL GERAL	%
	80/82	%	83	%	84	%				
Complementação Alimentar	296	25	296	25	595	50	-	1.187	100	
Equipamento	71	19	13	4	-	-	283	367	100	

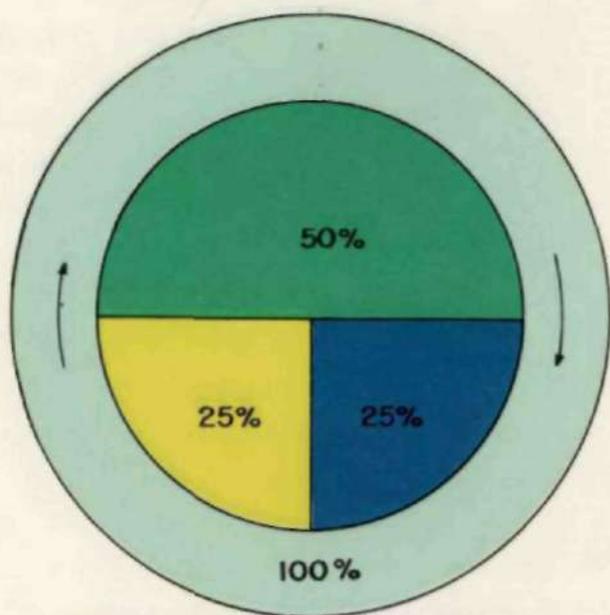


COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

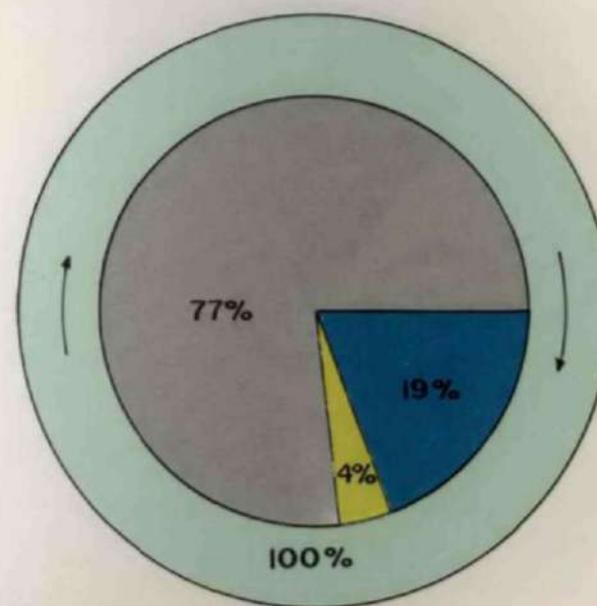


EQUIPAMENTO

LEGENDA

-  PROGRAMAÇÃO GERAL - 80/85
-  REALIZADO - 80/82
-  PROGRAMADO - 83
-  PROGRAMADO - 84
-  SALDO

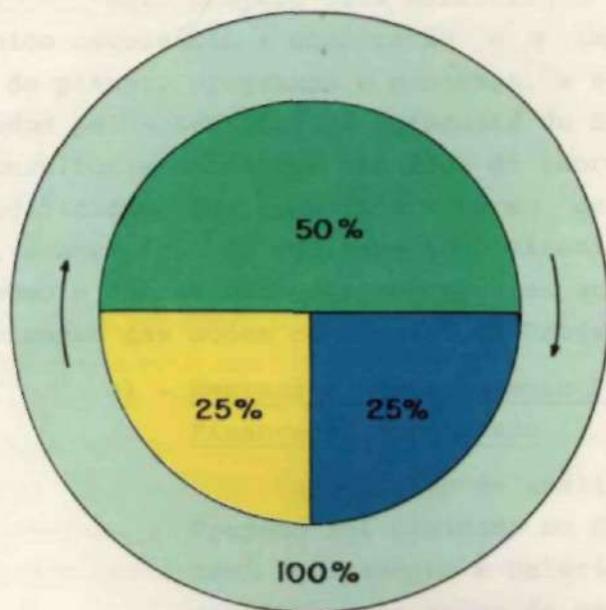

COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

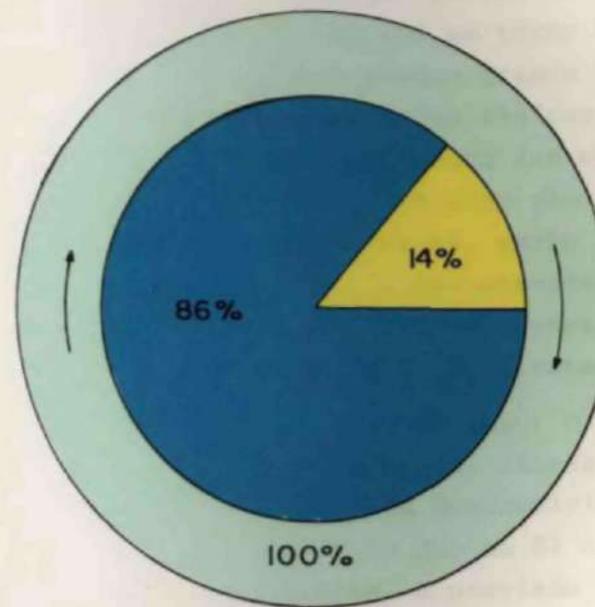

EQUIPAMENTO

LEGENDA

-  PROGRAMAÇÃO GERAL - 80/85
-  REALIZADO - 80/82
-  PROGRAMADO - 83
-  PROGRAMADO - 84

Este projeto visa garantir o suporte técnico necessário a elaboração e a implementação de planos, programas e projetos, a serem executados pelas Secretarias Estaduais de Educação, a consultoria de outros técnicos de acordo com a especificidade dos trabalhos a serem desenvolvidos, a aquisição de equipamentos, materiais de consumo e outras despesas necessárias ao desenvolvimento das ações constantes do Projeto.

a) - Execução e Detalhamento Físico e Financeiro por Estado

Para efeito de análise este Projeto foi dividido em duas metas: Equipamento e Salários que sintetizam as ações de maior porte físico e financeiro, tendo por base o detalhamento efetuado nestes dois níveis.

b) - Análise da Execução Física

i - EQUIPAMENTOS

Com relação a esta meta, a

execução física no período 80/82 foi em torno de 100%, isto porque grande parte das instalações físicas para o funcionamento das equipes já estão montadas nas próprias Secretarias, assim as aquisições feitas através deste projeto, viriam apenas complementar os já existentes.

Visualizando o Quadro Demonstrativo, síntese das ações já desenvolvidas, verifica-se que em 83 e 84 não consta a previsão física para esses anos. Sabe-se, entretanto, que a ação deverá continuar, mas não foi possível identificar quantitativamente essas ações.

ii - SALÁRIOS

Vale salientar que esta meta engloba os Técnicos das Equipes Centrais das Secretarias, as Equipes dos Órgãos Municipais de Educação e os Supervisores a nível Central e Regional, que acompanha a imple-mentação das propostas currículares, além dos elementos de apoio ã essas equipes.

Assim, foram efetivadas no período 80/82 a manutenção de 722 elementos envolvidos no Programa atingindo um percentual de 68% de realização. Essa ação deverá continuar nos anos de 83 e 84, em uma previsão de 16% por ano, apresentando um saldo de 44 mil dólares.

c) - Análise da Execução Financeira

i - EQUIPAMENTO

A execução financeira correspondente a meta 01 - Equipamento para o período 80/82 foram aplicados U\$ 135 mil dólares o que correspondeu a 47% de execução. Para os anos 83 e 84 houve uma redução considerável em termos de aplicação de recursos para 21% e 13%, isto porque como foi dito anteriormente, os equipamentos viriam como complemento aos já existentes.

ii - SALÁRIOS

A execução financeira desta meta foi satisfatória considerando-se a efetividade com que foram realizados os gastos com salários, não aprofundado

em nível salarial. Foram aplica-  
dos no período 80/82 U\$ 1.940 mil  
dólares correspondente a 45% de  
realização, com uma projeção de  
18% para os anos de 83 e 84. Esta  
meta apresentou um saldo de US\$844  
mil dólares.

d) - Conclusão

Em síntese, conclui-se que o  
Projeto obteve um desempenho ra-  
zoável apesar das variáveis que  
interferiram no processo, como,  
atrazo na liberação de recursos,  
o que provoca uma certa disfunção  
na execução dos custos.

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1980</u> ANO I						<u>15</u>	<u>43</u>	<u>28</u>	<u>15</u>	<u>65</u>	
. Equipamento			2	2	0	100	7	20	3	17	15	
. Salário			7	33	26	472	8	23	25	2	108	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1981</u> ANO II						<u>18</u>	<u>51</u>	<u>53</u>	<u>2</u>	<u>104</u>	
. Equipamento				-	-	-	2	6	1	5	17	
. Salário			7	33	26	472	16	45	52	7	115	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1982</u> ANO III						<u>18</u>	<u>51</u>	<u>104</u>	<u>53</u>	<u>203</u>	
. Equipamento					-	-	2	6	6	0	100	
. Salário			7	20	13	286	16	45	98	53	217	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
. Equipamento			2	2	0	100	11	32	10	22	31	
. Salário			21	86	65	410	39	113	175	62	154	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
 1US\$

ANO I - Cr\$ 53,17  
 ANO II - Cr\$ 80,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

ESTADO ALAGOAS

CUSTOS DO PROJETO

FOLHA Nº QD 7/1

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		UNIDADE	PESSOAL	UNIT. / PESSOA US\$ (1)	SUBTOTAL US\$ (1000)	EQUIPAMENTO US\$ (1)	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO . Equipamento . Salário	1980 ANO I	2 veículos -	- 33 técnicos	939	<u>31</u> - 31	<u>3</u> 3 -	<u>34</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA . Equipamento . Salário	1981 ANO II	- -	33 técnicos	2.969	<u>98</u> - 98	<u>1</u> 1 -	<u>99</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA . Equipamento . Salário	1982 ANO III	mobiliários p/func. das equipes -	- 20 técnicos	7.300	<u>146</u> - 146	<u>6</u> 6 -	<u>152</u>
. Equipamento . Salário					<u>275</u> - 275	<u>10</u> 10 -	<u>285</u>

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA-80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1980 ANO I						40	128	90	38	70
. Equipamento			1	-	1	-	17	56	0	56	
. Salário			30	48	18	160	23	72	90	18	125
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1981 ANO II						49	155	98	57	63
. Equipamento			-	-	-	-	8	24	90	66	375
. Salário			30	19	11	64	41	131	8	123	6
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1982 ANO III						34	110	190	80	173
. Equipamento			-	-	-	-	5	18	11	7	61
. Salário			30	48	18	160	29	92	179	87	194
			TOTAL GERAL								
. Equipamento			1	-	1	-	31	98	101	3	103
. Salário			90	115	25	128	92	295	277	18	94

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL < 70\$  
ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO BAHIA

FOLHA Nº QD 7/2

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		UNIDADE	PESSOAL	UNIT / PESSOA US\$(1)	SUBTOTAL US\$(1000)	EQUIPAMENTO US\$(1)	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1980</u> ANO I						
. Equipamento		-	-	-	-	0	
. Salário		-	48 técnicos	1.874	90	-	<u>90</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1981</u> ANO II						
. Equipamento		-	-	-	-	90	
. Salário		-	19 técnicos	2.842	54	-	<u>144</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1982</u> ANO III						
. Equipamento		-	-	-	<u>1.400</u>	<u>11</u>	
. Salário		-	48 técnicos	29.166	1.400	-	<u>1.349</u>
					<u>1.544</u>	<u>101</u>	<u>1.645</u>
. Equipamento					-	101	
. Salário					1.544	-	

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO: CEARÁ  
FOLHA Nº QE 7/3

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ (1.000)				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % <sup>(1)</sup>	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1980 ANO I						11	51	43	8	84	
. Equipamento			3	-	3	-	0,9	4	0	4	-	
. Salário			5	20	15	400	10,2	47	43	4	91	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1981 ANO II						15	65	34	31	52	
. Equipamento			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Salário			5	7	2	140	15	65	34	31	52	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1982 ANO III						15	65	88	23	135	
. Equipamento			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Salário			5	26	21	520	15	65	88	23	135	
			TOTAL GERAL									
. Equipamento			3	-	3	-	1	4	-	4	0	
. Salário			15	53	38	354	40	177	165	12	93	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1US\$ =

ANO I - Cr\$ 85,17
ANO II - Cr\$ 80,00
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

### CUSTOS DO PROJETO

ESTADO CEARÁ  
FOLHA Nº QD 7/3

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		UNIDADE	PESSOAL	UNIT. / PESSOA US\$(1)	SUBTOTAL US\$ (1000)	EQUIPAMENTO US\$(1)	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1980</u> ANO I						
. Equipamento		-	-	-	-	0	
. Salário		-	20 técnicos	2.450	49	-	<u>49</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1981</u> ANO II						
. Equipamento		-	-	-	-	0	
. Salário		-	7 técnicos	4.857	34	-	<u>34</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1982</u> ANO III						
. Equipamento		-	-	-	-	0	
. Salário		-	26 técnicos	4.230	110	-	<u>110</u>
. Equipamento					<u>193</u>		<u>193</u>
. Salário					-		
					193		

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % (I)		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % (II)	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1980</u> ANO I						<u>14</u>	<u>222</u>	<u>85</u>	<u>137</u>	<u>38</u>	
. Equipamento			4	4	0	100	3	49	9	40	18	
. Salário			37	20	17	54	11	173	76	97	44	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1981</u> ANO II						<u>21</u>	<u>334</u>	<u>201</u>	<u>133</u>	<u>60</u>	
. Equipamento			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Salário			37	48	11	130	21	334	201	133	60	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1982</u> ANO III						<u>21</u>	<u>334</u>	<u>360</u>	<u>26</u>	<u>108</u>	
. Equipamento			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Salário			37	53	16	144	21	334	360	26	108	
			TOTAL GERAL									
. Equipamento			4	4	0	-	3	49	9	40	18	
. Salário			81	121	40	150	53	841	637	204	76	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (FJA)  
 (II)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL { ANO I - C. \$ 65,17  
 ANO II - Cr\$ 80,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00  
 1US\$ =

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO MARANHÃO

FOLHA Nº QD 7/4

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		UNIDADE	PESSOAL	UNIT. / PESSOA US\$(1)	SUBTOTAL US\$ (1000)	EQUIPAMENTO US\$(1)	
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA . Equipamento . Salário	<u>1980</u> ANO I	- -	- 20 técnicos	- 4.100	<u>82</u> - 82	<u>9</u> 9 -	<u>91</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA . Equipamento . Salário	<u>1981</u> ANO II	-	48 técnicos	- 4.416	<u>212</u> - 212	- -	<u>212</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA . Equipamento . Salário	<u>1982</u> ANO III	- -	53 técnicos	- 6.962	<u>369</u> - 369	- -	<u>369</u>
. Equipamento . Salário					<u>663</u> - 663	<u>9</u> 9 -	<u>672</u>

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1980 ANO I						<u>4</u>	<u>14</u>	<u>19</u>	<u>5</u>	<u>136</u>
. Equipamento			1	14	13	1.400	-	-	6	6	
. Salário			83	6	77	8	4	14	13	1	93
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1981 ANO II						<u>11</u>	<u>37</u>	<u>25</u>	<u>12</u>	<u>67</u>
. Equipamento			-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Salário			83	19	64	23	11	37	25	12	67
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1982 ANO III						<u>11</u>	<u>37</u>	<u>95</u>	<u>58</u>	<u>256</u>
. Equipamento			-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Salário			83	99	16	120	11	37	95	58	256
TOTAL GERAL											
. Equipamento			1	14	13	1.400	<u>26</u>	<u>88</u>	<u>139</u>	<u>51</u>	<u>158</u>
. Salário			249	124	125	50	26	88	133	45	151

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ { ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867 -BR  
EDURURAL/NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

### CUSTOS DO PROJETO

ESTADO PARAÍBA  
FOLHA Nº QD 7/5

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS			TOTAL GERAL U\$ (1000)
		UNIDADE	PESSOAL	UNIT. / PESSOA U\$(1)	SUBTOTAL U\$(1000)	EQUIPAMENTO U\$(1)	
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1980</u> ANO I	-			<u>13</u>	<u>6</u>	<u>19</u>
. Equipamento		(*)			-	6	
. Salário		-	6 técnicos	2.166	13	-	
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1981</u> ANO II	-			<u>27</u>		<u>27</u>
. Equipamento		-			-	-	
. Salário		-	19 técnicos	1.420	27	-	
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1982</u> ANO III	-			<u>95</u>		<u>95</u>
. Equipamento		-			-	-	
. Salário		-	99 técnicos	959	95	-	
. Equipamento					<u>135</u>	<u>6</u>	<u>141</u>
. Salário					-	6	
					135	-	

OBS

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO:  
 PERNAMBUCO  
 FOLHA Nº 7/6

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1980 ANO I						23	114	48	66	42	
. Equipamento			-	-	-	-	0,6	2	0	2	-	
. Salário			37	35	2	95	22,4	112	48	64	43	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1981 ANO II						23	114	69	45	60	
. Equipamento			-	-	-	-	0,2	1	0	1	-	
. Salário			37	28	9	76	22,8	113	69	44	61	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1982 ANO III						23	113	113	0	100	
. Equipamento			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Salário			37	24	13	65	23	113	113	0	100	
			TOTAL GERAL									
. Equipamento			-	-	-	-	0,5	3	-	3	-	
. Salário			111	87	24	79	68,5	338	230	108	68	
							69	341	230	111	67	
							0,5	3	-	3	-	
							68,5	338	230	108	68	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
 (II)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
 1 US\$ { ANO I - Cr\$ 65,17  
 ANO II - Cr\$ 80,00  
 ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1667-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO PERNAMBUCO

FOLHA Nº QD 7/6

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		UNIDADE	PESSOAL	UNIT / PESSOA US\$(1)	SUBTOTAL US\$ (1000)	EQUIPAMENTO US\$(1)	
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1980</u> ANO I						
. Equipamento		-	-	-	-	-	-
. Salário		-	35 técnicos	1.371	48	-	<u>48</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1981</u> ANO II						
. Equipamento		-	-	-	-	-	-
. Salário		-	28 técnicos	33.714	944	-	<u>944</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1982</u> ANO III						
. Equipamento		-	-	-	-	-	-
. Salário		-	24 técnicos	4.833	116	-	<u>116</u>
					<u>1.108</u>	-	<u>1.108</u>
. Equipamento					-	-	-
. Salário					1.108	-	<u>1.108</u>

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P- % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P- % <sup>(1)</sup>	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1980</u> ANO I						<u>11</u>	<u>57</u>	<u>22</u>	<u>35</u>	<u>38</u>	
. Equipamento			1	-	-	-	1	4	-	4		
. Salário			3	10	7	334	10	53	22	31	41,5	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1981</u> ANO II						<u>12</u>	<u>65</u>	<u>41</u>	<u>24</u>	<u>63</u>	
. Equipamento			1	1	0	100	-	-	4	4		
. Salário			3	24	21	800	12	65	37	28	57	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1982</u> ANO III						<u>12</u>	<u>65</u>	<u>69</u>	<u>4</u>	<u>106</u>	
. Equipamento			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Salário			3	23	20	767	12	65	69	4	106	
			<b>TOTAL GERAL</b>									
. Equipamento			2	1	1	200	1	4	4	-	100	
. Salário			9	57	48	634	34	183	128	55	70	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (FJA)  
 (1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
 1 US\$ =

}	ANO I - Cr\$ 65,17
	ANO II - Cr\$ 80,00
	ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO PIAUÍ

FOLHA Nº QD 7/7

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		UNIDADE	PESSOAL	UNIT. / PESSOA US\$ (1)	SUBTOTAL US\$ (1000)	EQUIPAMENTO US\$ (1)	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1980</u> ANO I				<u>23</u>		<u>23</u>
. Equipamento		-	-	-	-	-	
. Salário		-	10 técnicos	2.300	23	-	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1981</u> ANO II				<u>50</u>	<u>4</u>	<u>54</u>
. Equipamento		-	-	-	-	4	
. Salário		-	24 técnicos	2.083	50	-	
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1982</u> ANO III				<u>81</u>		<u>81</u>
. Equipamento		-	-	-	-	-	
. Salário		-	23 técnicos	3.521	81	-	
					<u>154</u>	<u>4</u>	<u>158</u>
. Equipamento					-	4	
. Salário					154	-	

OBS

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

ESTADO:  
RIO GRANDE DO NORTE  
FOLHA Nº  
QE 7/8

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1980 ANO I						20	71	4	67	5	
. Equipamento			2	-	-	-	1	5	0	5	-	
. Salário			6	6	0	100	19	66	4	62	6	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1981 ANO II						38	133	31	102	23	
. Equipamento			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Salário			6	6	0	100	38	133	31	102	23	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1982 ANO III						38	133	53	80	40	
. Equipamento			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
. Salário			6	18	12	300	38	133	53	80	40	
			TOTAL GERAL									
. Equipamento			2	-	-	-	2	5	0	5	-	
. Salário			18	30	12	167	95	332	88	244	26,5	
							97	337	88	249	26,5	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1US\$

ANO I - Cr\$ 65,17  
ANO II - Cr\$ 80,00  
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 30/82

CUSTOS DO PROJETO

ESTADO  
 R.G. DO NORTE  
 FOLHA Nº QD 7/8

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		UNIDADE	PESSOAL	UNIT. / PESSOA US\$ (1)	SUBTOTAL US\$ (1000)	EQUIPAMENTO US\$ (1)	
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1980</u> ANO I						
. Equipamento		-	-	-	-	-	-
. Salário		-	6 técnicos	666	4	-	4
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1981</u> ANO II						
. Equipamento		-	-	-	-	-	-
. Salário		-	6 técnicos	5.500	33	-	33
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	<u>1982</u> ANO III						
. Equipamento		-	-	-	-	-	-
. Salário		-	18 técnicos	3.388	61	-	61
					<u>98</u>		<u>98</u>
. Equipamento					-	-	-
. Salário					98	-	98

OBS

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$ 1.000				
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETA	1980 ANO I						7	53	33	20	62	
. Equipamento			1	2	1	200	2	17	5	12	30	
. Salário			7	17	10	243	5	36	28	8	78	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1981 ANO II						10	74	30	44	40	
. Equipamento			-	-	-	-	0,2	2	-	2		
. Salário			7	16	9	229	9,8	72	30	42	41	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1982 ANO III						10	74	49	25	66	
. Equipamento			-	-	-	-	0,2	2	-	2		
. Salário			7	16	9	229	9,8	72	49	23	68	
			TOTAL GERAL									
. Equipamento			1	2	1	200	3	21	5	16	24	
. Salário			21	49	28	234	24	180	107	173	60	

OBS : FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
1 US\$ =

ANO I - Cr\$ 65,17
ANO II - Cr\$ 80,00
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82  
CUSTOS DO PROJETO

ESTADO SERGIPE

FOLHA Nº QD 7/9

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS			TOTAL GERAL US\$ (1000)
		UNIDADE	PESSOAL	UNIT / PESSOA US\$(1)	SUBTOTAL US\$ (1000)	EQUIPAMENTO US\$(1)	
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA . Equipamento . Salário	<u>1980</u> ANO I	- (* )	- 17 técnicos	- 1.941	<u>33</u> - 33	<u>5</u> 5	<u>38</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA . Equipamento . Salário	<u>1981</u> ANO II	- -	- 16 técnicos	- 2.187	<u>35</u> - 35	- -	<u>35</u>
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO . Equipamento . Salário	<u>1982</u> ANO III	- -	- 16 técnicos	- 3.562	<u>57</u> - 57	- -	<u>57</u>
. Equipamento . Salário					<u>125</u> - 125	<u>5</u> 5 -	<u>130</u>


OBS

DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS


METAS	REALIZADO		PREVISTO				REALIZADO	
	80/82	%	83	%	84	%	TOTAL	%
Equipamento	23	100			-		23	100
Salário	722	68	173	16	173	16	1.068	100

DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS

METAS	REALIZADO		PREVISTO				SALDO	%	TOTAL GERAL	%
	80/82	%	83	%	84	%				
Equipamento	135	47	59	21	38	13	44	16	276	100
Salário	1.940	45	778	18	778	18	844	19	4.340	100

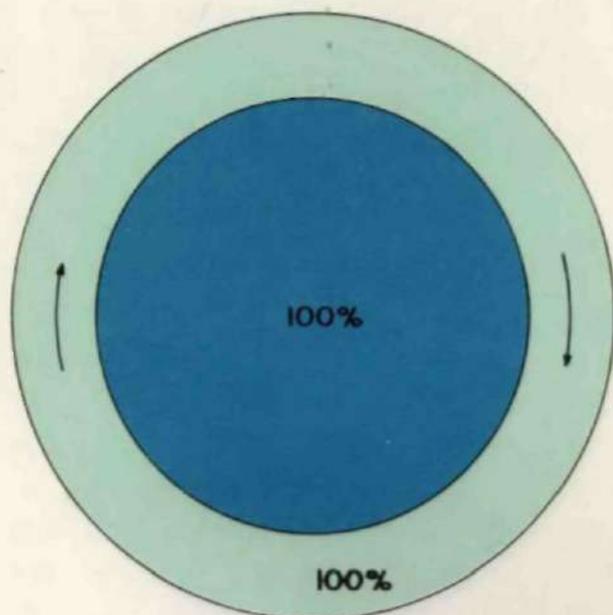


EQUIPAMENTO

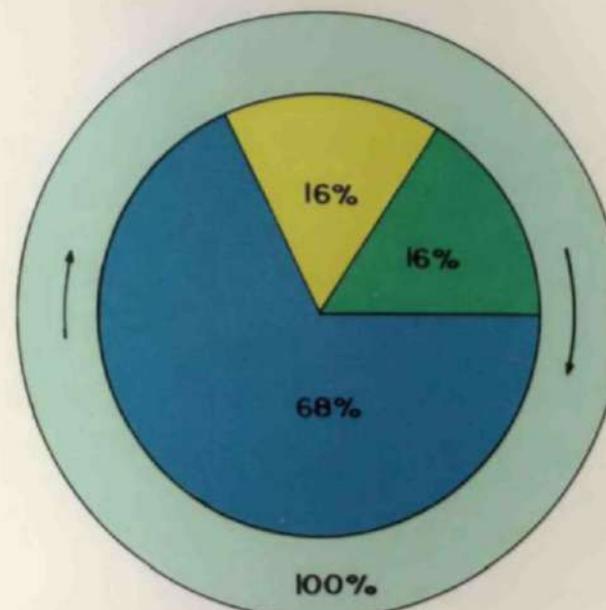


SALÁRIO

LEGENDA

- PROGRAMAÇÃO GERAL - 80/85
- REALIZADO - 80/82
- PROGRAMADO - 83
- PROGRAMADO - 84

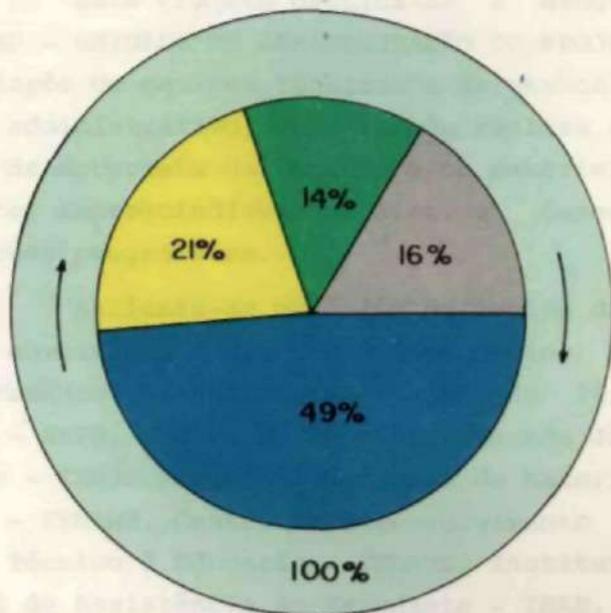

EQUIPAMENTO

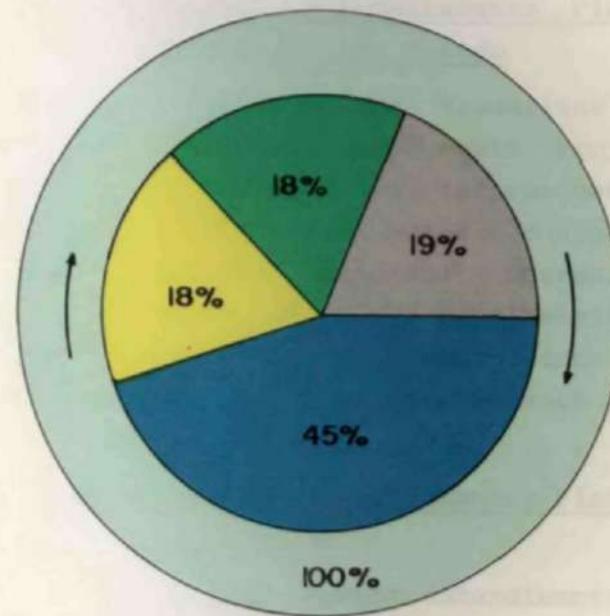

SALÁRIO

LEGENDA

-  PROGRAMAÇÃO GERAL - 80/85
-  REALIZADO - 80/82
-  PROGRAMADO-83
-  PROGRAMADO-84
-  SALDO

Este Projeto destina-se a manutenção da UNAP - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO - que dispõe de equipes técnicas e de pessoal de apoio administrativo, como também realiza a aquisição de materiais de consumo e/ou material permanente, imprescindíveis ao efetivo desempenho das ações programadas.

Salienta-se que além da equipe da UNAP, estão envolvidos neste Projeto os Órgãos de Assessoramento: Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus - SEPS, Centro de Recursos Humanos João Pí-nheiro - CRHJP, Fundação Nacional de Material Escolar - FENAME, Centro de Desenvolvimento de Apoio Técnico à Educação - CEDATE, Instituto Nacional de Assistência ao Estudante - INAE, que são órgãos responsáveis pela coordenação de componentes específicos tais como: a Expansão da Rede Física, Formação e Treinamento de Recursos Humanos. Material Escolar, Alimentação Escolar e Desenvolvimento de Currículo.

a) - Execução e Detalhamento Físico e Financeiro por Estado

Para melhor visualizar as ações realizadas neste Projeto e uniformidade nas informações, agrupamos em três metas: Equipamento, Salário e Despesas Operacionais, tendo por base o detalhamento físico e o montante de recursos alocados para o desenvolvimento dessas ações.

b) - Análise dos Componentes Físicos e Financeiros

Para melhor entendimento do desempenho efetuado, os quadros apresentados, demonstram a Execução e o Detalhamento do Projeto Administração - UNAP (quadro QD/8), cuja análise indica o seguinte comportamento:

i - EQUIPAMENTO

No periodo 80/82 a meta "Equipamento" obteve um percentual de 85% de realização financeira concentrando-se grande parte das aquisições nos dois últimos anos ou seja 81 e 82, havendo uma previsão de apenas 15% de execução para 1983, para concluir a referida meta.

ii - SALÁRIOS

Quanto a esta meta, houve 23% de realização no período 80/82 com a manutenção de técnicos e elementos de apoio, com despesas da ordem de U\$ 771 mil. A meta tem uma previsão de continuidade até 1985.

Sabe-se que é ação específica da UNAP, Coordenador, Supervisor e Acompanhar o desenvolvimento do Programa nas Unidades Estaduais e assegurar aos órgãos de Assessoramento as condições de exequibilidade das ações propostas, fortalecendo suas estruturas em termos de Recursos Humanos e materiais, devendo essa meta ter continuidade até o final do Programa.

iii - DESPESAS OPERACIONAIS

Esta meta obteve 61% de realização devendo continuar até 1985. Nesta meta foram agrupadas despesas de material de consumo e outros serviços, onde os gastos foram de U\$ 885 mil.

c) - Conclusão

Em uma visão analítica e conclusiva, nota-se que este projeto não

apresentou maiores dificuldades  
na execução das ações propostas  
no Plano de Trabalho da UNAP.

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA- 80/82

UNAP  
QE 8/1

PROJETOS METAS	EXERCÍCIO	% WP	FÍSICO				% WP	FINANCEIRO US\$			
			PREVISTO WP	REALIZADO ESTADO	DIFERENÇA	R/P - % <sup>(1)</sup>		PREVISTO WP	APLICADO ESTADO	SALDO	R/P - % <sup>(1)</sup>
UNAP											
1 - Projeto Administração	1980 ANO I							836		836	
. Equipamento			-	-	-	-		3	-	3	
. Salários			128	-	-	-		674	-	674	
. Despesas Operacionais			-	-	-	-		159	-	159	
1 - Projeto Administração	1981 ANO II							850	506	344	
. Equipamento			1	1*	0	-		17	33	(-)16	
. Salários			128	23	105	-		674	203	471	
. Despesas Operacionais**			-	-	-	-		159	270	(-)111	
1 - Projeto Administração	1982 ANO III							836	1.136	(-)300	
. Equipamento			-	-	-	-		3	13	(-)10	
. Salários			128	43	85	-		674	508	166	
. Despesas Operacionais**			-	-	-	-		159	615	(-)456	
<b>TOTAL GERAL</b>											
. Equipamento			1	1	-	-		2.522	1.642	880	
. Salários			384	66	190	-		2.022	711	1.311	
. Despesas Operacionais			-	serviços	-	-		477	885	(-)408	

OBS: FONTE: - WORKING PAPER (WP)- PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)  
(1)- REALIZADO X PREVISTO

TAXA CAMBIAL  
100\$ =

ANO I - Cr\$ 85,17
ANO II - Cr\$ 80,00
ANO III - Cr\$ 160,00

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL / NE

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 80/82

### CUSTOS DO PROJETO

UNAP

QD 8/1

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	QUANTIFICAÇÃO		CUSTOS			TOTAL GERAL U\$(1000)
		UNIDADE	PESSOAL H/M	UNIT. / PESSOA U\$(1)	SUBTOTAL U\$(1000)	EQUIPAMENTO U\$(1)	
UNAP	<u>1980</u> ANO I						
1 - Projeto Administração							
. Equipamento		-	-	-	-	-	-
. Salários		-	-	-	-	-	-
. Despesas Operacionais **		-	-	-	-	-	-
2 - Projeto Administração	<u>1981</u> ANO II						<u>506</u>
. Equipamento		1	-	-	-	33	33
. Salários		-	128	2	203	-	203
. Despesas Operacionais **		-	-	-	270	-	270
3 - Projeto Administração	<u>1982</u> ANO III						<u>1.136</u>
. Equipamento		-	-	-	-	13	13
. Salários		-	128	4	508	-	508
. Despesas Operacionais **		-	-	-	615	-	615


OBS XX - Diárias, Passagens, material de consumo etc.  
X - 1 veículo e outros equipamentos (máquinas, móveis etc.)

DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS


METAS	REALIZADO		PREVISTO						TOTAL GERAL	%
	80/82	%	83	%	84	%	85	%		
Equipamento	46	85	8	15	-	-	-	-	54	100
Salários	711	23	958	31	700	23	700	23	3.069	100
Despesas Operacionais	885	61	194	13	181	13	180	13	1.440	100

# PROJETO DE ADMINISTRAÇÃO


## UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA (FINANCEIRA)

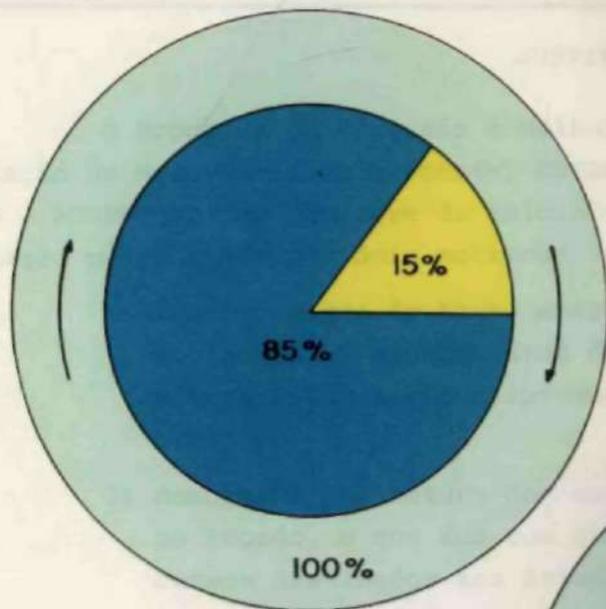

**EQUIPAMENTO**

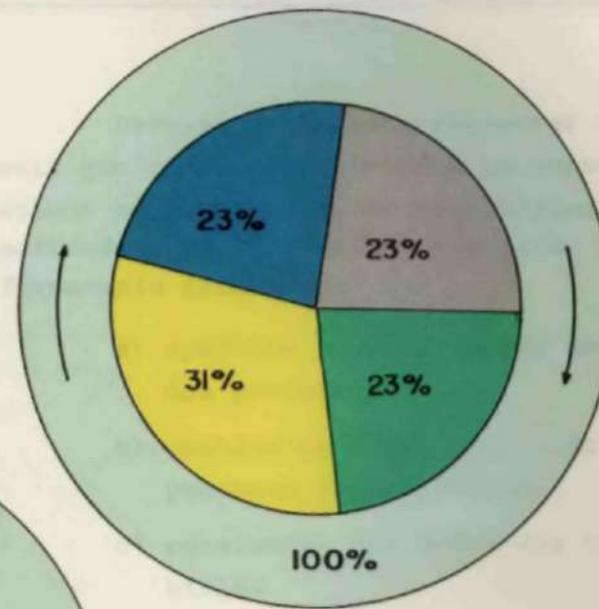

**SALÁRIOS**

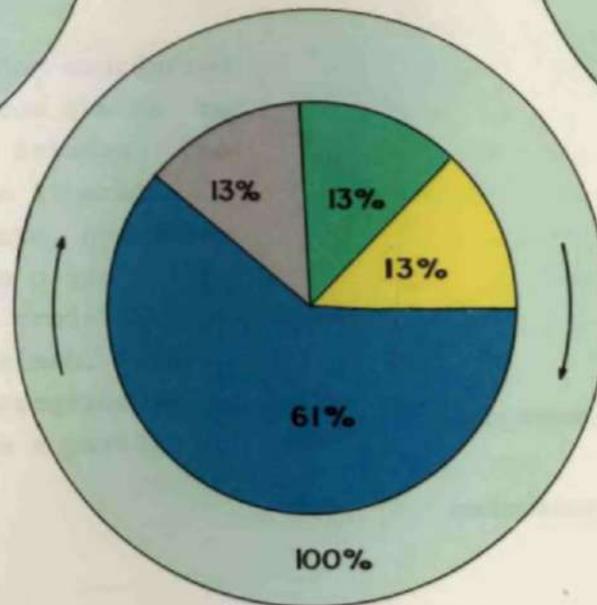

**DESPESAS OPERACIONAIS**

### LEGENDA

- PROGRAMAÇÃO GERAL 80/85
- REALIZADO 80/82
- PROGRAMADO -83
- PROGRAMADO-84
- PROGRAMADO-85

JUSTIFICATIVA

O Programa de Expansão e Melhoria da Educação no Meio Rural do Nordeste, EDURURAL-NE, BIRD - ACORDO N° 1867/BR teve de início sua programação prejudicada por dois motivos:

- 1) longo período de tempo entre as negociações, os ajustamentos das propostas Estaduais e a aprovação pelo BIRD;
- 2) demora na assinatura do empréstimo do Acordo, o que fez com que os recursos destinados aos Estados no ano de 1980, só fossem liberados e assim mesmo parcialmente, nos meses de novembro e dezembro o que dificultou a execução dos projetos previstos no referido período. Esta situação fez com que o Programa se implantasse efetivamente a partir do ano de 1981.

Deve-se no entanto registrar outras variáveis que também interferiram na consecução dos objetivos propostos, dentre elas algumas devem ser relacionadas, cujos efeitos têm sido observados de forma mais intensiva.

- a) aparente superestimação dos custos dos projetos;
- b) obstáculos provocados pelo acelerado processo inflacionário;
- c) constantes variações das taxas cambiais;
- d) procedimentos gerenciais diversificados;
- e) entraves burocráticos.

O interrelacionamento dessas variáveis comprometeu o melhor desempenho do Programa.

Vale portanto deter-se numa análise mais acurada das duas variáveis consideradas de

maior importância:

- a super estimativa nos custos dos projetos, que pode ser atribuída à projeção feita sobre os índices de inflação cujo comportamento não correspondeu aos estudos feitos na época, e, aos procedimentos gerenciais diversificados. Sabe-se que a eficácia de uma administração depende da sua capacidade gerencial. A gerência deste Programa a nível Estadual se caracterizou por procedimentos os mais diferenciados possíveis quanto à resolução dos problemas que se apresentavam. Mesmo tendo em vista que cada caso é um caso, guardada as especificidades do mesmo, sabe-se que para atingir os objetivos propostos necessário se faz o estabelecimento de certas linhas que possam direcionar as ações do Programa.

Diante da problemática acima exposta faz-se necessário propor reajustamento nas metas físicas e financeiras do programa a fim de se corrigir os desvios ocorridos.

Assim, uma vez detectadas as disfunções, foram realizados os estudos referentes ao reajustamento das metas físicas e financeiras do Programa .

Os critérios estabelecidos buscaram identificar, partindo da previsão global das metas, o realizado no período 1980-1982, considerando como tal as metas em realização de 1982 - para daí fixar as metas correspondentes ao período 1983-1985. Os resultados indicam o cumprimento das metas físicas nos anos de 1983 e 1984 e um saldo nas previsões financeiras, que deverá ser reprogramado através de prévio planejamento com a participação dos novos governos estaduais (a partir de março 1983) com o Banco Mundial e o Ministério de Educação e Cultura.

# **1. PROJETO REDE FÍSICA**

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO ALAGOAS

FOLHA Nº  
 PRO. 1/1

PROJETO	METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
			QUANT	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
<u>REDE FÍSICA</u>		<u>1983</u> <u>ANO IV</u>				<u>1.686.</u>	
	. Construção		52	32 Escolas de 2 salas 14 Ampliações 4 OME's 2 NURES	19.200 19.200 17.000 21.000	614. 269. 68. 42.	
	. Reforma		38	Unidades	4.000	152.	
	. Equipamento e Mobiliário		90	Unidades	6.000	540.	
							<u>CUSTO TOTAL:</u> 3.262
							<u>REALIZADO:</u> 3.357
							<u>SALDO:</u> (-)95

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO BAHIA

FOLHA Nº  
 PRO. 1/2

PROJETO	METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
			QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
							<u>CUSTO TOTAL:</u> 3.290 REALIZADO: 2.073 <u>SALDO:</u> 1.217

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO CEARÁ

FOLHA Nº  
 PRO. 1/3

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
<u>FEDE FÍSICA</u>	<u>1983</u> <u>ANO IV</u>				<u>2.090</u>	
. Construção		21	21 NURES	12.000	1.736	
. Reforma		-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		59	Unidades	6.000	354	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 5.311 <u>REALIZADO:</u> 4.735 <u>SALDO:</u> 576

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		QBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1983</u> <u>ANO IV</u>				<u>1.598</u>	
. Construção		64	64 Escolas de 2 salas	20.000	1.280	
. Reforma		-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		53	53 Escolas de 2 salas	6.000	318	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1984</u> <u>ANO V</u>				<u>924</u>	
. Construção		33	33 Escolas de 2 salas	20.000	660	
. Reforma		-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		44	44 Escolas de 2 salas	6.000	264	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 3.825 <u>REALIZADO:</u> 3.944 <u>SALDO</u> (-119)

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PARAÍBA  
 FOLHA Nº PRO. 1/5

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1983</u> <u>ANO IV</u>				<u>1.608</u>	
. Construção		75	45 Ampliações 30 Escolas de 2 salas	17.500 17.500	785 523	
. Reforma		-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		50	Unidades	6.000	300	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1984</u> <u>ANO V</u>				<u>618</u>	
. Construção		20	20 Escolas de 2 salas	17.400	348	
. Reforma		-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		45	Unidades	6.000	270	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 3.245 <u>REALIZADO:</u> 3.834 <u>SALDO:</u> (-) 589

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PERNAMBUCO

FOLHA Nº PRO. 1/6

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
<u>REDE FÍSICA</u>	1983 ANO IV				<u>511</u>	
. Construção		8	5 Escolas de 2 salas 3 Escolas de 5 salas	13.500 48.400	108 145	
. Reforma		-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		43	Unidades	6.000	258	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 1.466 <u>REALIZADO:</u> 1.242 <u>SALDO:</u> 224

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO  
R.G. DO NORTE  
FOLHA Nº  
PRO. 1/8

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1983</u> <u>ANO IV</u>				<u>1.148</u>	
. Construção		38	18 Ampliações 17 Escolas de 2 salas 3 NURES	17.100 16.500 68.400	307 280 205	
. Reforma		14	Unidades	4.000	56	
. Equipamento e Mobiliário		50	Unidades	6.000	300	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 2.871 <u>REALIZADO:</u> 2.493 <u>SALDO:</u> 378

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PIAUÍ  
FOLHA Nº PRO. 1/7

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1983</u> ANO IV				<u>998</u>	
. Construção		41	33 Ampliações 3 Escolas de 2 salas 5 Armazéns	18.400 18.400 13.200	607 55 66	
. Reforma		-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		45	Unidades	6.000	270	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 2.910 <u>REALIZADO:</u> 1.781 <u>SALDO:</u> 1.129

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO SERGIPE  
 FOLHA Nº PRO. 1/9

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
<u>REDE FÍSICA</u>	<u>1983</u> <u>ANO IV</u>				<u>669</u>	
. Construção		31	31 Escolas de 2 salas	15.600	483	
. Reforma		-	-	-	-	
. Equipamento e Mobiliário		31	Unidades	6.000	186	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 1.735 <u>REALIZADO:</u> 1.602 <u>SALDO:</u> 133

PROJETO DE REDE FÍSICA

RESUMO

ESTADO	META	FÍSICO			FINANCEIRO US\$(1000)		
		80/82	83	84	80/82	83	84
ALAGOAS	CONSTRUÇÃO	48	52	0	1.198	994	0
	REFORMA	0	38	0	0	152	0
	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	48	90	0	473.	540.	0
BAHIA	CONSTRUÇÃO	100	0	0	1.805	0	0
	REFORMA	0	0	0	0	0	0
	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	100	0	0	268	0	0
CEARA'	CONSTRUÇÃO	149	21	0	2.232	1.736	0
	REFORMA	77	0	0	0	0	0
	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	188	59	0	413	354	0
MARANHÃO	CONSTRUÇÃO	53	64	33	1.023	1.280	660
	REFORMA	0	0	0	0	0	0
	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	53	53	44	399	318	264
PARAÍBA	CONSTRUÇÃO	60	75	20	1.231	1.308	348
	REFORMA	0	0	0	0	0	0
	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	60	50	45	377	300	270
PERNAMBUCO	CONSTRUÇÃO	19	8	0	555	253	0
	REFORMA	33	0	0	0	0	0
	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	17	43	0	176	258	0
PIAUI	CONSTRUÇÃO	49	41	0	459	728	0
	REFORMA	0	0	0	0	0	0
	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	45	45	0	324	270	0
RIO GRANDE DO NORTE	CONSTRUÇÃO	65	38	0	1.100	792	0
	REFORMA	50	14	0	0	56	0
	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	118	50	0	245	300	0
SERGIPE	CONSTRUÇÃO	32	31	0	803	483	0
	REFORMA	0	0	0	0	0	0
	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	32	31	0	132	186	0
TOTAIS		572	330	53	10.406	7.574	1.008
		160	52	89	0	208	0
		660	421	0	2.807	2.526	534

## **2. PROJETO DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO**

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão - Livros e Guias - Pacotes	<u>1983</u> ANO IV					
			49.680	2.5 3	207 124 83	
			27.600	30	30	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão - Livros e Guias - Pacotes	<u>1984</u> ANO V					
			68.208	2.5	218 171	
			15.550	3	47	
						CUSTO TOTAL: 537 REALIZADO: 498 SALDO: 39

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO BAHIA  
 FOLHA Nº PRO. 2/2

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão - Livros e Guias - Pacotes	<u>1983</u> ANO IV					
			280.910	2.5	702	
			30.242	3	91	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão - Livros e Guias - Pacotes	<u>1984</u> ANO V					
			101.966	2.5	255	
			6.048	3	19	
						CUSTO TOTAL: 2.463 REALIZADO: 2.684 SALDO (-) 221

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDUCURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO CEARÁ  
 FOLHA Nº PRO. 2/3

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
- Desenvolvimento de Currículo e Supervisão - Livros e Guias - Pacotes	<u>1983</u> ANO IV				710	
			113.600	2.5	284	
			142.000	3	426	
- Desenvolvimento de Currículo e Supervisão - Livros e Guias - Pacotes	<u>1984</u> ANO V				3.617	
			1.238.490	2.5	3.097	
			173.300	3	520	
						CUSTO TOTAL: 2.379 REALIZADO: 6.126 SALDO: (-)3.747

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
- Desenvolvimento de Currículo e Supervisão - Livros e Guias - Pacotes	<u>1983</u> ANO IV				150	
			60.000	2.5	150	
			-	-	-	
- Desenvolvimento de Currículo e Supervisão - Livros e Guias - Pacotes	<u>1984</u> ANO V				591	
			236.196	2.5	591	
			-	-	-	
						Custo Total: 809 Realizado: 1.004 Saldo: (-)195



MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PERNAMBUCO  
FOLHA N° PRO. 2/6

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
- Desenvolvimento de Currículo e Supervisão Livros e Guias Pacotes	1983 ANO IV				586	
			63.019	2.5	158	
			142.667	3	428	
- Desenvolvimento de Currículo e Supervisão - Livros e Guias - Pacotes	1984 ANO V				84	
			-	-	-	
			27.935	3	84	
						CUSTO TOTAL: 1.315 REALIZADO: 1.151 SALDO: 164



MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PIAUÍ

FOLHA Nº  
 PRO. 2/7

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$ 1000	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão - Livros e Guias - Pacotes	<u>1983</u>					
	ANO IV				638	
			102.080	2.5	256	
			127.667	3	382	
Desenvolvimento de Currículo Supervisão - Livros e Guias - Pacotes	<u>1984</u>				1.550	
	ANO V					
			420.732	2.5	1.052	
			165.857	3	498	
						CUSTO TOTAL: 1.855 REALIZADO: 2.624 SALDO: (-) 769

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO SERGIPE

FOLHA Nº PRO. 2/9

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
Desenvolvimento de Currículo e Supervisão  - Livros e Guias  - Pacotes	1983				2.6	
	ANO IV		1.015	2.5	2.6	
			-	-	-	
						Custo Total: 529 Realizado: 376 Saldo: 153

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO RESUMO

ESTADO	META	FÍSICO			FINANCEIRO U\$(1000)		
		80/82	83	84	80/82	83	84
ALAGOAS	Livros e Guias Pacotes	53.612	49.680	68.208	47	124	171
		22.550	27.600	15.550	26	83	47
BAHIA	Livros e Guias Pacotes	753.124	280.910	101.966	847	702	255
		110.510	30.242	6.048	770	91	19
CEARA*	Livros e Guias Pacotes	572.210	113.600	1.238.490	921	284	3.097
		267.000	142.000	173.300	878	426	520
MARANHÃO	Livros e Guias Pacotes	102.914	60.000	236.186	211	150	591
		76.697	0	0	52	0	0
PARAÍBA	Livros e Guias Pacotes	251.514	0	0	290	0	0
		73.640	127.490	0	358	383	0
PERNAMBUCO	Livros e Guias Pacotes	95.481	63.019	0	238	158	0
		94.298	142.667	27.935	243	428	84
PIAUI'	Livros e Guias Pacotes	260.388	102.080	420.732	237	256	1.052
		112.666	127.667	165.857	199	382	498
RIO GRANDE DO NORTE	Livros e Guias Pacotes	0	0	0	0	0	0
		47.366	55.934	0	277	168	0
SERGIPE	Livros e Guias Pacotes	93.485	1.015	0	286	3	0
		90.000	0	0	87	0	0
TOTAIS		2.182.728	670.304	2.065.582	3.077	1.677	5.166
		894.727	653.600	388.690	2.890	1.961	1.168

### **3. PROJETO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO ALAGOAS  
 FOLHA Nº PRO. 3/1

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1983</u> ANO IV				<u>125</u>	
. Treinamento de Professores		354	180 Professores Leigos 56 Professores de 1a./4a. séries 18 Professores de 5a./8a. séries	322. 108. 1.389	90 6. 25.	
. Outros		114	27 Técnicos da SEC e Órgãos Regionais 43 Supervisores 26 Técnicos OME'S	38. 47. 39.	1. 2. 1.	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1984</u> ANO V				<u>6.</u>	
. Treinamento de Professores		74	56 Professores 1a./4a. séries 18 Professores de 5a./8a. séries	54 56	3. 1.	
. Outros		69	43 Supervisores 26 Técnicos OME'S	24 39	1. 1.	
						CUSTO TOTAL: 408 REALIZADO: 284 SALDO: 124

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO BAHIA  
 FOLHA Nº 3/2  
 PRO.

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1983 ANO IV				767	
. Treinamento de Professores		2.222	870 Professores Leigos 1352 Professores (atualização)	403. 296.	350. 400.	
. Outros		121	121 Supervisores	141	17.	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1984 ANO V				350	
. Treinamento de Professores		870	870 Professores Leigos	403	350	
						CUSTO TOTAL: 1.808 REALIZADO: 1.705 SALDO: 103

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO CEARÁ  
 FOLHA N° PRO.3/3

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1983</u> ANO IV				<u>1.487</u>	
. Treinamento de Professores		4.290	4.000 Professores Leigos 290 Instrutores	350 45.	1.400 13.	
. Outros		280	45 Supervisores (básico) 160 Supervisores (básico inicial) 75 Técnicos OME'S	177 225 400	8. 36. 30	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1984</u> ANO V				<u>370</u>	
. Treinamento de Professores		3.000	3.000 Professores Leigos	117	352	
. Outros		160	160 Supervisores	113	18	
						CUSTO TOTAL: 3.145 REALIZADO: 3.145 SALDO: 0

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO  
 MARANHÃO  
 FOLHA Nº  
 PRO. 3/4

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento de Professores . Outros	1983 ANO IV	1.800 45	1.800 Professores Leigos 45 Técnicos da SEC e Equipes Regionais Municipais	174. 44	314. 312. 2.	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento de Professores . Outros	1984 ANO V	1.200 45	1.200 Professores Leigos 45 Técnicos da SEC e Equipes Regionais Municipais	60 44	74. 72. 2	
						CUSTO TOTAL: 1.080 REALIZADO: 1.068 SALDO: 12

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PARATIBA  
 FOLHA Nº PRO. 3/5

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento de Professores	<u>1983</u> ANO IV	450	450 Professores Leigos	800.	<u>360</u> 360.	
						CUSTO TOTAL: 1.162 REALIZADO: 927 SALDO: 235

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1983</u> ANO IV				<u>169</u>	
. Treinamento de Professores		783	284 Professores de 1ª./4ª. séries 200 Professores de 1ª./4ª. séries 142 Professores de 1ª./4ª. séries 77 Professores de 1ª./4ª. séries 80 Professores de 5ª./8ª. séries	60. 164. 120. 142 1.025	17. 33. 17. 11. 82.	
. Outros		106	18 Técnicos da SEC e Órgãos Regionais 20 Técnicos da SEC e Órgãos Regionais 68 Supervisores	166 86 58	3. 2. 4.	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	<u>1984</u> ANO V				<u>93</u>	
. Treinamento de Professores		612	196 Professores de 1ª/4ª séries 114 Professores de 1ª/4ª séries 200 Professores de 1ª/4ª séries 82 Professores de 1ª/4ª séries 20 Professores de 5ª/8ª séries	61 164 120 145 1.050	12 19 24 12 21	
. Outros		88	20 Técnicos da SEC e Órgão Regionais 68 Supervisores	100 45	2 3	
						CUSTO TOTAL: 443 REALIZADO: 401 SALDO: 42

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PIAUÍ  
 FOLHA N°  
 PRO. 3/7

PROJETO	METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
			QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1983 ANO IV				1.304	
. Treinamento de Professores			3.411	2.161 Professores Leigos 100 Instrutores 1.000 Professores (atualização) 150 Supervisores (atualização)	556 160 67 133	1.202. 16. 67. 2.	
. Outros			200	(*) 200 Seminário de avaliação	85	17.	(*) 200 participantes
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1984 ANO V				144	
. Treinamento de Professores			2.161	2.161 Professores Leigos	59	127.	
. Outros			200	(*) 200 Seminário de avaliação	85	17.	(*) 200 participantes
							CUSTO TOTAL: 3.536 REALIZADO: 2.835 SALDO: 701

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO  
 R.G. DO NORTE  
 FOLHA Nº PRO: 3/8

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento de Professores . Outros	<u>1983</u> ANO IV	648  233	22 Professores (inicial) 626 Professores (reciclagem) 233 Supervisores	181 95 94	<u>86</u> 4. 60. 22.	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento de Professores	<u>1984</u> ANO V	626	626 Professores (reciclagem)	95	<u>60</u> 60	
						CUSTO TOTAL: 345 REALIZADO: 283 SALDO: 62

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO SERGIPE  
FOLHA Nº PRO. 3/9

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento de Professores . Outros	<u>1983</u> ANO IV				<u>750</u>	
		2.287	1.500 Professores Leigos 787 Professores (atualização)	400 127	600. 100.	
		40	40 Supervisores	1.250	50.	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . Treinamento de Professores . Outros	<u>1984</u> ANO V				<u>214</u>	
		2.287	1.500 Professores Leigos 787 Professores (atualização)	96 63	144. 50.	
		40	40 Supervisores	500	20.	
						CUSTO TOTAL: 1.758 REALIZADO: 1.671 SALDO: 87

PROJETO DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RESUMO

ESTADO	META	FÍSICO			FINANCEIRO U\$(1000)		
		80/82	83	84	80/82	83	84
ALAGOAS	TREINAMENTO DE PROFESSORES	839	354	74	144	121	4
	OUTROS	139	114	69	9	4	2
BAHIA	TREINAMENTO DE PROFESSORES	2.792	2.222	870	510	750	350
	OUTROS	220	121	0	78	17	0
CEARA	TREINAMENTO DE PROFESSORES	3.491	4.290	3.000	1.185	1.413	352
	OUTROS	739	280	160	103	74	18
MARANHÃO	TREINAMENTO DE PROFESSORES	2.480	1.800	1.200	644	312	72
	OUTROS	203	45	45	36	2	2
PARAÍBA	TREINAMENTO DE PROFESSORES	1.350	450	0	550	360	0
	OUTROS	88	0	0	17	0	0
PERNAMBUCO	TREINAMENTO DE PROFESSORES	1.286	783	612	108	160	88
	OUTROS	259	106	88	31	9	5
PIAUI	TREINAMENTO DE PROFESSORES	4.031	3.411	2.161	1.336	1.287	127
	OUTROS	450	200	200	51	17	17
RIO GRANDE DO NORTE	TREINAMENTO DE PROFESSORES	1.306	648	626	121	64	60
	OUTROS	101	233	0	16	22	0
SERGIPE	TREINAMENTO DE PROFESSORES	3.600	2.287	2.287	653	700	194
	OUTROS	40	40	40	54	50	20
<b>TOTAIS</b>		21.175	16.245	10.830	5.251	5.167	1.247
		2.239	1.139	602	391	195	64

## **4. PROJETO FORTALECIMENTO DOS OME'S**

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO ALAGOAS  
FOLHA Nº  
PRO. 4/1

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
FORTALECIMENTO DOS OME'S  · Equipamento  · Salário	1983 ANO IV	13	Equipamento de 13 Órgãos Municipais de Ensino Manutenção de 13 (H/ANO) Chefes dos OME'S	2.693.	35.	
		13		1.452	19	
FORTALECIMENTO DOS OME'S  · Equipamento  · Salário	1984 ANO V	13	- Manutenção de 13 (H/ANO) Coordenadores dos OME'S	1.452	19.	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 89 <u>REALIZADO:</u> 113 <u>SALDO:</u> (-)24

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO BAHIA  
 FOLHA Nº PRO. 4/2

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
FORTALECIMENTO DOS OME'S . Equipamento . Salário	<u>1983</u> ANO IV		-	-	<u>95</u>	
		108	Manutenção 108 (H/ANO) Coordena- dores dos OME'S	879	95.	
FORTALECIMENTO DOS OME'S . Equipamento . Salário	<u>1984</u> ANO V					
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 216 <u>REALIZADO:</u> <u>SALDO:</u>

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO CEARÁ  
FOLHA Nº PRO. 4/3

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
FORTALECIMENTO DOS OME'S  · Equipamento · Salário	1983 ANO IV	53 Mun.	Equipamento e material de consumo (diárias)	849	45	
		165	Manutenção de 165 Técnicos (H/A) 53 Coordenadores OME'S 109 Técnicos 3 Técnicos SEC	1.130 750 5.784	60 82 17	
FORTALECIMENTO DOS OME'S  · Equipamento · Salário	1984 ANO V		-	-	79	
		165	Manutenção de 165 Técnicos p/64 53 Coordenadores OME'S 109 Técnicos 3 Técnicos SEC	565 375 2.892	30 41 8	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 614 <u>REALIZADO:</u> 724 <u>SALDO:</u> (-) 110

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO MARANHÃO  
FOLHA Nº PRO. 4/4

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
FORTALECIMENTO DOS OME'S · Equipamento · Salário	1983 ANO IV		-		<u>65</u>	
		47	Manutenção das Equipes Regionais dos 23 Municípios: 47 pessoas	1.382	65	
FORTALECIMENTO DOS OME'S · Equipamento · Salário	1984 ANO V					
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 482 <u>REALIZADO:</u> 199 <u>SALDO:</u> 283

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PARAÍBA  
 FOLHA Nº PRO. 4/5

PROJETO	METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
			QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
FORTALECIMENTO DOS OME'S		1983 ANO IV					
. Equipamento				-	-	-	
. Salário			93	Manutenção das Equipes Regionais dos 31 Municípios: 93 pessoas	398	37	
FORTALECIMENTO DOS OME'S		1984 ANO V					
. Equipamento				-	-	-	
. Salário			93	Manutenção das Equipes Regionais dos 31 Municípios: 93 pessoas	398	37	
							<u>CUSTO TOTAL:</u> 137 <u>REALIZADO:</u> 159 <u>SALDO:</u> (-) 22

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PERNAMBUCO  
FOLHA Nº PRO. 4/6

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
FORTALECIMENTO DOS OME'S  · Equipamento  · Salário	<u>1983</u> ANO IV	-  58	-  Manutenção das Equipes Regionais dos 29 OME'S: 58 Pessoas	-  1.017	<u>59</u>  59	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 193 <u>REALIZADO:</u> 192 <u>SALDO:</u> 1

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PIAUÍ  
FOLHA Nº PRO. 4/7

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1983</u> ANO IV					
. Equipamento		-	-	-	-	
. Salário		70	Manutenção das Equipes Regionais dos 35 Municípios: 70 pessoas	700	49	
FORTALECIMENTO DOS OME'S	<u>1984</u> ANO V					
. Equipamento		-	-	-	-	
. Salário		70	Manutenção das Equipes Regionais dos 35 Municípios: 70 pessoas	700	49	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 586 <u>REALIZADO:</u> 276 <u>SALDO:</u> 310

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO R.G. NORTE  
 FOLHA Nº PRO. 4/8

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS 50
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
FORTALECIMENTO DOS OME'S · Equipamento · Salário	1983 ANO IV	-	-	-	-	
		28	Manutenção das Equipes Regionais de 14 Municípios: 28 pessoas	163	4.5	
FORTALECIMENTO DOS OME'S · Equipamento · Salário	1984 ANO V	-	-	-	-	
		28	Manutenção das Equipes Regionais de 14 Municípios: 28 pessoas	163	4.5	
						<u>CUSTO TOTAL:</u> 119 <u>REALIZADO:</u> 72 <u>SALDO:</u> 47

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO: SERGIPE  
 FOLHA Nº 4/9

PROJETO	METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
			QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
		1983 ANO IV					
FORTALECIMENTO DOS OME'S	. Equipamento . Salário						
		1984 ANO V					
FORTALECIMENTO DOS OME'S	. Equipamento . Salário						
							<u>CUSTO TOTAL:</u> <u>REALIZADO:</u> <u>SALDO:</u>

*NÃO TEM OME'S*

PROJETO FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RESUMO

ESTADO	META	FÍSICO			FINANCEIRO U\$(1000)		
		80/82	83	84	80/82	83	84
ALAGOAS	EQUIPAMENTO (Municípios)	13	13	0	0	35	0
	SALÁRIO (Pessoas)	72	13	13	40	19	19
BAHIA	EQUIPAMENTO	36	0	0	39	0	0
	SALÁRIO	117	108	0	208	95	0
CEARA*	EQUIPAMENTO	53	53	0	91	45	0
	SALÁRIO	389	165	165	350	159	79
MARANHÃO	EQUIPAMENTO	23	0	0	39	0	0
	SALÁRIO	88	47	0	95	65	0
PARAÍBA	EQUIPAMENTO	31	0	0	29	0	0
	SALÁRIO	55	93	93	56	37	37
PERNAMBUCO	EQUIPAMENTO	29	0	0	0	0	0
	SALÁRIO	174	58	0	133	59	0
PIAUÍ	EQUIPAMENTO	35	0	0	69	0	0
	SALÁRIO	190	70	70	157	49	49
RIO GRANDE DO NORTE	EQUIPAMENTO	14	0	0	63	0	0
	SALÁRIO	0	28	28	0	4.5	4.5
SERGIPE	EQUIPAMENTO	0	0	0	0	0	0
	SALÁRIO	0	0	0	0	0	0
TOTALS		234	66	0	330	80	0
		1.085	582	369	1.039	487.5	188.5

## **5. PROJETO DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO**

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO ALAGOAS  
 FOLHA Nº  
 PRO. 5/1

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO  . Planejamento de Rede Física  . Pesquisa	1983 ANO IV	1	-  Distorção série/idade: (3 Mun.)	-	3.5	
						CUSTO TOTAL: 19.000  REALIZADO: 11.500  SALDO: 7.500

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO CEARÁ

FOLHA Nº PRO. 5/2

PROJETO	METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
			QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	. Planejamento Rede Física . Pesquisa	1983 ANO IV		-			
			1	Avaliação de Impacto do Programa	-	15	
							CUSTO TOTAL: 125. REALIZADO: 88 SALDO: 37

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO MARANHÃO  
 FOLHA Nº PRO. 5/3

PROJETO	METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
			QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$ 1000	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	. Planejamento Rede Física . Pesquisa	1983 ANO IV		-	-	-	-
				-	-	-	-
							CUSTO TOTAL: 18 REALIZADO: 20 SALDO (-)2

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PARAÍBA  
 FOLHA N°  
 PRO. 5/4

PROJETO	METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS 2
			QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	. Planejamento Rede Física			-	-	-	-
	. Pesquisa			-	-	-	-
							-
							CUSTO TOTAL: 18
							REALIZADO: 4
							SALDO: 14

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PERNAMBUCO

FOLHA Nº PRQ. 5/5

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO  . Planejamento Rede Física  . Pesquisa	<u>1983</u> ANO IV	3	Capacidade de absorção da rede; Eficiência e Qualidade do Ensino	66.670	2.	
						CUSTO TOTAL: 328 REALIZADO: 298 SALDO: 30.

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PIAUÍ  
 FOLHA Nº PRO. 5/6

PROJETO	METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
			QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
	ESTUDOS E AVALIAÇÃO						
	. Planejamento Rede Física			-			-
	. Pesquisa			-			-
							CUSTO TOTAL: 41.
							REALIZADO: 59
							SALDO: (-)18

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO R.G. NORTE  
 FOLHA N° PRO. 5/7

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IUS	TOTAL IUS1000	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO	<u>1983</u> ANO IV					
. Planejamento Rede Física		12	Mapeamento da Rede Física em 12 Municípios	625.	7.5	-
. Pesquisa			-	-	-	-
						CUSTO TOTAL: 16 REALIZADO: 10 SALDO: 6

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO SERGIPE

FOLHA N° PRO. 5/8

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ESTUDOS E AVALIAÇÃO  . Planejamento Rede Física . Pesquisa	<u>1983</u> ANO IV		-			-
			-			-
						CUSTO TOTAL: 22 REALIZADO: SALDO:

ESTADO	META	FÍSICO			FINANCEIRO U\$(1000)		
		80/82	83	84	80/82	83	84
ALAGOAS	PLANEJAMENTO REDE FÍSICA	13	0	0	8	0	0
	PESQUISA	0	1	0	0	3.5	0
BAHIA	PLANEJAMENTO REDE FÍSICA	0	0	0	0	0	0
	PESQUISA	0	0	0	0	0	0
CEARA	PLANEJAMENTO REDE FÍSICA	68	0	0	62	0	0
	PESQUISA	1	1	0	11	15	0
MARANHÃO	PLANEJAMENTO REDE FÍSICA	23	0	0	20	0	0
	PESQUISA	0	0	0	0	0	0
PARAÍBA	PLANEJAMENTO REDE FÍSICA	62	0	0	4	0	0
	PESQUISA	0	0	0	0	0	0
PERNAMBUCO	PLANEJAMENTO REDE FÍSICA	36	0	0	64	0	0
	PESQUISA	6	3	0	232	2	0
PIAUI	PLANEJAMENTO REDE FÍSICA	45	0	0	24	0	0
	PESQUISA	0	0	0	35	0	0
RIO GRANDE DO NORTE	PLANEJAMENTO REDE FÍSICA	4	12	0	2.5	7.5	0
	PESQUISA	0	0	0	0	0	0
SERGIPE	PLANEJAMENTO REDE FÍSICA	30	0	0	6	0	0
	PESQUISA	0	0	0	0	0	0
TOTALS		281	12	0	190.5	7.5	0
		7	5	0	278	20.5	0

## **6. PROJETO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PERNAMBUCO  
 FOLHA Nº PRO. 6/1

PROJETO	METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
			QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>1983</u> ANO IV					
	. Complementação Alimentar		900.000	refeições distribuídas para 5.000 alunos	0,33	296	
	. Equipamento		-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>1984</u> ANO V					
	. Complementação Alimentar		1800000	refeições distribuídas para 10.000 alunos	0,33	595	
	. Equipamento		-	-	-	-	
							CUSTO TOTAL: 1.187 REALIZADO: 1.187 SALDO: 0

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO- 83/85

ESTADO PIAUÍ  
 FOLHA Nº PRO. 6/2

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IUS	TOTAL IUS 1000	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . Complementação Alimentar . Equipamento	1983 ANO IV	01	- Aquisição de veículo	- 13.000	- 13.	
						CUSTO TOTAL: 367. REALIZADO: 84 SALDO: 283

PROJETO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RESUMO

ESTADO	META	FÍSICO			FINANCEIRO U\$(1000)		
		80/82	83	84	80/82	83	84
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA	-	-	-	-	-	-	-
CEARA*	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	-	-	-	-	-	-	-
PERNAMBUCO	COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	5.000	5.000	10.000	296	296	595
	EQUIPAMENTO	0	0	0	0	0	0
PIAUI	COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0	0	0	0	0	0
	EQUIPAMENTO	6	1	0	71	13	0
RIO GRANDE DO NORTE	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAIS</b>		5.000	5.000	10.000	296	296	595
		6	1	0	71	13	0

## **7. PROJETO DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA**

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO · Equipamento · Salário	1983 ANO IV				43	
		7	- Manutenção da equipe	- 6.142	- 43	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO · Equipamento · Salário	1984 ANO V				43	
		7	- Manutenção da equipe	- 6.142	- 43	
						CUSTO TOTAL: 285 REALIZADO: 371 SALDO: (-) 86

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO BAHIA  
 FOLHA Nº PRO. 7/2

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO  . Equipamento . Salário	1983 ANO IV				145	
		30	Manutenção da equipe	-	145	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO  . Equipamento . Salário	1984 ANO V				145	
		30	Manutenção da equipe		145	
						CUSTO TOTAL: 320 REALIZADO: 1.873 SALDO: (-) 1.553

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO CEARÁ  
 FOLHA Nº PRO. 7/3

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO . Equipamento . Salário	1983 ANO IV	- 6	Aquisição de material permanente e equipamento Manutenção da equipe e consultoria	- 6.666	44 4. 40.	
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA . Equipamento . Salário	1984 ANO V	- 6	- Manutenção da equipe e consultoria	- 6.666	40 - 40	
						CUSTO TOTAL: 442 REALIZADO: 277 SALDO: 165

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO MARANHÃO  
 FOLHA N° PRO. 7/4

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1983</u> ANO IV				<u>237</u>	
. Equipamento		-	Aquisição de material permanente e equipamento	-	20	
. Salário		37	Manutenção da equipe	5.865	217	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1984</u> ANO V				<u>237</u>	
. Equipamento		-	Aquisição de material permanente e equipamento	-	20	
. Salário		37	Manutenção da equipe	5.865	217	
						CUSTO TOTAL: 1.541 REALIZADO: 1.120 SALDO: 421

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PARÁIBA  
 FOLHA Nº PRO. 7/5

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO . Equipamento . Salário	<u>1983</u> ANO IV	- 30	Aquisição de material permanente e equipamento Manutenção da equipe	1.766	<u>62.</u> 9. 53.	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO . Equipamento . Salário	<u>1984</u> ANO V	- 30	Aquisição de material permanente e equipamento Manutenção da equipe		<u>61</u> 8 53	
						CUSTO TOTAL: 329 REALIZADO: 262 SALDO: 67

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PERNAMBUCO  
 FOLHA Nº PRO. 7/6

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO-1U\$	TOTAL 1U\$1000	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1983</u> ANO IV				<u>108</u>	
. Equipamento		-	Aquisição de material permanente e equipamento	-	3.	
. Salário		47	Manutenção da equipe	2.234	105	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1984</u> ANO V				<u>105</u>	
. Equipamento		-	-	-	-	
. Salário		47	Manutenção da equipe	2.234	105	
						CUSTO TOTAL: 449 REALIZADO: 445 SALDO: 4

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO PIAUÍ  
 FOLHA Nº PRO. 7/7

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO . Equipamento . Salário	<u>1983</u> ANO IV	3	- Manutenção da equipe	- 22.	<u>66</u> - 66.	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO . Equipamento . Salário	<u>1984</u> ANO V	- 3	- Manutenção da equipe	- 21.	<u>65</u> - 65	
						CUSTO TOTAL: 526 REALIZADO: 264 SALDO: 262

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO  
 R.G. DO NORTE  
 FOLHA Nº  
 PRO. 7/8

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO . Equipamento . Salário	1983 ANO IV	- 6	Aquisição de material permanente e equipamento Manutenção da equipe	- 8.166	61 12. 49	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO . Equipamento . Salário	1984 ANO V	- 6	Aquisição de material permanente e equipamento Manutenção da equipe	- 8.333	60 10. 50	
						CUSTO TOTAL: 342 REALIZADO: 209 SALDO: 133

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FISICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO SERGIPE  
FOLHA Nº PRO. 7/9

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1983 ANO IV				71	
. Equipamento		-	Aquisição de material permanente e equipamento	-	11.	
. Salário		7	Manutenção da equipe	8.571	60	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	1984 ANO V				60	
. Equipamento		-	-	-	60	
. Salário		7	Manutenção da equipe	8.571		
						CUSTO TOTAL: 382
						REALIZADO: 243
						SALDO: 139

## PROJETO DE ADMINISTRAÇÃO

RESUMO

ESTADO	META	FÍSICO			FINANCEIRO U\$(1000)		
		80/82	83	84	80/82	83	84
ALAGOAS	EQUIPAMENTO	2	-	-	10	-	-
	SALÁRIO	86	7	7	175	43	43
BAHIA	EQUIPAMENTO	-	-	-	101	-	-
	SALÁRIO	115	30	30	277	145	145
CEARA'	EQUIPAMENTO	-	-	-	-	4	-
	SALÁRIO	53	6	6	165	40	40
MARANHÃO	EQUIPAMENTO	4	-	-	9	20	20
	SALÁRIO	121	37	37	637	217	217
PARAÍBA	EQUIPAMENTO	14	-	-	6	9	8
	SALÁRIO	124	30	30	133	53	53
PERNAMBUCO	EQUIPAMENTO	-	-	-	-	3	-
	SALÁRIO	87	47	47	230	105	105
PIAUI	EQUIPAMENTO	1	-	-	4	-	-
	SALÁRIO	57	3	3	128	66	65
RIO GRANDE DO NORTE	EQUIPAMENTO	-	-	-	-	12	10
	SALÁRIO	30	6	6	88	49	50
SERGIPE	EQUIPAMENTO	2	-	-	5	11	-
	SALÁRIO	49	7	7	107	60	60
TOTALS		23	-	-	135	59	38
		722	173	173	1.940	778	778

## **8. PROJETO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNAP.**

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

PROPOSTA DE REAJUSTAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO-83/85

ESTADO UNAP  
 FOLHA Nº PRO. 8/1

PROJETO METAS	EXERCÍCIO	FÍSICO		FINANCEIRO US\$		OBS
		QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO IU\$	TOTAL IU\$1000	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO UNAP	<u>1983</u> ANO IV				<u>1.160</u>	
. Equipamento		-	Aquisição de equipamento e material permanente	-	8	
. Salários		55	peessoas	18	958	
. Despesas Operacionais		-	diversos	-	194	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1984</u> ANO V				<u>880</u>	
. Equipamento		-	-	-	-	
. Salários		50	peessoas	14	700	
. Despesas Operacionais		-	diversos		181	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	<u>1985</u> ANO VI				<u>880</u>	
. Equipamento		-	-	-	-	
. Salários		50	peessoas	-	700	
. Despesas Operacionais		-	-	-	180	
						CUSTO TOTAL 4.563 TOT. REALIZ. 4.562 SALDO 1

MEC / SEPS  
 BIRD / 1867-BR  
 EDURURAL/NE

POSIÇÃO FINANCEIRA

CUSTOS BÁSICOS  
 (em US\$ 1.000)

PROJETOS	REALIZADO	PREVISTO		TOTAL	%	TOTAL PREVISTO WP	SALDO ESTIMADO
	80/82	83	84				
1 - REDE FISICA	13.213	10.308	1.542	25.063	90	27.915	2.852
2 - DES. CURRÍCULO E SUP.	5.967	3.638	6.334	15.939	136	11.712	(-) 4.227
3 - TREINAMENTO RH	5.646	5.362	1.311	12.319	90	13.685	1.366
4 - FORTALECIMENTO OME'S	1.369	567.5	188.5	2.125	87	2.436	311
5 - ESTUDOS E AVALIAÇÃO	468.5	28	-	496.5	85	587	90.5
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	367	309	595	1.271	107	1.187	(-) 84
7 - ADMINISTRAÇÃO	1.075	837	816	2.728	59	4.616	1.888
8 - ADMINISTRAÇÃO UNAP	1.642	1.160	881	3.683	81	4.563	880
TOTAL	29.747.5	22.209.5	11.667.5	63.624.5	96	66.701	3.076.5

MEC / SEPS  
BIRD / 1867-BR  
EDURURAL/NE

POSIÇÃO FINANCEIRA

CUSTO TOTAL  
(em U\$ 1.000)

	REDE FÍSICA	DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERV.	TREIN. RE CURSOS HUMANOS	FORTALECIMENTO COME'S	ESTUDOS E AVALIAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ADMINISTRAÇÃO PROJ.	ADMINISTRAÇÃO/UNAP	TOTAL
CUSTOS BÁSICOS REALIZADOS	25.063	15.939	12.319	2.125	496.5	1.271	2.728	3.683	63.624.5
<u>SALDO</u>	2.852	(-) 4.227	1.366	311	90.5	(-) 84	1.888	880	3.076.5
<u>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</u>									
INCREMENTO REDE FÍSICA (10.09%)	2.792	1.171	1.369	244	177	-	258	259	6.270
AUMENTO DE PREÇOS (25.27%)	7.782	3.260	3.808	678	494	-	1.209	1.209	18.440
SUB-TOTAL	13.426	240	6.543	1.233	761.5	(-) 84	3.355	2.348	27.786.5
CUSTO TOTAL	38.489	16.143	18.862	3.358	1.258	1.187	6.083	6.031	91.411

MEC / SEPS  
 BIRD / 1857-BR  
 EDURURAL/NE

POSIÇÃO DAS METAS FÍSICAS DO PROGRAMA . 1980/1934

PROJETO	METAS	REALIZADO		PREVISTO				TOTAL	%
		80 / 82	%	83	%	84	%		
X. REDE FÍSICA	Construção	575	60	330	34	53	6	958	100
	Reforma	160	75	52	25	-	-	212	100
	Equip.e Mobiliário	660	56	421	36	89	8	1.170	100
2. DES. DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO	Livros e Guias	2.182.728	44	670.304	14	2.065.582	42	4.918.614	100
	Pacotes	894.727	46	353.600	34	388.690	20	1.817.400	100
3. TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Professores	21.175	44	16.245	34	10.830	22	48.250	100
	Outros	2.239	56	1.139	29	602	15	3.980	100
4. FORTALECIMENTOS DOS OME'S	Equipamento	234	100	-	-	-	-	234	100
	Salário	1.085	53	582	29	369	18	2.036	100
5. ESTUDOS E AVALIAÇÃO	Planejamento Rede Física	281	96	12	4	-	-	293	100
	Pesquisa	7	58	5	42	-	-	12	100
6. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Complementação Alimentar	900.000	25	900.000	25	1.800.000	50	3.600.000	100
	Equipamento	6	86	1	14	-	-	7	100
7. ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	Equipamento	23	100	-	-	-	-	23	100
	Salário	722	68	173	16	173	16	1.068	100

# Livros Grátis

( <http://www.livrosgratis.com.br> )

Milhares de Livros para Download:

[Baixar livros de Administração](#)

[Baixar livros de Agronomia](#)

[Baixar livros de Arquitetura](#)

[Baixar livros de Artes](#)

[Baixar livros de Astronomia](#)

[Baixar livros de Biologia Geral](#)

[Baixar livros de Ciência da Computação](#)

[Baixar livros de Ciência da Informação](#)

[Baixar livros de Ciência Política](#)

[Baixar livros de Ciências da Saúde](#)

[Baixar livros de Comunicação](#)

[Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE](#)

[Baixar livros de Defesa civil](#)

[Baixar livros de Direito](#)

[Baixar livros de Direitos humanos](#)

[Baixar livros de Economia](#)

[Baixar livros de Economia Doméstica](#)

[Baixar livros de Educação](#)

[Baixar livros de Educação - Trânsito](#)

[Baixar livros de Educação Física](#)

[Baixar livros de Engenharia Aeroespacial](#)

[Baixar livros de Farmácia](#)

[Baixar livros de Filosofia](#)

[Baixar livros de Física](#)

[Baixar livros de Geociências](#)

[Baixar livros de Geografia](#)

[Baixar livros de História](#)

[Baixar livros de Línguas](#)

[Baixar livros de Literatura](#)  
[Baixar livros de Literatura de Cordel](#)  
[Baixar livros de Literatura Infantil](#)  
[Baixar livros de Matemática](#)  
[Baixar livros de Medicina](#)  
[Baixar livros de Medicina Veterinária](#)  
[Baixar livros de Meio Ambiente](#)  
[Baixar livros de Meteorologia](#)  
[Baixar Monografias e TCC](#)  
[Baixar livros Multidisciplinar](#)  
[Baixar livros de Música](#)  
[Baixar livros de Psicologia](#)  
[Baixar livros de Química](#)  
[Baixar livros de Saúde Coletiva](#)  
[Baixar livros de Serviço Social](#)  
[Baixar livros de Sociologia](#)  
[Baixar livros de Teologia](#)  
[Baixar livros de Trabalho](#)  
[Baixar livros de Turismo](#)
